



正衡监理

编号: JL- (LKHDOP) -02

监 理 月 报

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业 2.997MW

第 02 期

项目监理部 (章)

报告日期: 2019 年 11 月 30 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报

本月工程实施情况

项目名称	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业项目	业主单位	兰考县杭泰光伏发电有限公司
项目规模	本项目装机容量-欧派门业 2.997MW	项目地址	兰考恒大家居联盟产业园欧派厂区内
监理负责人	苗守明	监理人数	驻场 1 人
监理进场时间	2019 年 10 月 20 日（2019 年 10 月 28 日进入延期）	合同期限	2019.03.11-2019.07.11（另加免费监理 30 天）
参建单位	建设单位：兰考县杭泰光伏发电有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
	总承包单位：临湘市振宇建筑工程有限责任公司		
	施工单位：临湘市振宇建筑工程有限责任公司		

一、本工程规模：

河南开封兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考县恒大家居联盟产业园欧派厂区内，其中欧派 2.997MW,占地面积 68130 m²，组件共 11088 块，汇流箱 15 个，箱变 3 个，一次舱 1 个，二次舱 1 个，组串式逆变器 42 台；电池组件厂家为 275 多晶硅类型，



固定式安装。

二：工程进度：

1.1-3#箱变基础、一二次预制舱基础砌设完毕，内外抹灰全部完成，百叶窗安装完毕。

2.1-8#屋面光伏区放线定位完毕，1-7#屋面光伏区夹具安装完毕，1-4#屋面光伏区支架安装完成。1-4#屋面光伏区光伏组件搬运摆放完成。

二、材料进场情况：

1、2019年11月7日材料进场（梯形桥架：3575个、法兰自攻螺栓：14399个）。

2、2019年11月10日材料进场（导轨各类型号：5172根、导电刺片：25911个、导轨连接片：3078个、20中压块：18623个、35边压块：7290个）。

3、2019年11月11日材料进场（导轨：2503根（60mm）、梯形夹具：10405个、商砼：8方）。

4、2019年11月15日材料进场（1*4支流电缆：50000米、3*95：1000米、3*120：500米、2*16：200米、3*185：900米、3*70：550米、2*6：50米、4*16：200米、7*2.5：100米、4*2.5：200米、2*4：200米、7*4：100米、通讯光纤：2000米）。

5、2019年11月17日材料进场（100*100电缆桥架：3500米、200*100电缆桥架：3000米、200*100梯形桥架：250米、100电缆桥架盖板：3500米、200电缆桥架盖板：3250米、200弯头：14个、300弯头：



1 个、商砼：22 方）。

6、2019 年 11 月 20 日材料进场（梯形夹具：8778 个）。

7、2019 年 11 月 22 日材料进场（275 光伏组件：1488 块），2019 年 11 月 23 日材料进场（275 光伏组件：1488 块），2019 年 11 月 24 日材料进场（275 光伏组件：1488 块）。

8、2019 年 11 月 25 日材料进场（3*70：550 米、梯形桥架：12181 个），2019 年 11 月 28 日材料进场（汇流箱：15 台），2019 年 11 月 29 日材料进场（箱变设备：3 台）。

四、施工中存在的问题：

- 1、屋面光伏区安装夹具过程中存在个别夹具结构胶为涂抹到位；
- 2、屋面光伏区支架安装过程中存在个别支架螺栓未安装到位；

五、安全施工情况：

- 1、 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目欧派监理项目部，在施工人员进场后，对现场施工人员进行安全技术交底培训。
- 2、 要求施工单位每天早晚开一次班会活动，早会主要针对每天工作内容及安全情况交底一次，晚会主要内容为总结每天施工过程中出现的各种安全问题及安全隐患检查。
- 3、 监理项目部每天到施工现场检查施工现场安全问题，及检查施工安全隐患问题。
- 4、 本月本工程未出现安全事故，未发现重大安全隐患问题。

六、本月监理工作情况：

- 1、本月监理工作开展情况综述（特别是对该项目施工过程中出现



的问题监理方的处置方法)。

①监理项目部的监理人员每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做好记录（监理日志，监理检查记录表等），对施工现场发现的安装质量问题进行了规范安装示范，现场要求施工人员整改。

②本月召开监理会议 5 次，会议纪要 5 份，监理联系单 2 份，监理检查记录表 4 份。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方：

①、加强工程监理专业学习，监理工作规范化。

②、提高电气和土建监理专业知识。

③、组织本项目监理人员学习公司下发的通知。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求：

严抓现场施工质量和现场施工安全，及时与施工项目部沟通施工过程中的工程质量施工情况。

七、下月监理工作重点：

1、光伏区光伏组件安装，光伏电缆、直流电缆高压电缆敷设。

2、配合业主方工作争取 1230 并网成功。

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

-欧派门业 2.997MW 监理项目部





1#箱变基础墙体砌设



电缆井人工土方开挖





电缆井基础砌设




过路预埋管道切割





屋面光伏区放线定位

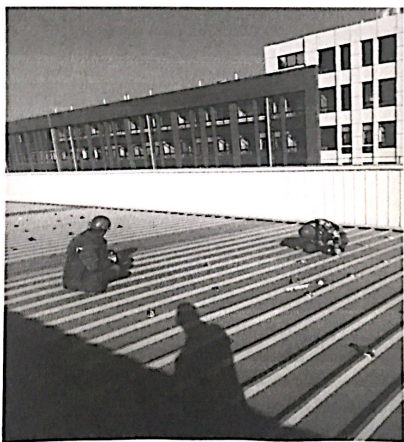

屋面光伏区夹具安装（1）






支架、夹具到货卸车



夹具吊运至屋面光伏区



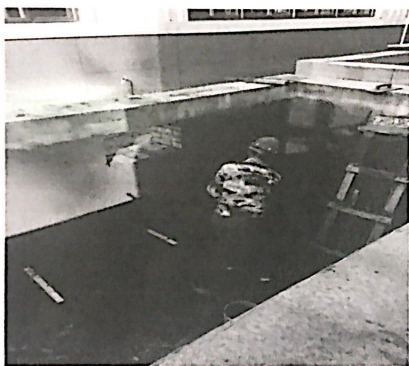

预制舱基础内抹灰



电缆进场吊运卸车





屋面光伏区支架安装



光伏组件吊运至屋面光伏区





光伏组件进场卸车



屋面光伏区光伏组件搬运摆放

