

正衡监理

编号: JL- (LKHDQM) -03

监 理 月 报

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW

第 03 期

项目监理部 (章)

报告日期: 2018 年 5 月 25 日



监 理 月 报

本月工程实施情况

项目名称	兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美项目	业主单位	兰考县杭泰光伏发电有限公司
项目规模	本项目装机容量-曲美 1.971MW	项目地址	兰考恒大家居联盟产业园曲美厂区内
监理负责人	苗守明	监理人数	驻场 1 人
监理进场时间	2019 年 03 月 06 日（业主通知进场时间）	合同期限	2018.09.21-2019.01.21（另加免费监理 30 天）
参建单位	建设单位：兰考县杭泰光伏发电有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
	总承包单位：临湘市振宇建筑工程有限责任公司		
	施工单位：临湘市振宇建筑工程有限责任公司		

一、本工程规模：

河南开封兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考县恒大家居联盟产业园曲美厂区内，其中曲美项目（1.971MW），共计两个彩钢瓦屋面占地面积 7773 m²，共计安装组件 7300 块，汇流箱 24 台，箱变 2 台，一次舱、二次舱各一台。

二：工程进度：

- 1.闭环 1#屋面检查出的施工问题，为下步并网发电做准备。
- 2.2#屋面汇流箱安装完毕（共 12 台）。
- 3.2#屋面电缆桥架支架、檩条，格栅通道支架、檩条安装。
- 4.二次舱设备光纤电缆敷设。

三、材料进场情况：

- 1、本月项目到场材料：夹具等材料 20500 个。

四、施工中存在的问题：

- 1、现场垃圾未及时清理；
- 2、1#厂房屋面电缆桥架多余开孔未进行封堵；
- 3、个别施工人员电缆敷设未佩戴安全防护手套。

五、安全施工情况：

- 1、 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目曲美监理项目部，在施工人员进场后，对现场施工人员进行了安全技术交底培训。
- 2、 要求施工单位每天早晚开一次班会活动，早会主要针对每天工作内容及安全情况交底一次，晚会主要内容为总结每天施工过程中出现的各种安全问题及安全隐患检查。
- 3、 监理项目部每天到施工现场检查施工现场安全问题，及检查施工安全隐患问题。
- 4、 本月本工程未出现安全事故，未发现重大安全隐患问题。

六、本月监理工作情况：

1、本月监理工作开展情况综述(特别是对该项目施工过程中出现的问题监理方的处置方法)。

①监理项目部的监理人员每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正,并做好记录(监理日志,监理检查记录表等),对施工现场发现的安装质量问题进行了规范安装示范,现场要求施工人员整改。

②本月召开监理会议 2 次,会议纪要 2 份,监理联系单 2 份,监理检查记录表 1 份。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方:

①、加强工程监理专业学习,监理工作规范化。

②、提高电气和土建监理专业知识。

③、组织本项目监理人员学习公司下发的通知。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求:

严抓现场施工质量和现场施工安全,及时与施工项目部沟通施工过程中的工程质量施工情况。

七、下月监理工作重点:

1、已到项目的材料先安装完成并试验完成,等待业主方并网通知;

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

-曲美 1.971MW 监理项目部




二次设备光纤电缆敷设 (1)




1#屋面汇流箱内侧出线图粘贴



1#屋面镀锌接地扁铁固定

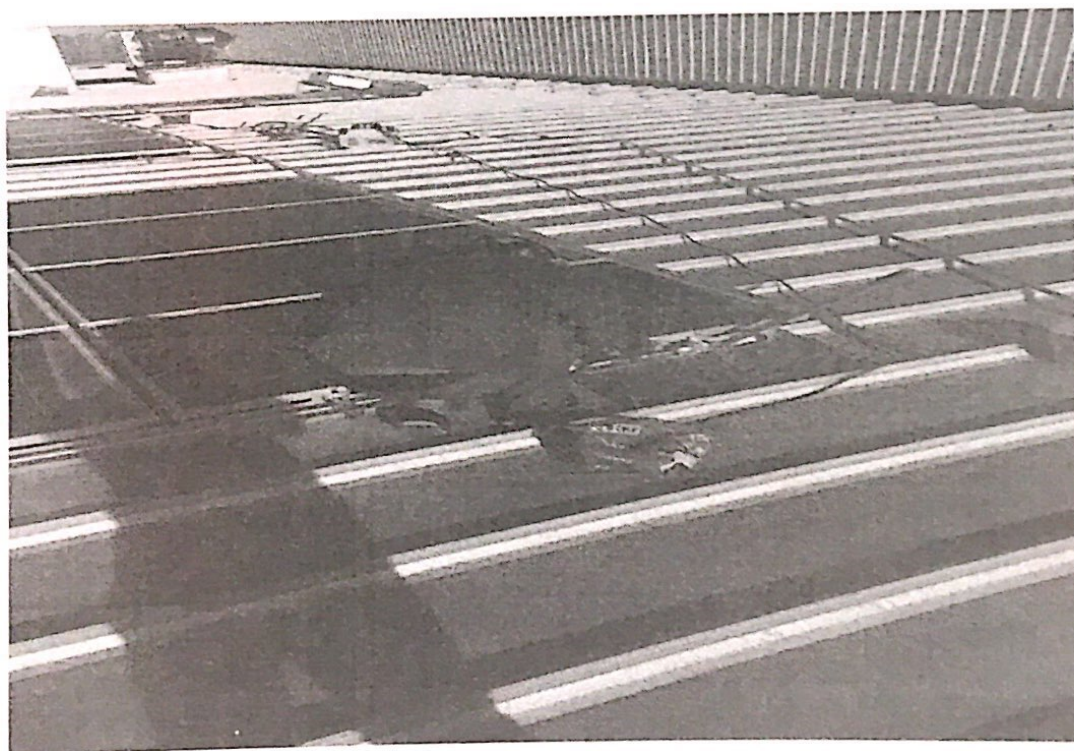

1#屋面镀锌接地扁铁焊接

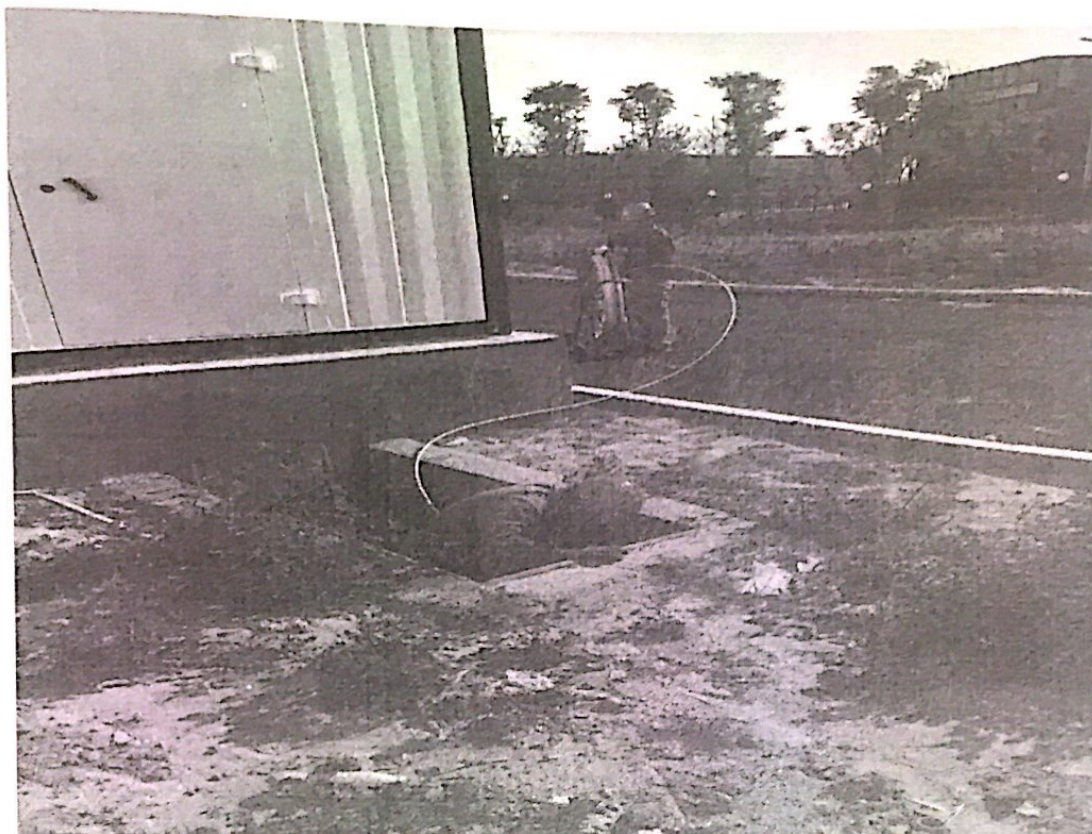


二次设备光纤电缆敷设（2）



2#屋面电缆桥架安装



2#屋面汇流箱桥架制作

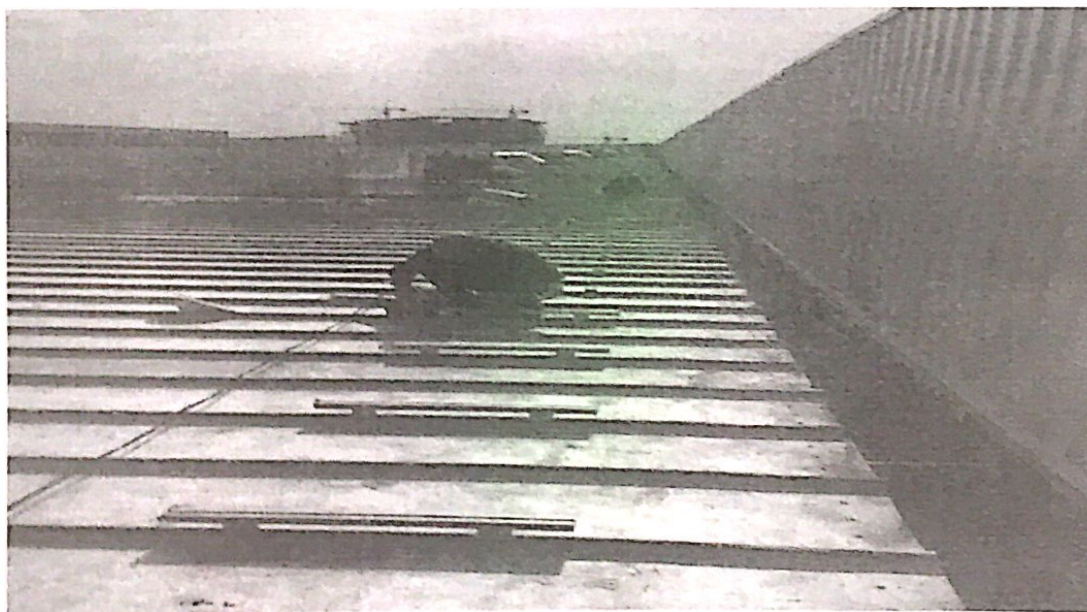

2#屋面格栅通道支架、檩条安装
