



正衡监理

编号: ZHJL-YB-02

监 理 月 报

工程名称: 白沙光伏发电项目

2018 年 11 月第 2 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 王守刚

报告日期: 2018 年 11 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 白沙光伏发电项目 月次 第 2 次 月报开始时间 2018 年 11 月 30 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	白沙光伏发电项目	湖南红太阳新能源 科技有限公司	影像	15 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	开挖接地电缆沟; 条形基础浇筑; 组件安装; 集中式逆变器吊装; 箱变基础浇筑; 组件串线; 汇流箱接线; 电缆敷设; 箱变电缆头制作; 测试开路电压;	验收消缺;




箱变耐压试验；

接地焊接；

箱变并网合闸；

并网成功；

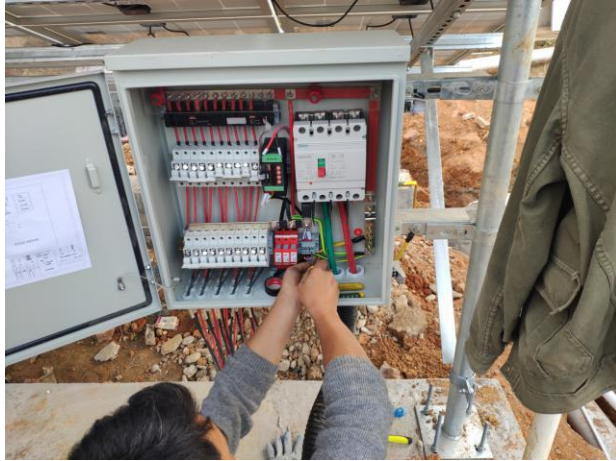



 		
设备交付进度	支架、零部件、 电缆、组件、箱 逆变、汇流箱已 进场完毕	
设计交付进度	蓝图、CAD 图纸	
质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	
施工图会审	完成	
设计交底	完成	
方案审查	完成	
技术交底	完成	
设计变更	已按现场实际	

		情况进行变更	
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实彻底	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	
质量	主要工序质量	条形基础、独立基础、微孔桩混凝土浇筑、箱变、逆变吊装与电缆头制作；	
	主要原材料质量	混凝土、预埋件、钢筋质量合格；	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
湖南红太阳科技有限公司								
1	支架安装	2018.10.15	2018.11.8			100%	100%	
2	组件安装	2018.10.22	2018.11.10			100%	100%	
4	防雷接地					100%	100%	
4	直流电缆4mm2					100%	100%	
8	逆变器安装					100%	100%	
9	汇流箱安装					100%	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
湖南红太阳								
1	组件安装							
2	电缆敷设							
3	箱逆变就位							
4	防雷接地							

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事 故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数

无	无	无		80 人	3 个	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工
------	---	-----------------------

质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理		
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

白沙光伏发电项目监理部

2018年11月30日
