



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

2019 年 2 月 第 1 期

监理项目部（章）：

总监理工程师：保耀生

江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目 监理项目部

报告日期：2019 年 2 月 23 日



监 理 月 报

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目 月次 第 1 次 月报开始时间 2019 年 1 月 25 日 结

束日期 2019 年 2 月 24 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	<u>江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目</u>	天威新能源系统工程 (北京)有限公司	影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		本月因施工人员节后未回归, 现场无施工项。	接地施工, 基础硬化抹面, 百叶窗安装, 桥架盖板, 电缆井等消缺项施工。



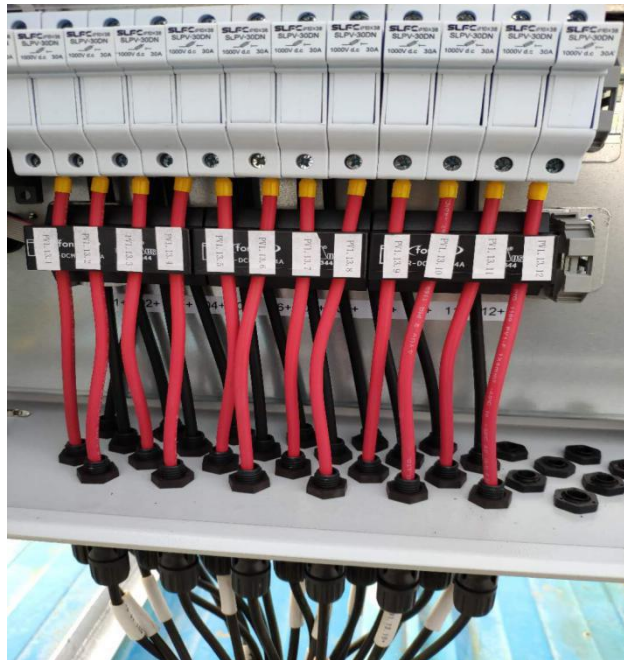

设备交付进度

现场所需设备全部到场

设计交付进度

图纸不完整

	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	无	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	变更	变更 1 次
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	一二次设备调试安装	线路整理
	主要原材料质量	电缆规格合格证	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	

	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查 力度，加大工 序报验抽查力 度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2018. 10.03	2018.10.06	2018.10.03	2018.10.06	100%	100%	
2	支架安装	2018. 10.06	2018.10.31	2018.10.03	2018.12.10	100%	100%	
3	组件安装	2018.10. 11	2018.10.31	2018.11.10	2019.1..5	90%	90%	
4	电缆桥架	2018.10.25	2018.11.05	2018.11.03	2018.11.20	100%	100%	
5	直流电缆 4mm2	2018.10.10	2018.11.10	2018.11.30	2019.1.3	100%%	100%%	
6	直流电缆	2018.12.06	2018.12.10	2018.21.07	2019.1.3	100%	100%	
7	高压电缆	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.07	2018.12.10	100%	100%	
8	逆变器安装	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.16	2018.12.22	100%	100%	
9	开关柜	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.18	2018.1.222	100%	100%	
10	二次室设备	2018.12.06	2018.12.10	2018.12.18	2018.12.22	100%	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2018. 10.03	2018.10.06			以完成		单位为

								厂房
2	支架安装	2018. 10.06	2018.10.31			已完成		单位为 厂房
3	组件安装	2018.10. 11	2018.10.31			已完成		单位为 厂房
4	电缆桥架 (直流)	2018.10.25	2018.11.05			以完成		单位为 米数
5	直流电缆 4mm2	2018.10.10	2018.11.10			已完成		单位为 米数
6	直流电缆	2018.12.06	2018.12.10			已完成		单位为 米数
7	高压电缆	2018.12.06	2018.12.10			已完成		
8	逆变器安 装	2018.12.06	2018.12.10			已完成		
9	开关柜	2018.12.06	2018.12.10			已完成		
10	二次室设 备	2018.12.06	2018.12.10			已完成		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理		并网后各项消缺。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部 施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资 格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出 整改要求并限期改正。
质量管理	夹具检查及屋面防腐巡视；单位工程重点 部位施工进行旁站；督促施工单位质量通	督促施工单位按照正泰技术协议规范要求进行施 工

	病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目监理部

2019 年 2 月 23 日
