

# 监 理 月 报

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

2018 年 12 月 第 2 期

项目监理单位（章）：

总监理工程师 

江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目 监理项目部

报告日期： 2018 年 12 月 25 日

# 监 理 月 报

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目 月次 第 2 次 月报开始时间 2018 年 11 月 26 日



结束日期 2018 年 12 月 25 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


## 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目	天威新能源系统工程 (北京)有限公司	影像	6 张	

## 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		开工前施工现场准备及前期资料报审,及开工前的安全交底。临时爬梯搭建吊装、夹具支架的安装,彩钢瓦防腐处理,厂房加固等。	桥架敷设、电缆敷设组件安装、逆变器安装、开关柜安装

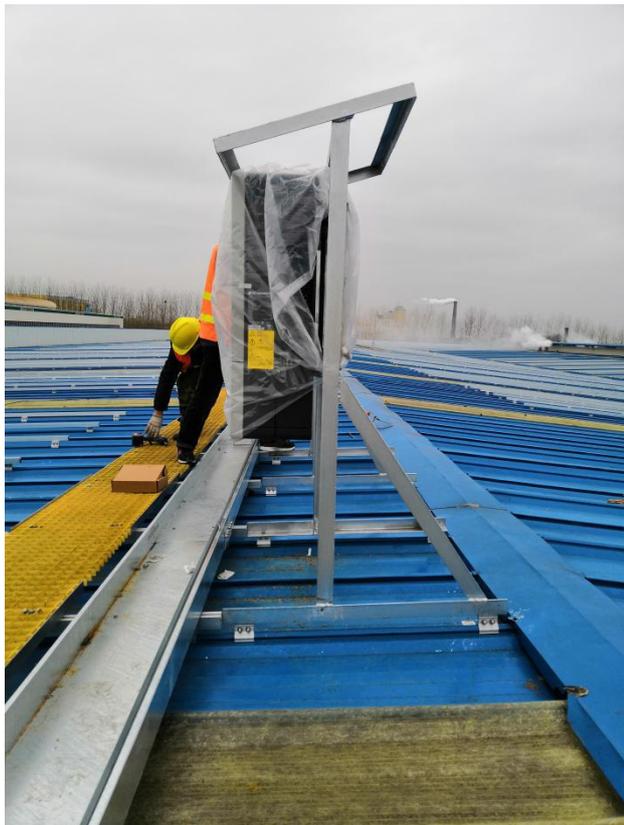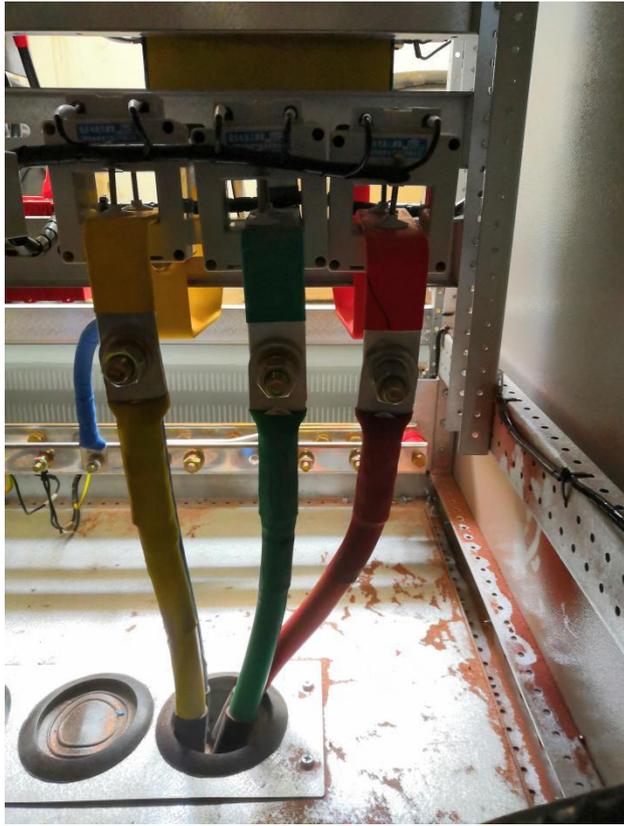

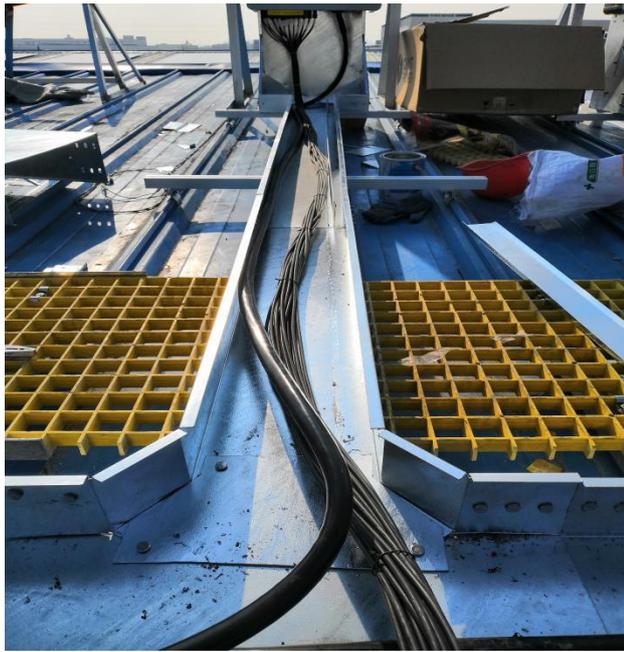

		
设备交付进度	支架、组件、桥架、电缆、逆变器、汇流箱、并网柜到场	
设计交付进度	图纸完整	
质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
施工图会审	完成	
设计交底	无	
方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料

	技术交底	完成	
	设计变更	变更	变更 1 次
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	夹具安装	夹具放线及安装
	主要原材料质量	夹具外观检查合格	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/

	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作
--	--------	-------	----------

## 一、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线	2018.11.05	2018.11.06	2018.11.05	2018.11.06	100%	100%	
2	支架安装	2018.11.06	2018.11.10	2018.11.06	2018.11.10	100%	100%	
3	组件安装	2018.11.14	2018.11.19	2018.12.10	2018.12.13	100%	100%	
4	电缆桥架	2018.11.13	2018.11.21	2018.11.18	2018.11.27	100%	100%	
5	直流电缆 4mm <sup>2</sup>	2018.11.18	2018.11.20	2018.12.10	2018.12.10	100%	100%	
6	直流电缆	2018.11.21	2018.11.24	2018.12.10	2018.12.10	100%	100%	
7	逆变器安装	2018.11.16	2018.11.20	2018.11.26	2018.11.28	100%	100%	
8	汇流箱安装	2018.11.24	2018.11.25	2018.12.13	2018.12.15	100%	100%	

## 二、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
1	并网发电							单位为 厂房
2								单位为 厂房
3								单位为 厂房
4								单位为 米数
5							/	单位为 米数
6							/	单位为 米数
7								
8				/	/		/	

### 三、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		25 人	/	/	/	/

### 四、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	本月完成了厂房加固 100%，支架安装完成，组件安装完成，线缆敷设完成，桥架安装完成，逆变器、汇流箱、并网柜安装完成	
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	支架安装检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照正泰技术协议规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、

	促施工单位做好物资保管工作,要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查,确保物资不遗失。	机具进行施工。
--	--	---------

常州正衡电力工程监理有限公司  
江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目监理部

2018 年 12 月 25 日
