



编号: ZHJL-DZYT-04

监 理 月 报

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

2019 年 2 月第 4 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 李元堂

报告日期: 2019 年 2 月 26 日



监 理 月 报

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 月次 第 4 次

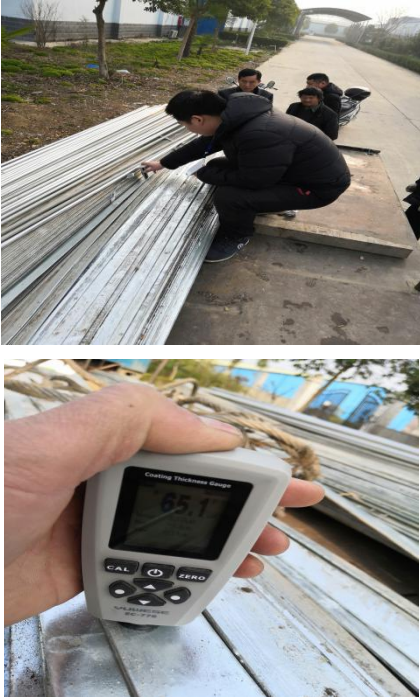
月报开始时间 2019 年 02 月 1 日 结束日期 2019 年 02 月 26 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目		影像	5	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		本月春节放假，年后复工，开始施工；屋面接地扁铁材料进场，开始施工；北区监控线缆敷设；	1、屋面接地环网施工； 2、场区监控安装； 3、屋面清洗系统施工 4、彩钢瓦屋顶加固；

	设备交付进度	预制仓进场，箱变，汇流箱等设备已进场	/
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	要求施工单位认真落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改。	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度

质量	主要工序质量	要求屋面接地 严格按照设计 图纸及规范施 工	/
	主要原材料质量	接地扁铁材料 进场进场，规 格、镀锌层厚度 符合要求	/
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	
	设备质量		
	质量验评情况	工序施工符合 要求，加强过程 检查力度，加大 工序报验抽查 力度	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

本月春节放假，年后复工，开始进行屋面接地环网施工及监控施工

三、 下月进度计划

屋面接地环网施工；场区监控系统安装；屋面清洗系统施工；彩钢瓦屋顶加固；

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件（份）	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		10 人	1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	屋面接地环网施工；场区监控系统安装；屋面清洗系统施工；彩钢瓦屋顶加固；
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	要求施工单位对彩钢瓦加固新进场人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。要求施工单位配备专职安全员，特殊作业人员必须持证上岗。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	要求施工单位严格按照设计图纸及规范施工

技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	督促施工单位对施工人员进行技术交底
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	/

常州正衡电力工程监理有限公司

邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

2019 年 02 月 26 日
