



编号: PGFD-YB-ZHJL-02

监 理 月 报

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

2019 年 5 月第 2 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐耀生



报告日期: 2019 年 5 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

月次：第 2 次月报

开始时间：2019 年 05 月 1 日 结束时间：2019 年 5 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料



序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	影像	39 张	



一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	1. 风机基坑开挖累计完成 24 基； 2. 风机基础垫层累计完成 14 基； 3. 风机基础钢筋绑扎累计完成 12 基； 4. 风机基础混凝土浇筑累计完成 11 基； 5. 风机基础地基处理累	1. 风机基坑开挖完成 26 基； 2. 风机基础垫层完成 14 基； 3. 风机基础钢筋绑扎累计完成 14 基； 4. 风机基础混凝土浇筑累计完成 14 基； 5. 风机基础地基处理累


	   	计完成 10 基； 6. 220KV 升压站生产控制楼基础地基处理完成； 7. 220KV 升压站生产控制楼基础垫层完成； 8. 220KV 升压站生产控制楼基础钢筋绑扎完成； 9. 220KV 升压站生产控制楼基础承台浇筑完成； 10. 220KV 升压站生产控制楼基础短柱钢筋绑扎完成； 11. 220KV 升压站生产控制楼基础短	计完成 14 基； 6. 220KV 升压站生产控制楼基础浇筑完成； 7. 220KV 升压站生产控制楼基础地梁浇筑完成； 8. 风场施工道路路基完成 30%； 9. 风机基础吊装平台完成 24 基；
--	--	--	---


	 钢筋进场卸车2019.5.5  钢筋进场吊装 2019.5.6  检查升压站引孔深度 2019.5.7  忻州市电力公司现场检查 2019.5.8	柱混凝土浇筑完成； 12. 220KV 升压站生产控制楼基础承台以下部分分层回填正在进行； 12. 风场施工道路路基完成 50%； 13. 风机基础吊装平台累计完成 26 基；	
--	---	--	--

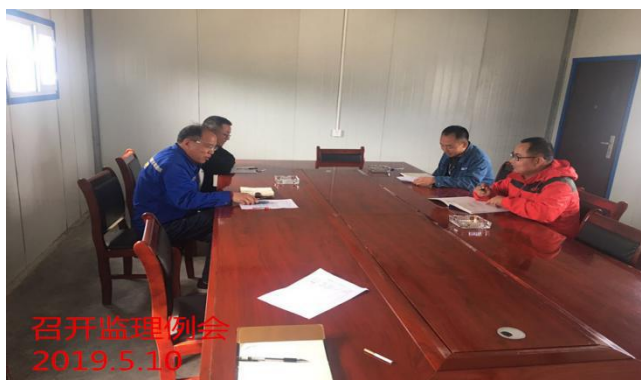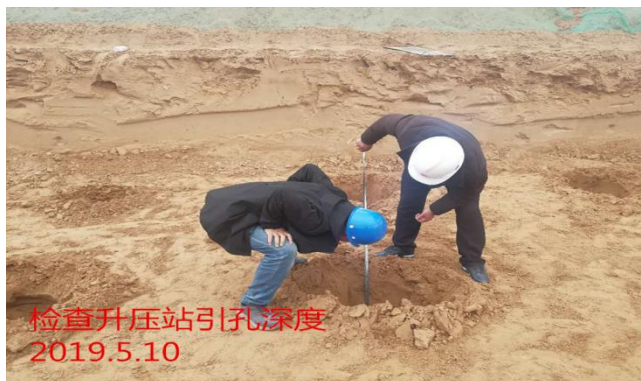

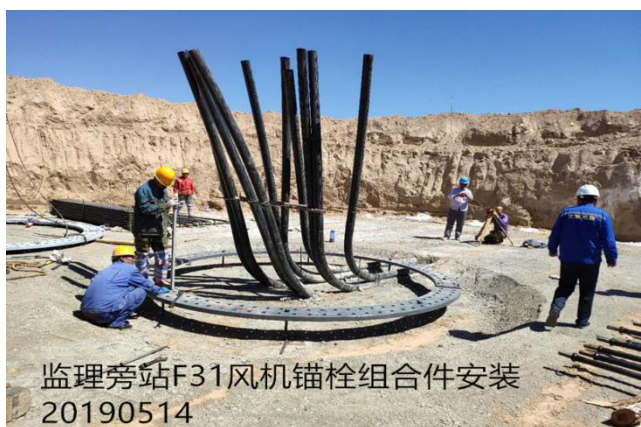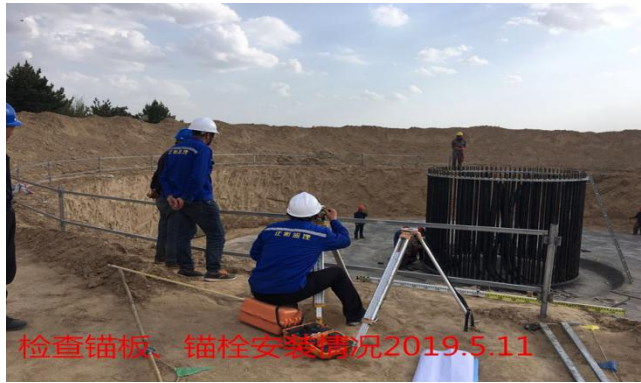




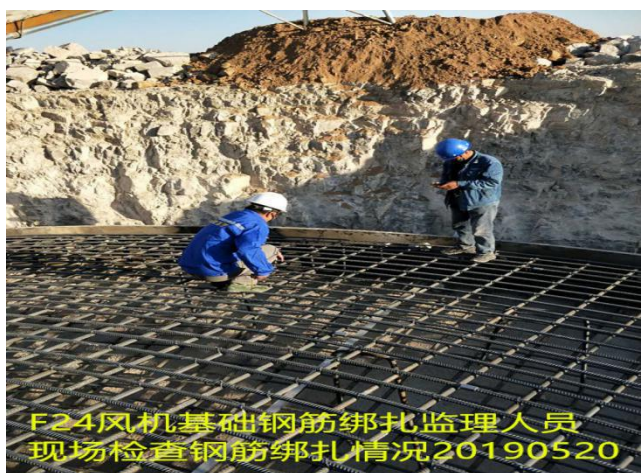

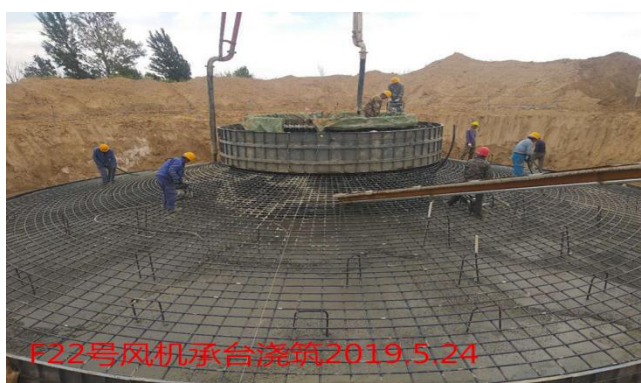



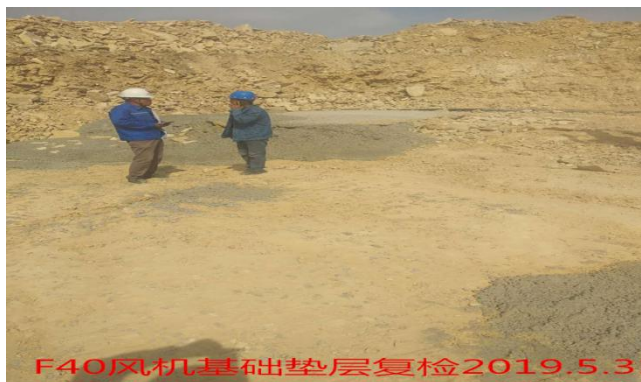

			
	设备交付进度:	已进场车辆及设备如下: 挖掘机 11 台; 夯扩挤密桩机 3 台; 25 吨吊车 1 台; 汽车吊 1 台; 混凝土泵车 1 台; 装载机 13 台; 压路机 2 台; 工程车 2 台; 洒水车 2 台; 拖车 1 台; 农用车 5 台; 皮卡车 11 台。	现场机械设备基本满足本工程的需要。随着施工进度的进展需求,相关的机械设备会陆续进场,以保证项目正常的施工进度要求。
	设计交付进度	已交付设计蓝图项目总平面图、升压站控制楼基础图、设备材料库图、风机基础图、道路图纸	业主正在督促设计院移交图纸
	质量体系运作情况	各参建单位已进驻指挥部	按照相关规范要求,已对重点

			部位、重点工序 监理单位全程 旁站。
	施工图会审	监理方、施工方 举行一次图纸 会审	已完成施工图 会检记录
	设计交底	升压站安全交 底工作已完成	已完成生产控 制楼的安全交 底工作。
	方案审查	施工单位报审 的相关专项方 案已审查完成	施工单位的专 项方法已基本 完善到位。
	技术交底	锚栓组合件安 装、大体积凝 土浇筑施工之 前进行技术交 底工作。	每个单位工程 施工之前，要求 施工单位对重 点部位、重点工 序进行技术交 底，并保留相关 培训资料。
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	员工进场已进 行培训	对新进员工安 全培训。
	安全交底情况	无	
	安全措施落实情况	要求施工单位 对违反行为罚 款处理。	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施基本可以	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	风机基础土方	由于本项目土

		开挖不符合施工验收规范，基础周壁没按规范要求放坡、基础顶部周边没留作业平台、堆土放置距离基础周边太近，已下发监理通知单，施工单位正在按要求整改。 锚栓组合件安装时监理人员全程旁站，针对需要检测的水平点全部复测完成。 大体积混凝土浇筑之前对全体现场管理人员及施工人员进行质量技术交底工作。	质含砂量大，土质松散，重点检查施工单位在基础开挖时一定按规范要求施工。 对重点部位、重点工序，在施工前，要求施工单位项目总工对现场管理人员及施工人员进行安全、技术交底工作，监理人员全程旁站，已确保本工程合格率达到100%。
	主要原材料质量	各种钢筋已进场 676.8 吨。 锚栓到场 792 根	材料进场，对主要材料进行开箱及平行检查；复检合格后方可进场使用。对不合格原材料

			退回处理
	构（配）件质量	送检报告质量合格。	对进场构配件 把控好进场材料质量关
	设备质量	无设备进场	对进场构配件 把控好进场材料质量关
	质量验评情况	无	
投资	资金情况	无	
	款项支付情况	无	
	预算外签证	无	
合同	合同签订情况	施工合同签订	
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任 务 名 称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累 计 完 成（完成量 / 总量）	备注
1	风机、箱变基施工	2019.4.21	2019.8.1	2019.4.21		20/50	24/50	
2	基 础 定 位、开挖	2019.4.21	2019.7.15	2019.4.21		25/50	30/50	
3	地基处理	2019.4.25	2019.7.20	2019.4.25		12/50	14/50	
4	垫层混凝土浇筑	2019.5.11	2019.7.25	2019.5.11		12/50	12/50	
5	锚栓组合件安装	2019.5.13	2019.7.28	2019.5.13		12/50	12/50	
6	钢筋安装	2019.5.14	2019.7.28	2019.5.14		12/50	12/50	
7	主体混凝土浇筑	2019.5.15	2019.7.30	2019.5.15		11/50	11/50	
8	接地装置	2019.5.16	2019.7.30	2019.5.16		10/50	10/50	

	安装							
9	基础回填	2019.5.20	2019.8.1	2019.5.20		5/50	5/50	
10	二次灌浆	2019.6.3	2019.8.1					

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	风机、箱变基施工	2019.4.21	2019.8.1	2019.4.21		26/50	50/50	
2	基础定位、开挖	2019.4.21	2019.7.15	2019.4.21		14/50	44/50	
3	地基处理	2019.4.25	2019.7.20	2019.4.25		14/50	28/50	
4	垫层混凝土浇筑	2019.5.11	2019.7.25	2019.5.11		14/50	26/50	
5	锚栓组合件安装	2019.5.13	2019.7.28	2019.5.13		14/50	26/50	
6	钢筋安装	2019.5.14	2019.7.28	2019.5.14		14/50	26/50	
7	主体混凝土浇筑	2019.5.15	2019.7.30	2019.5.15		14/50	26/50	
8	接地装置安装	2019.5.16	2019.7.30	2019.5.16		14/50	24/50	
9	基础回填	2019.5.20	2019.8.1	2019.5.20		14/50	19/50	
10	二次灌浆	2019.6.3	2019.8.1					

四、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	无	128人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	升压站控制楼基础开挖、引开打灰土桩、地基处理及浇筑，风机基础开挖、引孔打灰土桩、锚栓组合件安装及基础混凝土浇筑。	升压站基础浇筑，风机基础开挖、引孔打灰土桩、锚栓组合件安装及基础混凝土浇筑
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、安全交底，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位施工严格按照施工规范施工，对现场不规范作业利用监理例会、现场指导指出施工中的不足，下发监理通知单、联系单整改。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及施工规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	本月没有发生造价	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	风力发电机组锚栓到货 17 套，累计到货 17 套	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排专门人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司

智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理项目部

2019 年 05 月 31 日
