

太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目 工程

监理月报

第 一 期

2018 年 11 月 26 日 至 2018 年 12 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 徐翔生

日

期:

2018

12

25



本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	26 天
工程暂停令	0 份	联系单	4 份
监理备忘录	0 份	监理通知单	2 份
例会会议纪要	5 份	其他	0 份
本月工程现场大事记			


- 1、11月30日箱逆变基础、环网柜、预制仓基础浇筑。
- 2、12月4日第一次召开监理例会，确定每周四下午两点召开监理例会。
- 3、12月8日一次二次设备到场，现场检验合格同意使用。
- 4、12月9日电缆、电缆桥架全部到场，现场检验合格同意使用。
- 5、12月9日汇流箱开始安装。
- 6、12月10日电缆敷设。
- 7、12月19日设备联调。
- 7、12月21号供电局验收。

A. 0. 8-2

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	4 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验检验批	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出 监 理 通 知 单 （ 质 量 控 制 类 ）			份
工程质量情况简析（文字或图表）			

- 1、本月组件安装正常施工
- 2、本月桥架安装、电缆敷设施工正常。
- 3、一次二次设备安装正常施工。
- 4、汇流箱安装一切正常。

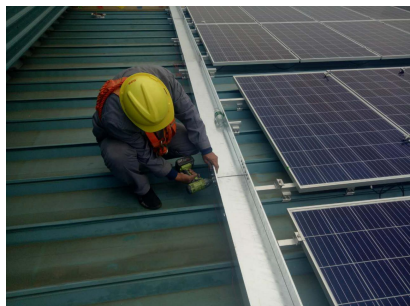

下月质量情况预计和目标

- 1、下月在保证施工进度的前提下，保证施工质量合格。
- 2、确保在组件搬运过程中无不规范行为。

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2018. 10. 17	工程竣工日期	2019. 1. 30
本月计划完成至	2018. 12. 25		
本月实际完成至	2018. 12. 25		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		

本月工程进度情况简析（文字或图表）

- 1、工艺车间桥架、汇流箱已安装完成，组件全部吊装完成 1.2MW（共 1.2MW）
- 2、模块车间桥架、汇流箱安装完成，模块车间共 2.98MW，组件已安装 1.5MW。
- 3、联合车间支架、桥架全部安装完成，因车间加固未完成，组件未安装。
- 4、一次、二次设备、箱逆变安装调试完成。



下月工程进度展望

- 1、组件、汇流箱、桥架全部安装完成
- 2、实现全容量并网

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工安全生产管理工作情况登记	
本月安全检查次数	次
发出监理通知单（安全文明类）	2 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况:现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况:监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。	
下月监理安全生产管理的工作重点	
下月继续保持安全工作的好连续性,严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个程安全“0”事故。	

本月工程其它事项

本工程已安全施工 69 天
