



常州正衡电力工程监理有限公司

Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

监 理 月 报

浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式
光伏并网发电项目



2019 年 05 月第 06 期

报告日期：2019 年 05 月 21 日

监 理 月 报

编号：ZHJL-YB-006

工程名称：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目

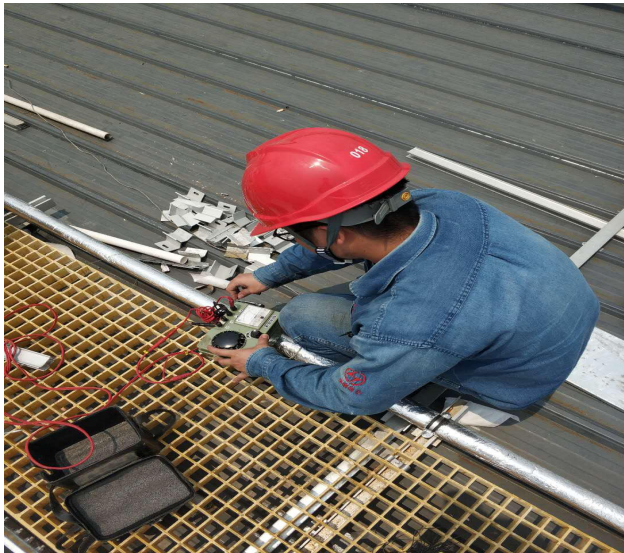
月报开始时间：2019 年 05 月 01 日 结束日期：2019 年 05 月 21 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目		影像	7 张	

一、 监理重点工作情况

专业	项目进度照片	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目本期建设屋顶为 10 个屋面，其中 9 个彩钢瓦屋面，1 个水泥屋面。 2、已全容量并网发电； 3、本月 2 号进行	



监理初检；

4、清洗水管已全部制作安装完成；

5、消缺整改已完成；

6、进行竣工初验；



设备交付进度

1、组件到货 100%，
导轨到货 100%，夹具
到货 100%，光伏专用

		电缆到货 100%。交流电缆到货 3000 米, 占总体 100%。桥架到货 3200 米 , 占总体 100%、接地扁铁到货 4800 米 , 占总体 100%、汇流箱到货 25 台、逆变器到货 6 台, 箱变、一次二次设备均已到场安装完成。	
	设计交付进度	图纸完成	清洗系统图纸未提供
	质量体系运作情况	质量体系健全, 运行良好	落实质量保证体系, 并对运行情况进行检查
	施工图会审	未完成	
	设计交底	未完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位及时报审各项资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底, 已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施	加强现场安全管

		良好	理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装，	支架及组件安装； 电缆敷设，桥架安装，接地施工。
	主要原材料质量	支架外观检查合格， 组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	进场设备质量合格	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外包队	系统外队伍人
伤	备	故			伍数量	伍人数	伍数量	数
无	无	无		7 人	1	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	厂房加固、组件安装、清洗系统安装等工作。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工规范和设计要求进行施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶
分布式光伏并网发电项目监理部

2019 年 05 月 21 日
