



编号: TCYF-JI-YB-04

监 理 月 报

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

2019 年 02 月第 4 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2019 年 02 月 27 日

监 理 月 报

工程名称: 苏州太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目 月次 第 4 次

月报开始时间 2019 年 02 月 20 日 结束日期 2019 年 02 月 27 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料


资料类型	资料数量	备注
影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 底挡板安装施工	1、2 月 20 日返场, 22 日签发复工令, 开始复工, 2、组件挡板安装累计完成 35%, 3、现场安全技术交底完成; 4、现场安全标识、措施完善。	1、接地环网施工完成, 2、电缆桥架盖板全部完成, 3、组件挡板安装完成, 4、资料收集整理完成, 5、项目完成验收交接。



挡板安装检查

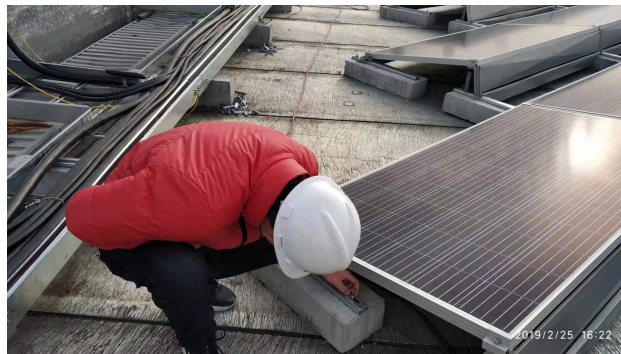

支架锚栓垫片检查有个别生锈



挡板安装施工



挡板安装完成 35%

	 逆变器危险标识		
	设备交付进度	所有材料、设备已全部到场	
	设计交付进度	图纸完成	竣工图完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	已交付	督促施工单位报审竣工资料
	技术交底	完成	
	设计变更		
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明	加强现场安全

		措施良好	管理力度
质量	主要工序质量	现场质量合格， 不合格项已整改完成	加强现场质量管理力度
	主要原材料质量	所有到货材料 检查合格，把控 好进场材料质量关	
	构（配）件质量	进场支架构配件材料质量合格，接地扁钢无镀锌要求跟换。	
	设备质量	设备质量合格， 证明文件齐全	
	质量验评情况	工序施工符合要求	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	单位工程	分部分项工程	实际完成内容	累计完成工程量（%）
----	------	--------	--------	------------

1	支架安装	支架安装		100%
2		挡板安装	25%	35%
3	组件安装	组件安装		100%
4	电缆敷设	交流电缆敷设		100%
		桥架安装		100%
		光伏电缆敷设		100%
5	开关柜安装			100%
6	逆变器安装			100%
7	汇流箱安装			100%
8	接地环网		0	0

三、 下月进度计划

完成所有工程量，完成所有监理工作，验收交接完成。

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		7 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好竣工验收准备工作。

安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	挡板安装检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工、整改、消缺，竣工完成。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目监理项目部

2019 年 02 月 27 日
