



编号: JL- (WLYYB) -01

## 监 理 月 报

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

2018 年 12 月第 1 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生



报告日期: 2018 年 12 月 31 日

# 监 理 月 报


工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目 月次 第 1 次 月报开始时间 2018 年 12 月 3 日 结束日期 2018 年 12 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料


| 序号 | 单位工程标准名称       | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|----|----------------|--------|------|------|----|
| 1  | 温州物隆源分布式光伏发电项目 |        | 影像   | 12 张 |    |

## 一、 监理重点工作情况

| 专业 | 事项                                                                                                                                                                     | 本月重点工作情况                                                           | 下月重点工作计划                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 进度 |   | <p>12 月 3 日开工，截止月底所有支架支墩完成，镀锌支架、铝合金支架到场，开始安装大隆机器支架。钢结构加固完成 40%</p> | <p>预计安装完成所有支架组件、防雷接地、箱变基础施工、并网柜安放、大隆电缆沟施工</p> |

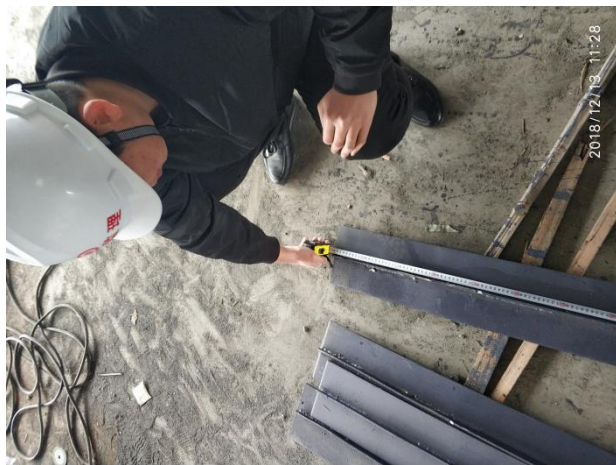



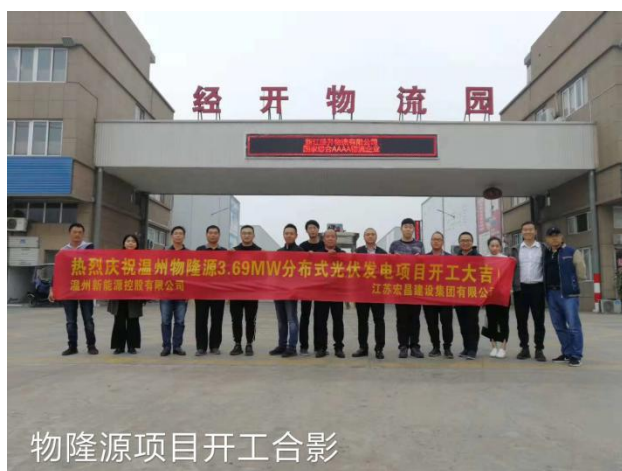

|                                                                                                                            |  |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|
|  <p>来源建筑垃圾散乱</p> <p>2018/12/18 08:27</p> |  |                |                |
|  <p>旁站支架支墩浇筑</p> <p>2018/12/8 11:35</p> |  |                |                |
| <p>设备交付进度</p>                                                                                                              |  | <p>组件未到场</p>   | <p>下月全部到场</p>  |
| <p>设计交付进度</p>                                                                                                              |  | <p>箱变基础未出图</p> | <p>其余图纸要完成</p> |

|    |          |                              |                     |
|----|----------|------------------------------|---------------------|
|    | 质量体系运作情况 | 符合设计及要求                      | 落实质量保证体系，并对运行情况进行检查 |
|    | 施工图会审    | 暂未会审                         |                     |
|    | 设计交底     | 已交底                          |                     |
|    | 方案审查     | 已审查                          |                     |
|    | 技术交底     | 已交底                          |                     |
|    | 设计变更     | 正在落实                         |                     |
| 安全 | 安全培训情况   | 开展安全活动与不定期检查                 | 督促施工单位对进场新员工进行安全教育  |
|    | 安全交底情况   | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底           | 继续督促施工单位进行班前交底      |
|    | 安全措施落实情况 | 落实不彻底，已要求施工单位认真落实            | 监督施工单位认真落实安全措施      |
|    | 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好                  | 加强现场安全管理力度          |
| 质量 | 主要工序质量   | 支架及组件安装，电缆敷设，箱逆变基础浇筑，组件电气接线； | 逆变器安装。              |
|    | 主要原材料质量  | 支架外观检查合格，组件观感质量合格；           | 对主要材料进行检查           |
|    | 设备质量     | 开展设备开箱                       | 进行进场报验、             |

|    |        |          |                     |
|----|--------|----------|---------------------|
|    |        | 检查记录     | 开箱检查                |
|    | 质量验评情况 | 工序施工符合要求 | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投资 | 资金情况   | /        | /                   |
|    | 款项支付情况 | 预付款支付    | /                   |
|    | 预算外签证  | /        | /                   |
| 合同 | 合同签订情况 | /        | /                   |
|    | 合同执行情况 | 按合同执行    | 做好合同执行工作            |

## 二、经开物流园、大隆机器、来源实业进度情况

| 序号 | 任务名称  | 计划开始时间     | 计划结束时间     | 施工开始日期     | 施工结束日期     | 本月实际完成（完成量 / 总量） | 累计完成（完成量 / 总量） | 备注 |
|----|-------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|----|
| 1  | 定位放线  | 2018.12.25 | 2019.1.1   | 2018.12.24 |            |                  |                |    |
| 2  | 基础支墩  | 2018.12.8  | 2018.12.24 | 2018.12.8  | 2018.12.24 | 100%             | 100%           |    |
| 3  | 支架安装  | 2018.12.18 | 2018.12.31 |            | 2018.12.26 | 0                | 0              |    |
| 4  | 组件安装  | 2018.12.18 | 2019.1.10  |            |            |                  |                |    |
|    |       |            |            |            |            |                  |                |    |
| 1  | 逆变器安装 |            |            |            |            |                  |                |    |
| 2  | 接地安装  |            |            |            |            |                  |                |    |
| 3  | 汇流箱安装 |            |            |            |            |                  |                |    |
| 4  | 电缆敷设  |            |            |            |            |                  |                |    |
|    |       |            |            |            |            |                  |                |    |

## 三、下月进度计划

| 序号 | 任务名称        | 计划开始时间    | 计划结束时间    | 施工开始日期 | 施工结束日期 | 下月计划完成（完成量 / 总量） | 本月实际完成（完成量 / 总量） | 权值 |
|----|-------------|-----------|-----------|--------|--------|------------------|------------------|----|
| 1  | 汇流箱、逆变器安装完成 |           |           |        |        |                  |                  |    |
| 2  | 组件安装完成      | 2019.1.10 | 2019.1.25 |        |        |                  |                  |    |

## 二、安全文明施工情况

| 事故（起） |      |      | 编制安全策  | 施工   | 安全分包情况 |        |         |         |
|-------|------|------|--------|------|--------|--------|---------|---------|
| 人身重伤  | 机械设备 | 电网事故 | 划文件(份) | 人数   | 分包队伍数量 | 分包队伍人数 | 系统外队伍数量 | 系统外队伍人数 |
| 无     | 无    | 无    |        | 21 人 | /      | /      | /       | /       |

## 三、施工重点工作情况

| 专业   | 本月重点工作情况                                                                       | 下月重点工作计划                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 进度管理 | 督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性                                                | 支架组件安装完成                              |
| 安全管理 | 督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，成立安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。 | 安全管理委员会不定期大检查，包括现场施工和生活区检查，工人安全设备佩戴情况 |
| 质量管理 | 单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。                             | 按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。             |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底，                                                             | 参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，                |

|      |                                                              |              |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|      | 现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。                                      | 监督检查执行情况。    |
| 物资供应 | 协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。 | 督促施工单位组件尽快到场 |

常州正衡电力工程监理有限公司  
温州物隆源分布式光伏发电项目  
2018 年 12 月 31 日
