

正衡监理

编号: ZJ TZ-01

监 理 月 报

工程名称: 华菱一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目情况报告

2019 年 1 月第 1 期

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 1 月 26 日

监 理 月 报

工程名称：华菱一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目情况报告_ 月次_第 1 次

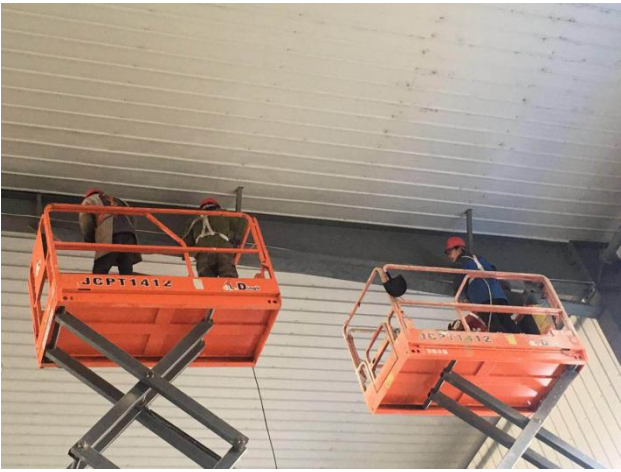
月报开始时间 2019 年 1 月 6 日 结束日期 2019 年 1 月 26 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	华菱一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目		影像	9 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1、 七#厂房屋面瓦楞锁边加固，  	1、七#厂房屋面瓦楞锁边加固， 2、 T 型钢加固件制作 3、 七#厂房屋面托梁加固焊接 4、 七#厂房屋面卡扣与导轨安装。 5、 做好春节放假准备工作，	1、 1#7# 厂房屋面卡扣与导轨安装，组件安装，逆变器，汇流箱，电缆井施工，电缆敷设等。 2、 1#厂房屋面换屋面瓦楞，托梁加固。

	 	与春节后复工准备工作。	
	设备交付进度	无	无
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系开始逐步健全，向运行良好发展。	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	暂未会审	暂未会审
	设计交底	暂未交底	暂未交底
	方案审查	暂未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	暂未交底	暂未交底
	设计变更	无	无
安全	安全培训情况	新进场员工已	督促施工单位

		进行安全培训	对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	1、七#厂房屋面瓦楞锁边加固， 6、T型钢加固件制作 7、七#厂房屋面托梁加固焊接 8、七#厂房屋面卡扣与导轨安装。	1、七#厂房屋面瓦楞锁边加固， 9、T型钢加固件制作 10、七#厂房屋面托梁加固焊接 七#厂房屋面卡扣与导轨安装。
	主要原材料质量	夹具外观检查合格、导轨、检查合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/

	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作
--	--------	-------	----------

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司								
1	7# 厂房 T 型钢加工制作。	2019.1.12	2019.2.28	2019.1.26	2019.1.31	100%	100%	
2	7# 厂房 换瓦楞，	2019.1.12	2019.2.22	2019.1.26	2019.1.31	100%	100%	
3	7# 厂房 卡扣安装	2019.1.12	2019.1.12	2019.1.26	2019.1.31	100%	100%	
4	7# 厂房 导轨安装	2019.1.26	2019.1.31	2019.1.26	2019.1.31	100%	100%	
5	7# 厂房 组件安装	2019.1.26	2019.1.31	2019.1.26	2019.1.31	700KW	700KW	
6	1# 厂房 桥架安装	/	/	/	/	/	/	
7	7# 厂房 电缆井施工	/	/	/	/	/	/	
8	7# 厂房 电缆敷设	/	/	/	/	/	/	

三、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成	累计完成（完成	备注
----	------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	----

						(完成 量 / 总 量)	量 / 总 量)	
安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司								
1	1# 厂 房 T 型钢加 工制作。	2019.2.12	2019.2.28	2019.2.12	2019.2.28	100%	100%	
2	1# 厂 房 换瓦楞,	2019.2.12	2019.2.22	2019.2.12	2019.2.22	100%	100%	
3	1# 厂 房 卡扣安装	2019.2.23	2019.2.28	2019.2.23	2019.2.28	100%	100%	
4	1# 厂 房 导 轨 安 装)	2019.2.23	2019.2.28	2019.2.23	2019.2.28	100%	100%	
5	1# 厂 房 组件安装	/	/	/	/	/	/	
6	1# 厂 房 桥架安装	/	/	/	/	/	/	
7	1#、7#厂 房电缆井 施工	/	/	/	/	/	/	
8	1#、7#厂 房电缆敷 设	/	/	/	/	/	/	

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	1 份	16 人	/	/	/	/

五施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置,	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单

	充分调动施工人员的积极性	位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求 进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会， 监督检查执行情况。
造价管理	/	/
物资供应	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

华菱一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目情况报告项目监理部

2019 年 1 月 26 日
