



编号: ZSFD-YB-ZHJL-008

监 理 月 报

工程名称: 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

2020 年 08 月第 期

项目监理部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2020 年 08 月 31 日

监 理 月 报

工程名称： 高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

月次：第 8 次月报

开始时间：2020 年 08 月 1 日 结束时间：2020 年 08 月 31 日

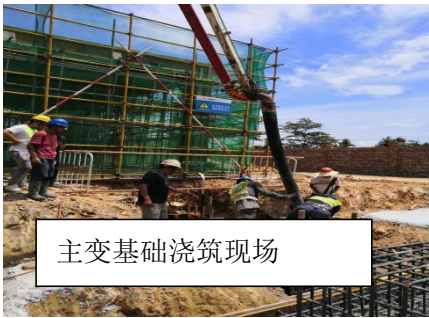
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目	宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目经理部	影像 6 张	8.21 日质监站抽查各参建单位策划文件和施工措施基本满足施工要求，施工技术文件和资料应补充完善。	

二、监理重点工作情况

专 业	工程现场照片	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进 度	 8 月 7 日综合楼一层浇筑	A 标段：7 日综合楼一层及主变基础、事故油池垫层浇筑及钢筋绑扎浇筑完成；围墙砌筑 防雷接地焊接、南边砌坡、污水井砌筑及管道安装完成。	A 标：新进场的 A 标段江西省高能建设工程有限公司于本月 25 日正式进场组建升压站临时办公项目部，完成了深井泵的安装运行、接地井安装、主变基

 主变基础浇筑现场  对 B 标段安全大检查  升压站二层搭设脚手架   20 日省质监站在开元名都召开会议	B 标段：G05 路面拓宽、下边坡挡土墙施工、G17 道路清表及场平；完成了 G14 G15 G16 路面修整；风场道路总 8.3km，14 台风机平台，8 条场区道路，目前 7 台风机平台基本具备开挖条件。 D 标段：本月 10 日 1) 控制桩复测及架空线路基础定位放线，累计完成 100%。 2) 已完成 25 基铁塔、光缆、电缆及金具等材料的订购工作 20 日至 21 日质监站对升压站及主体结构首次检查	础、事故油池及围墙基础的的开挖工作，完成综合楼搭设脚手架及地梁模板支护等工作。 B 标：B 标段安徽嵩安建设工程有限公司风场道路完成 5273m 清表及路基工作。机基础开挖。 完成 G14 道路路面修整施工；完成 G02 G08 G09 G14 风机场坪工作；GG03 G16 风机场坪及路面正在进行中
	2019 年 10 月 28 日进场叶片 5 组（15 片）、锚板锚栓 18 日已进场，其余设备材料	现场设备满足本工程需要。随着施工进度的进展需求，相关设备会

		正在有计划陆续到场；主变计划月底进场	陆续进场以保证项目正常的施工进度要求
	设计图纸交付进度	图纸（蓝图）交付满足工程进度需要。	设计图纸共 86 册、到场 81 册、5 册未交付，满足工程需要。
	质量体系运作情况	质量体系运行正常	按照相关规范要求，已对重点部位、重点工序监理人员全程旁站。
	施工图会审	本月召开一次	根据施工进度需要陆续召开
	设计交底	2020.08.20 组织 D 标图纸会审及设计交底	根据施工进度需要陆续召开
	方案审查：目前只提供部分前期资料。	因内容不符合现场实际及里面标准规范未更新等原因已退回	因质监站对本项目首检，前期策划文件及部分过程资料已报审
	技术交底	监理人员在 A 标段现场办公室交底一次	每个单位工程施工之前，要求施工单位对重点部位、重点工序进行技术交底，并保留相关培训资料。
	设计变更	护坡未按图施工业主已同意施工方的变更方案	
安全	安全培训情况	新员工进场已进行安全培训	对施工班组长进行安全培训期考试及要求每天的班前会必须安全交底
	安全交底情况	新员工进场已安全交底及考试	重点关注新进场的员工安全技术交底落实情况。
	安全措施落实情况	要求 EPC 总承包单位认真落实安全交底内容对违反行为罚款处理安全方面处罚单 2 份	监督总包单位认真落实安全措施，特别是新员工进场落实情况
	安全文明施工情况	现场安全、文明施工措施基本在可控范围	加强现场安全文明施工管理力度
质量	主要工序质量	升压站事故油池至排污井之间的 DN150 镀锌钢管未按图纸施工，已下发监理通知单，施工单位正在按要求整改。	重点旁站综合楼一层及室外设备基础垫层浇筑支模、绑筋及浇筑工作 对重点部位、工序，在施工前，要求总包方项目总工及安全负责人对现场管理人员及施工人员进行安全、技术

			交底工作，监理人员全程旁站，确保安全质量可控
	主要原材料质量	进场的钢筋、水泥、石子、砂等已按见证取样数量送检复试，还未见试验报告。	材料进场时对主要材料进行开箱及平行检查；复检合格后方可进场使用。对不合格原材料退回处理
	构（配）件质量	/	/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	/	/
投 资	资金情况	各参建单位按照合同节点付款	/
	款项支付情况	无	严格审批施工单位进度款工程量及形象工程进度
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	A、B、D标施工合同已签订、C标段未进场	下月本项目将全面展开施工
	合同执行情况	按合同规定条款已执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	主变基础及事故油池浇筑	2020.08.01	2020.08.07	2020.08.06	2020.08.08	100/100	100%/100%	
2	综合楼一层浇筑	2020.08.02	2020.08.10	2020.08.06	2020.08.07	100/100	100%/100%	
3	GIS设备基础垫层浇筑	2020.08.15	2020.08.15	2020.08.15	2020.08.15	100/100	100%/100%	
4	升压站围墙砌筑	2020.07.22	2020.08.22	2020.07.22	2020.08.23	100/100	100%/100%	
5	南边砌坡	2020.07.29	2020.08.29	2020.07.29	2020.08.31	50/100	100%/50%	

6	污水管道安装	2020.08.02	2020.08.20	2020.08.02	2020.08.28	100/100	100%/100%	
7	室外设备构架基础浇筑	2020.08.14	2020.08.14	2020.08.15	2020.08.16	100/100	100%/100%	
8	防雷接地焊接	2020.07.15	2020.08.25	2020.07.15	2020.08.31			
9	B 标风场道路修整下边坡及风机场坪、环水保工程	2020.08.01	2020.09.15	2020.07.02	未完成	50/50	100%/50%	
10	D 标段 35kv 集电线路 2 控制桩复测	2020.08.11	2020.08.18	2020.08.11	2020.08.17		100%/70%	
11	2 公里开挖	2020.08.26	2020.09.30	2020.08.26		2000m/100m		

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	综合楼封顶	2020.09.02	2020.09.02					
2	室外设备具备安装条件	2020.10.05	2020.10.25					
3	主变进场	2020.08.21	2020.08.25					
4	首台风机基础开挖	2020.08.29	2020.08.28					
5	首台风机基础浇筑	2020.09.10	2020.09.11					
6	35KV 集电线路基础开挖	2020.09.10	2020.10.10					
7	铁塔组装	2020.09.20	2020.10.30					

8	2 公里风场道路	2020.08.26	2020.10.10					

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故	划文件（份）	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无	份	50 人			1	

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1) A 标段升压站综合楼一层浇筑、二层钢筋绑扎、模板支护；主变基础、事故油池、室外设备构架基础、排污管道、砌井、护坡等工作；B 标段风场道路清表、修整下边坡、挡土墙施工、场平等工作；D 标段：组建项目部、控制桩复测、材料询价，前期资料的工作	A 标：升压站综合楼封顶； B 标：，风机基础开挖； D 标段：铁塔基础开挖、材料进场
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、安全交底，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，重点关注风机设备运输及安装安全，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位施工严格按照施工规范施工，对现场不规范作业利用监理例会及周安全检查、现场指导指出施工中的不足，下发监理通知单、联系单整改。	督促施工单位在土建及设备安装施工时按照安装工艺和设计要求及施工规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

造价管理	按月审批施工单位进度款	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	设备物资供应满足工程需要。	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排专门人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司

高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目监理部

2020 年 08 月 31 日

