

监 理 月 报

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

2019 年 04 月 第 2 期

项目监理部(章):

总监理工程师：苗守明



河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部

报告日期： 2019 年 04 月 25 日

监 理 月 报

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 月次 第 2 次 月报开始时间 2019 年 04 月 01 日


结束日期 2019 年 04 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目	湖北飞友建设集团有限公司			

监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		召开监理例会	

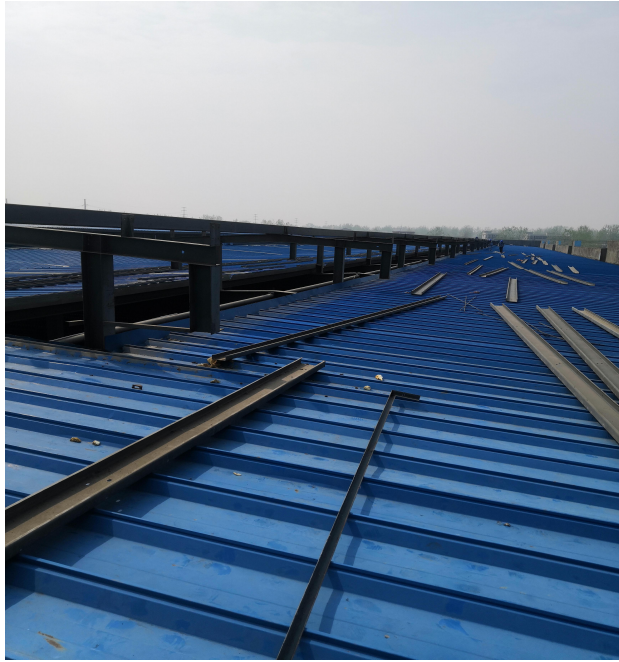

			
	设备交付进度	无	
	设计交付进度	未出具蓝图	
	质量体系运作情况		
	施工图会审	已进行	
	设计交底		
	方案审查		
	技术交底	已进行	
	设计变更		
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认	监督施工单位认真落实安全

		真落实	措施
	安全文明施工情况		
质量	主要工序质量		
	主要原材料质量		
	构（配）件质量		
	设备质量		
	质量验评情况		
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	屋面气楼改造	2019.04.03	2019.05.03	2019.04.03	/	40%	40%	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

二、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
----	------	--------	--------	--------	--------	------------------	------------------	----

1	屋面气楼改造	2019.04.26	2019.05.26	/	/	100%	40%	单位为 厂房
2								单位为 厂房
3								单位为 厂房
4								单位为 米数
5							/	单位为 米数
6							/	单位为 米数
7								
8				/	/		/	

三、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		20 人	/	/	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理		
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部 施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资 格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出 整改要求并限期改正。
质量管理		
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底， 现场检查施工人员是否按照技术交底内 容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会， 监督检查执行情况。

造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理部

2019 年 04 月 25 日
