

监 理 月 报

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

2019 年 05 月 第 3 期

项目监理部(章):

总监理工程师：苗守明



河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部

报告日期： 2019 年 05 月 25 日

监 理 月 报

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 月次 第 3 次 月报开始时间 2019 年 05 月 01 日

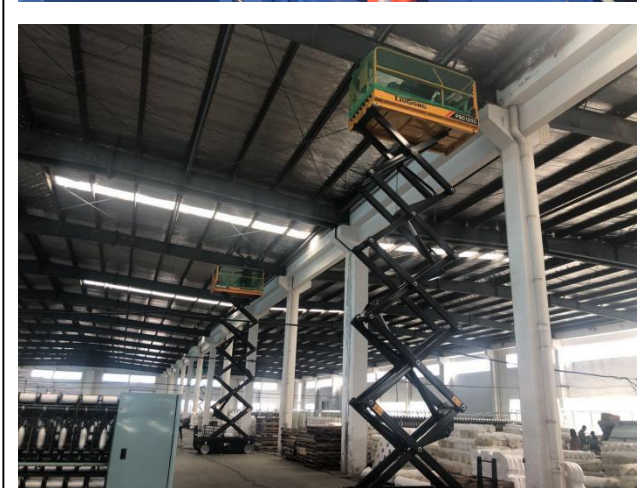
结束日期 2019 年 05 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目	湖北飞友建设集团有限公司			

监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		屋面气楼拆除后进行验收	各屋面完成加固工程
		5#屋面完成檩条加固 L 型钢	夹具导轨安装完成

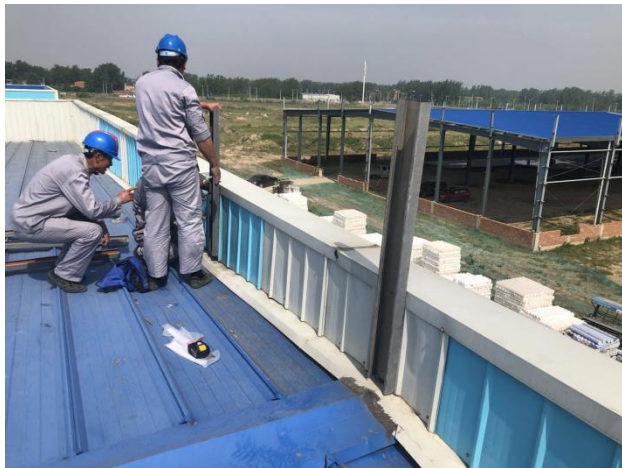
  		3#厂房正在开展 檩条加固 L 型钢 钢管到货抽检 屋面恢复工作 6#、7#屋面女儿 墙做安全防护 5#屋面开展夹具	设备基础开 挖、浇筑完成 屋面进行部分 组件安装 对加固完成进 行部分验收 对屋面进行防 腐蚀锈验收
--	--	---	--

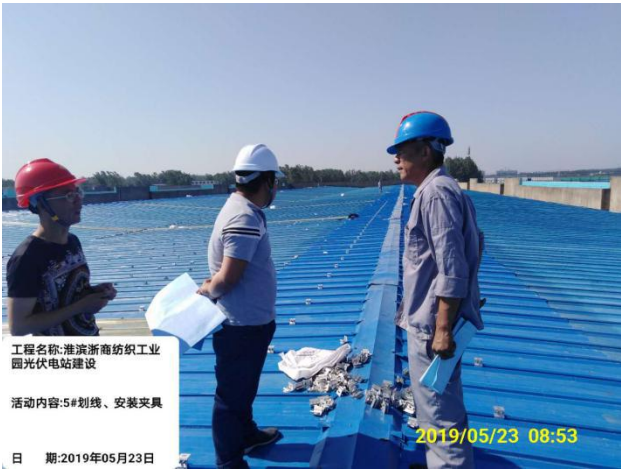
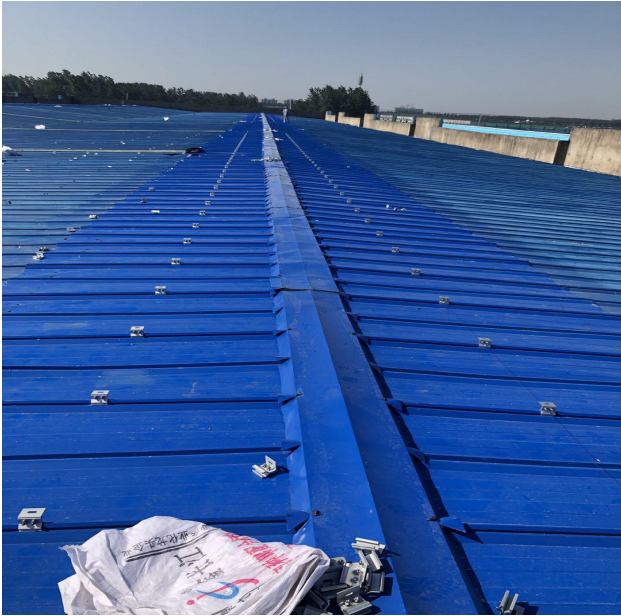


定位放线



5#屋面进行夹具
安装



	  		
设备交付进度		无	
设计交付进度		已出具支架、组件、土建蓝图，	

		电气图纸未出具	
	质量体系运作情况		
	施工图会审	已进行	
	设计交底		
	方案审查		
	技术交底	已进行	
	设计变更	已进行两次变更	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况		
质量	主要工序质量		
	主要原材料质量		
	构（配）件质量	符合要求	
	设备质量		
	质量验评情况	1#气楼彩钢瓦验收（不合格）	已要求进行整改
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

序号	任 务 名 称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施 工 结 束 日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累 计 完 成（完成量 / 总量）	备注
1	屋面气楼改造				/	100%	100%	
2	5#屋面檩条加固	2019.05.15	2019.05.23	2019.05.15	2019.05.23	100%		
3	3#屋面檩条开展	2019.05.22	2019.05.29	2019.05.23		15%		
4	5#屋面夹具定位放线及安装	2019.05.21	2019.05.30	2019.05.23		60%		
5								
6								
7								
8								

二、 下月进度计划

序号	任 务 名 称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施 工 结 束 日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本 月 实 际 完 成（完成量 / 总量）	备注
1	3#屋面檩条加固	2019.05.22	2019.05.29	/	/	100%	40%	单位为厂房
2	4#屋面檩条加固	2019.05.30	2019.06.07					单位为厂房
3	大梁加固	2019.06.10	2019.06.30					单位为厂房
4	设备基础施工	2019.05.28	2019.06.10					
5							/	
6							/	
7								
8				/	/		/	

三、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件（份）	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	3 份	31 人	2	/	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理		
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理		
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理部

2019 年 05 月 25 日
