



编号: CZZH-HJX -YB-03

监 理 月 报

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶光伏发电项目

2019 年 5 月第 03 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2019 年 5 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶光伏发电项目 月次 第 3 次

月报开始时间 2019 年 03 月 01 日 结束日期 2019 年 05 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料


序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶光伏发电项目		照片	13 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

进度	   	本月主要工作： 17#、20#、21#、22#楼檩条加固完成 100%，目前全场（蔬菜区、水果区）檩条加固完成 100%；全场电缆沟开挖、穿管埋设、混凝土浇筑完成 100%；18#、19#、30#、31#、32#夹具、导轨安装完成 100%。	夹具、导轨安装结束；斜撑加固开始；电缆敷设结束；组件、并网柜进场施工。
-----------	--	---	--

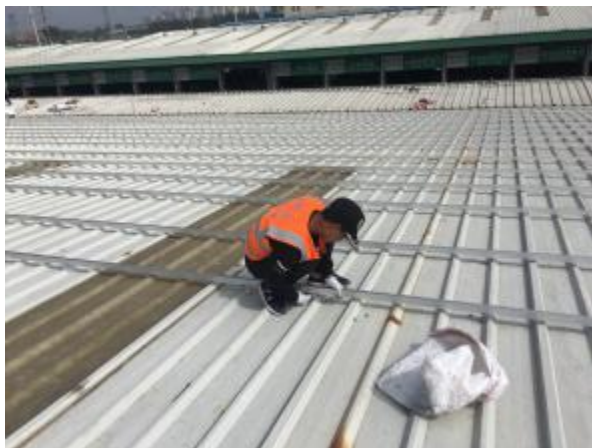

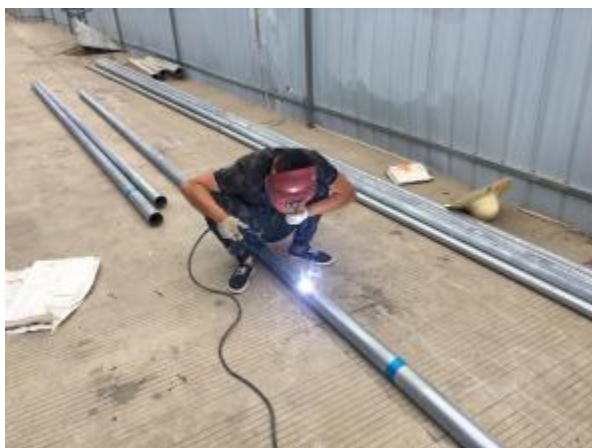

			
	设备交付进度	导轨到场 60%； 夹具、压块等辅 材到场 100%、 68 台逆变器到 场 100%。	加固斜撑全部 到场；支架全部 到场；组件进 场；电缆和并网 柜进场。
	设计交付进度	部分图纸已出。	蓝图交付
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好落实 质量保证体系， 并对运行情况 进行检查	质量保证体系 进行跟踪检查。
	施工图会审	加固斜撑已进 行图纸会审，并 由业主向设计 单位提出斜撑 规格变更。	对图纸进行会 审。
	设计交底	完成	完成
	方案审查	部分已审查	督促施工单位 方案报审。
	技术交底	已交底	做到施工前进 行技术交底。

	设计变更	夹具间距、斜撑规格等待设计变更	联系业主、EPC单位对现场图纸变更部分，尽快让设计单位出设计变更。
安全	安全培训情况	对进场员工已进行安全培训	对新员工进行安全培训。
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行作业前交底，每天早班会进行安全交底	督促施工单位做好安全交底。
	安全措施落实情况	部分已落实，但不够彻底，已要求施工单位认真落实，检查现场存在的安全隐患，及时整改。	督促做好安全措施落实
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好，需要进一步加强。	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	符合要求	加大工序检查力度，规范施工。
	主要原材料质量		材料到场报审、督促EPC单位做

		逆变器、檩条、 夹具、压块辅材 等观感质量合 格；并提供相关 合格证件。	好材料到场提 供产品厂家资 质、合格证、第 三方检测报告 和送检等工作。
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	进行质量跟踪
	设备质量	合格	进行质量跟踪
	质量验评情况	工序施工符合 要求，加强过程 检查力度，加大 工序报验抽查 力度	加大工序抽检 力度。
投资	资金情况	2100 万	/
	款项支付情况	20%	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	EPC 施工合同已 签订	/
	合同执行情况	按合同执行良 好	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

本月 17#、20#、21#、22#檩条加固完成 100%；（水果区 17#-18#-19#-20#-21#-22#）
电缆沟开挖、穿管预埋、混凝土路面浇筑完成；（18#、19#、30#、31#、32#）夹
具、导轨安装 100%。

三、下月进度计划

全场区斜撑加固进场施工；电缆敷设结束；支架安装结束、组件、并网柜等设备进场。

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	2	20 人	2 个	20 人	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性，针对人员不足和材料到场迟缓通过沟通、工地例会要求、监理工作联系单（2 份）等手段加快施工进度。	加固斜撑到场施工；支架安装结束；组件、并网柜等材料到场施工。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查，对问题要求立即整改；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	材料到场进行检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性	材料到场进行检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计

	条文的执行计划；本月发出监理工程师通知单 2 份；召开监理例会 2 次。	划，通过巡检、旁站、测量、指令性文件等手段对施工质量进行有效控制。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理		/
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡检，确保物资不遗失，和 EPC 单位经常保持沟通，确保施工材料及时到场。	和建设单位保持沟通，督促施工单位做好物资供应工作。

常州正衡电力工程监理有限公司

蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

2019 年 05 月 30 日
