

监 理 月 报

工程名称: 烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp
分布式光伏发电项目

2019 年 03 月 第 1 期

总 监 理 工 程 师:



监 理 项 目 部 (章)

报告日期: 2019 年 03 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

月报开始时间：2019 年 03 月 14 日 结束日期：2019 年 03 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目	设备基础	影像	2	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	夹具未到现场	箱变基础的定位、开挖。	屋面导轨、夹具安装。
	设备交付进度	预制仓，箱变，汇流箱等设备未进场	/
	设计交付进度	电子版图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	
	施工图会审	未见纸质版图纸	
	设计交底	未完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位资料同步

	技术交底	未完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改。	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	并网发电	/
	主要原材料质量	电缆外观质量合格。 支架外观检查合格。 组件观感质量合格； 箱变、汇流箱、电缆进行开箱检查	/
	构（配）件质量	进场材料质量合格	
	设备质量		
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

设备基础已经开挖完成，目前在支模，绑扎钢筋准备浇筑。

四、下月进度计划

导轨、夹具安装

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		7人	1	/	/	/


六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	增加施工人员数量
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	/
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	/
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	/
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	/

物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	/
------	--	---



设备基础开挖

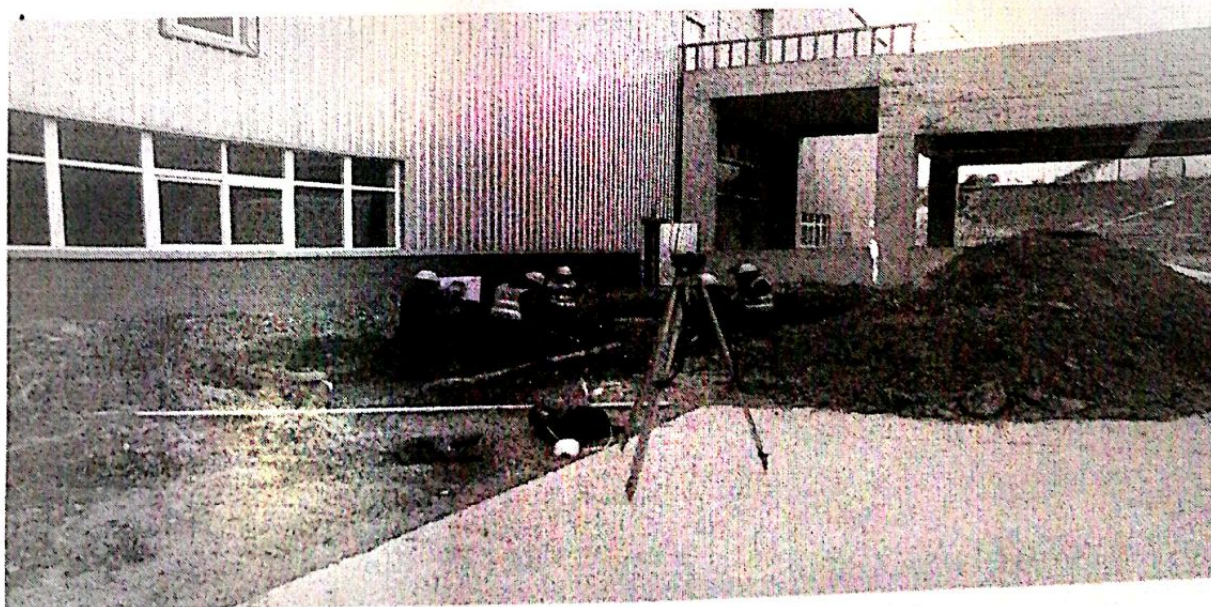

设备基础复测
