



编号: JL-ZH-01

监 理 月 报

工程名称: 太仓振辉一期 5MW 分布式光伏发电项目

2019 年 04 月第 01 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生



报告日期: 2019 年 04 月 26 日

监 理 月 报

工程名称：太仓振辉一期 5MW 分布式光伏发电项目

月次 第 1 次

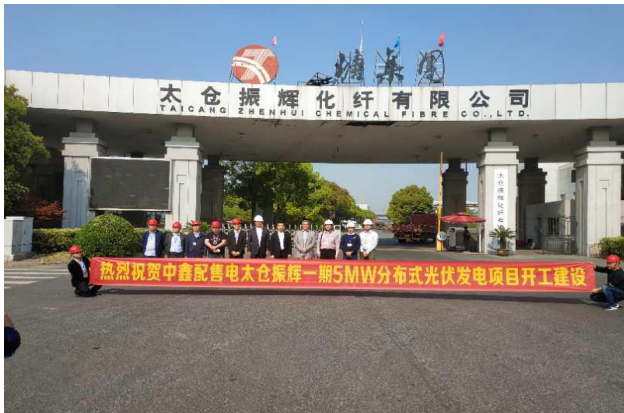
月报开始时间 2019 年 04 月 12 日 结束日期 2019 年 04 月 25 日

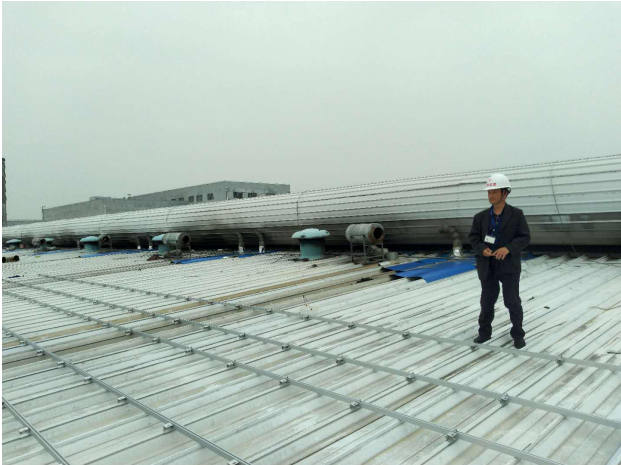
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

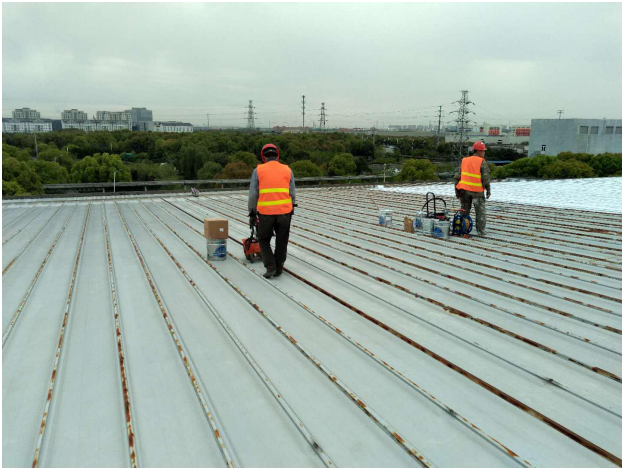
一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	太仓振辉一期 5MW 分布式光伏发电项目	支架安装	影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	 工程开工	工程开工准备工作，支架基础配重浇筑，屋面夹具及檩条施工，脚手架爬梯施工，接地扁铁散料	光伏区厂房加固、支架安装、组件安装、接地安装、桥架安装、电缆敷设、并网柜安装、屋面防护栏安装、光伏区调试并网

进度	 召开会议	发电等
	 支架基础配重	
	 检查施工现场	

	 屋面除锈及防腐  屋面防护栏施工		
	设备交付进度	陆续完成中	督促并完成
	设计交付进度	陆续完成中	督促并完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已进行	完善
	设计交底	完成	
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
	安全		
	安全培训情况	新进场员工已	后续进场施工

		进行安全培训	人员继续安全培训
	安全交底情况	施工单位对危险作业点进行班前交底	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	完善安全防护措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	继续加强
质量	主要工序质量	已检查	加强检查
	主要原材料质量	已检查	加强检查
	构（配）件质量	已检查	加强检查
	设备质量	已检查	加强检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	已完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成	累计完成（完成量 / 总	备注
----	------	--------	--------	--------	--------	-----------	--------------	----

						量 / 总量)	量)	
1	支架安装	20190412	20190605	20190412		43%	43%	
2	组件安装	20190515	20190615					
3	桥架	20190507	20190513					
4	防雷接地	20190615	20190623					
5	汇流箱安装	20190526	20190531					
6	直流电缆铺设	20190610	20190622					
7	交流电缆	20190520	20190620					
8	组串式逆变器安装	20190526	20190531					
9	防火封堵	20190530	20190604					
10	低压并网柜	20190521	20190525					
11	监控系统	20190518	20190618					
12	屋面除锈及防腐	20190412	20190423	20190412		85%	85%	
13	支架基础配重	20190412	20190419	20190412	20190419	100%	100%	
14	钢梁加固	20190428	20190528					

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	支架安装	20190412	20190605	20190412		40%	43%	

2	组件安装	20190515	20190615			40%		
3	桥架	20190507	20190513			60%		
4	防雷接地	20190615	20190623			60%		
5	汇流箱安装	20190526	20190531			100%		
6	直流电缆铺设	20190610	20190622			40%		
7	交流电缆	20190520	20190620			40%		
8	组串式逆变器安装	20190526	20190531			100%		
9	防火封堵	20190530	20190604			40%		
10	低压并网柜	20190521	20190525			100%		
11	监控系统	20190518	20190618			40%		
12	屋面除锈及防腐	20190412	20190423	20190412		15%	85%	
13	支架基础配重	20190412	20190419	20190412	20190419	100%	100%	
14	钢梁加固	20190428	20190528			100%		

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	3 份	28 人	2	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----------	----------

进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	保质保量按合同达到并网条件
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位提前安排物料到场，安排人员、机具进行施工。
