

JXM16

编号：JSJY-JL-YB-02

监 理 月 报

工程名称：江苏金源装备股份有限公司 2.97MW 分布式光伏发电项目

2019 年 08 月 第 02 期

监理项目部（章）：_____

总监理工程师：_____

报告日期：2019 年 08 月 31 日

监理月报

1. 本月工程实施情况（形象进度表、照片）

- 1、屋面围栏安装完成。
- 2、1#、2#厂房加固完成，3#厂房加固完成 50%。
- 3、1#、2#、3#厂房屋面夹具支架安装完成。
- 4、1#屋面组件安装完成 0.4MW，2#屋面组件安装全部完成，3#屋面组件安装完成 80%。
- 5、1#屋面桥架开始安装。

2. 本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、本月监理日常巡视工地，对质量、进度、安全文明等进行检查，发现问题及时提出并督促整改；
- 2、本月共发出监理通知单 6 份，监理工作联系单 4 份，监理检查记录 6 份；
- 3、本月工组织召开 5 次监理工地例会，1 次夏季安全生产专题会，1 次现场施工进度专题会。
- 4、本月共进行 3 次平行检验，分别为 1#、2#、3#屋面夹具支架安装工程验收。
- 5、对进场材料设备进行了到货检（厂房加固材料、电缆桥架、逆变器等）。
- 6、旁站组件、逆变器材料设备吊装作业。

3. 工程存在问题及建议

- 1、部分工人安全文明意识较差，施工现场不戴安全帽和吸烟现象时有发生。
- 2、1#屋面施工班组施工工艺较差，进度偏慢。
- 3、3#厂房加固工作现场难度大。

针对以上问题，监理部与施工单位及时提出沟通，要求施工单位加强现场管理和技术交底工作，施工单位已决定更换 1#施工班组的组件安装工作，有 2#屋面施工班组负责，3#厂房加固工作与现场厂方生产冲突较大、且现场设备多，曲臂车部分地方无法展开，施工单位决定夜间施工，加强与厂方车间管理人员沟通。



4. 下月监理工作重点

- 1、现场日常巡视，对组件安装、桥架安装、电缆敷设、厂房加固等工序进行验

收；

- 2、对现场材料设备进行到场检查，电缆、汇流箱等；
- 3、现场安全文明管理工作；
- 4、配合并网验收相关工作。

工程影象图片：

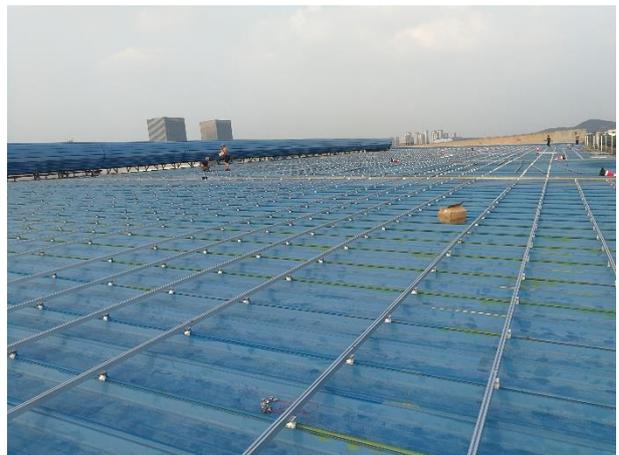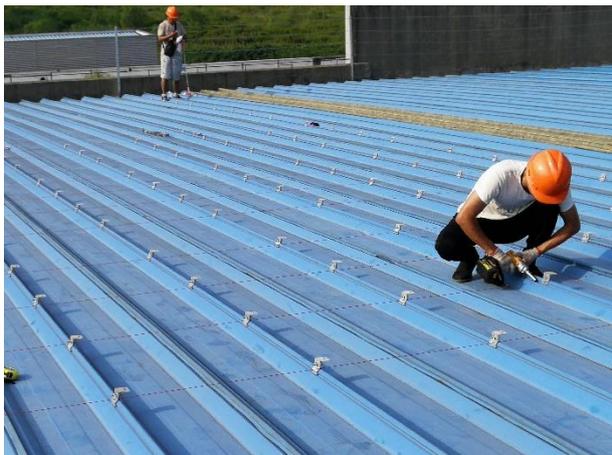



江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目监理项目部

2019 年 08 月 31 日
