

编号: CZZHJL-YB- 002

监理月报

汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目

2019 年 06 月 (第 2 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目监理部

报告日期: 2019 年 05 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目 第 06 月次 第 2 次 月报
 开始时间 2019 年 06 月 01 日 结束日期 2019 年 06 月 30 日
 理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目		影像	7	另附


二、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	2019、6、26 日顺利并网发电运行 安全活动   并网 试验 	1) 审查试验单位资质报审资料、施工过程资料催促; 2) 检查桥架安装、电缆敷设; 3) 检查导轨、组件安装质量; 4) 检查并网前并网柜安装、试验、调试工作; 5) 检查接地安装、测试; 6) 监理资料编制整理	1、清洗系统质量检查; 2、A、C 厂房桥架盖板安装、接地焊接、防腐; 3、D 厂房加固安全、质量检查; 4、检查并网运行情况; 5、检查消缺情况; 6、监理资料编制整理及工程监理服务延期确定

电业局验收



开口电压测量

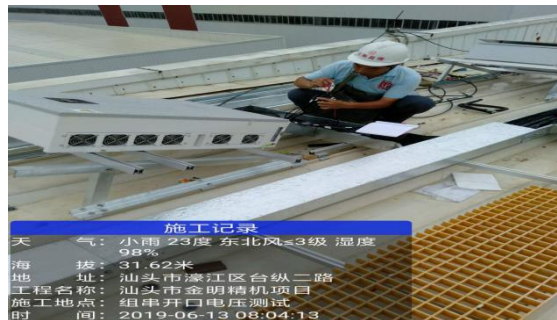

夹具拉拔测试



防火泥封堵



设备交付进度 (计划 25 个工作日) 5 月 3 日-5 月 28 日

完成

设计交付进度 (计划 4 月 19 日-4 月 26 日)

电施蓝图, 土建蓝图交付完成

	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良	检查
	施工图会审	已会审	保持
	设计交底	现有已交底	保持
	方案审查	未报审	督促施工单位做好施工同步资料
	技术交底	已交底	
	设计变更	无变更	
安全	安全培训情况	已进场培训，屋面四周设置警示标志	督促施工单位
	安全交底情况	周例会重视	保持
	安全措施落实情况	厂内爬梯有安全警示牌	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施到位。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	按质量台账检查	监理跟踪整改
	主要原材料质量	进场检查符合质量要求	保持
	构（配）件质量		把控好进场材料质量关
	设备质量	进场检查外观完好	
	质量验评情况	发现问题有联系单，建立质量台账，记录细	加强过程检查，确保整改合格
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证		/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况		做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本实际完成（完成）	累计完（完成量 / 总量）	备注
分布式光伏场地、中易建设有限公司								
1	电缆沟开挖线	2019、04、26	2019、05、15		2019、05、16	100%	100%	完成
2	定位放线	2019、05、13	2019、05、13	2019、05、15	2019、05、18	100%	100%	完成
3	支架安装	2019、05、15	2019、06、04	2019、05、19	2019、06、16	85%	100%	
4	组件安装	2019、06、2	2019、06、13		2019、06、22	100%	100%	
5	电缆（直流）	2019、06、6	2019、06、10	/	2019、06、19	100%	100%	
6	汇流箱-逆变器电缆	2019、05、11	2019、06、05	/	2019、06、23	100%	100%	
7	高压电缆敷设	2019、05、11	2019、06、05	2019、05、12	2019、06、02	50%	100%	
8	汇流箱逆变器安装	2019、05、22	2019、06、03	2019、05、25	2019、06、23	50%	100%	
9	并网柜安装	2019、06、09	2019、06、09	2019、05、29	2019、06、09	50%	100%	
10	桥架安装	2019、05、22	2019、06、03	2019、05、25		50%	100%	
11	接地安装	2019、06、02	2019、06、14	2019、06、16		50%	50%	
12	调试消缺	2019、06、12	2019、06、14	2019、06、30				
13	清洗系统			2019、06、27				
14	D 厂房加固							

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完	累计完成（完成量 / 总量）	备注
分布式光伏场地、湖北湘电建设工程有限公司								
1	电缆沟开挖线	2019、04、26	2019、05、15		2019、05、16	100%	100%	完成
2	定位放线	2019、05、13	2019、05、13	2019、05、15	2019、05、16	100%	100%	完成
3	支架安装	2019、05、15	2019、06、04	2019、05、19	2019、06、16	100%	100%	
4	组件安装	2019、06、2	2019、06、13		2019、06、22	100%	100%	
5	电缆（直流）	2019、06、6	2019、06、10	/	2019、06、19	100%	100%	
6	汇流箱-逆变器电缆	2019、05、11	2019、06、05	/	2019、06、23	100%	100%	
7	高压电缆敷设	2019、05、11	2019、06、05	2019、05、12	2019、06、19	100%	100%	
8	汇流箱逆变器安装	2019、05、22	2019、06、03	2019、05、25	2019、06、23	100%	100%	
9	并网柜安装	2019、06、09	2019、06、09	2019、05、29	2019、06、09	100%	100%	
10	桥架安装	2019、05、22	2019、06、03	2019、05、25	2019、06、23	100%	100%	
11	接地安装	2019、06、02	2019、06、14	/		100%	100%	
12	调试消缺	2019、06、12	2019、06、14	/		100%	100%	
13	清洗系统			2019、06、27		100%	100%	
14	D 厂房加固					100%	100%	

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	2	20	1	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	已基本达到施工计划生产节点。	按施工计划，要求施工单位按期完成施工工作
安全管理	安全防范意识，从没放松	现场施工有序进行，做好安全警示牌宣传工作
质量管理	隐蔽工程进行检查验收；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求 进行施工。
技术管理	现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	监督检查执行情况。
造价管理	本月已审核总包进度款清单	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的 工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位、总包做好建设物资进场工作。	督促总包采购材料下月辅助材料进场工作

本月总结

1、项目开工（2019.04.26）至209、6、26顺利并网发电，50%的接地焊接、格栅板安装、清洗系统都在有序进行；所有施工区域都在监理可控范围内。

2、目前项目人员一名，满足合同要求。

3、自我方监理2019.04.25进场，设计单位2019.04.25进行设计技术交底完成未参加到，施工单位2019、04、26开始施工，电缆沟开挖穿管、敷设、路面恢复完成，电缆敷设完成，汇流箱、逆变器、桥架安装完成，组件安装完成，接地焊接完成50%。

4、材料进场甲供材料及时，基本满足施工进度需求。督促施工单位增加安装施工人员进场，确保按照合同彻底竣工验收。

每天巡视于现场，对施工人员安全全程监督并提出警告，必要时开出监理通知单及处罚单。

常州正衡电力工程监理有限公司
汕头市杭泰金明精机1.53MWp分布式光伏发电监理项目部

2019年06月30日

监理项目部
