



正衡监理

编号: ZHJL-YB-2020726

监 理 月 报

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

2020 年 07 月 第 11 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2020 年 07 月 26 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

月次_第11次_

月报开始时间_2020年06月26日_结束日期_2020年07月25日_

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	赫章县大山坪风电场 项目	/	影像	/	/

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------




进度



14#风机基础垫层浇筑监理旁站



14#风机基础验槽

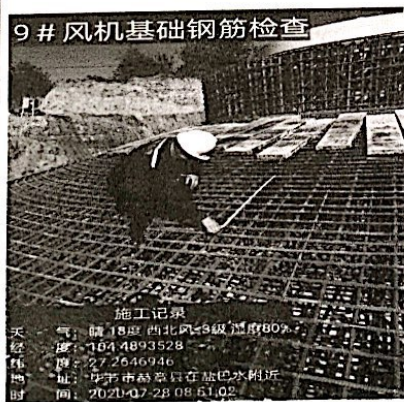

9#风机基础钢筋检查

①、升压站：升压站设备间环氧地坪施工完成。事故油池通风管安装，连接管安装完成。升压站电气调试完成。升压站绝缘子更换完成。消防报警系统安装完成。电动伸缩门安装完成。升压站站外道路切缝整改完成。消防系统安装。

②、风机位：2#风机基础开挖完成、垫层浇筑完成。基础环吊装调平完成、钢筋绑扎完成、模板安装完成、预埋管安装完成、接地完成、沉降观测柱模板完成，浇筑完成。9#风机平台开挖完成、基础环吊装调平完成、基础钢筋绑扎完成、9#风机道路换填完成、基坑开挖完成、垫层浇筑完成、浇筑完成。14#风机道路换填


①、升压站土建：整改消缺。

②、风机位：14#风机钢筋加工绑扎、模板安装、预埋管安装、风机接地焊接、沉降观测柱模板安装、基础浇筑。15#风机平台开挖、基础开挖、垫层浇筑、钢筋加工绑扎、模板安装、预埋管安装、风机接地焊接、沉降观测柱模板安装、基础浇筑。1#风机道路开挖、平台开挖、基坑开挖、垫层浇筑、钢筋加工绑扎、模板安装。11#风机平台开挖、基础开挖、垫层浇筑、钢筋加工绑扎、模板安装、预埋管安装、风机接地焊接、沉降观测柱模板安装、基础浇筑。


③、道路：1#主线开挖。

④、弃渣场挡土墙砌筑。



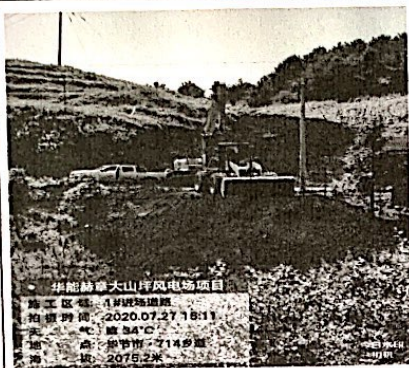

1#主线进场道路开挖

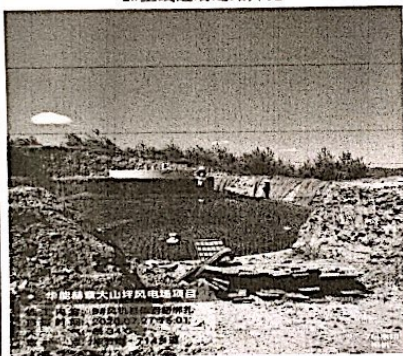

9#风机基础钢筋绑扎




14#风机基础开挖

平台开挖完成、14#风机道路开挖完成换填完成、14#风机基坑开挖完成、垫层浇筑完成。15#风机道路换填完成、15#平台开挖完成75%。14#风机道路开挖完成换填完成，平台开挖完成50%。12#风机基础钢筋加工完成、基础环吊装调平完成、钢筋转运完成、钢筋绑扎完成60%。2#线道路修整。X1#风机平台开挖完成30%。14#风机道路开挖完成70%、平台开挖完成20%。13#风机基础钢筋绑扎完成、模板安装完成、预埋管安装完成、风机接地完成、沉降观测柱模板安装完成、浇筑完成。10#风机基础浇筑完成。

③、道路: 1#主线道路开挖完成 1100

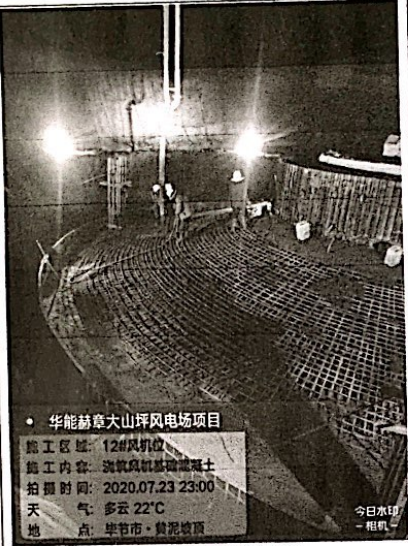

	 12#风机基础混凝土浇筑	米。	
	设备交付进度	陆续完成中	督促并完成
	设计交付进度	陆续完成中	督促并完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已进行	完善
	设计交底	道路基础、风机基础已交底、电气一、二次图已交底	陆续完成其他工序图纸会审交底
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	有	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单	完善班前交底



		位对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实不彻底,已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	增加安全文明标语标牌
质量	主要工序质量	已完成	已完成
	主要原材料质量	已完成	已完成
	构(配)件质量	已完成	已完成
	设备质量		已完成
	质量验评情况	工序施工符合要求	已完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	12# 风机基础开挖、钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑施工完成	2020.07.10	2020.07.30	2020.07.15	2020.07.25	100%		
2	9# 风机平							



	台开挖完成、基础环吊装调平完成、基础钢筋绑扎、9#风机道路换填完成、基坑开挖完成、垫层浇筑完成。	2020.07.15	2020.07.30	2020.07.22	2020.07.31	80%		
3	14#风机道路换填平台开挖完成、14#风机道路开挖完成换填完成、14#风机基坑开挖完成	2020.04.16	2020.04.23	2020.04.16	2020.04.30	100%		
4	13#风机基础钢筋绑扎完成、模板安装完成、预埋管安装完成、风机接地完成、沉降观测柱模板安装完成、浇筑完成。	2020.07.16	2020.07.23	2020.07.29	2020.04.30	100%		
5	1#主线毛路开挖	2020.07.01	2020.07.31	2020.07.01	2020.07.25			



三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	14# 风机 钢筋加工 绑扎、模 板安装、 预埋管安 装、风机 接 地 焊 接、沉降 观测柱模 板安装、 基 础 浇 筑。	2020.07.01	2020.07.15			100%		
2	15# 风机 平台开 挖、基础 开挖、垫 层浇筑、 钢筋加工 绑扎、模 板安装、 预埋管安 装、风机 接 地 焊 接、沉降 观测柱模 板安装、 基 础 浇 筑。	2020.07.10	2020.07.30			100%		
3	1# 风机 道路开 挖、平台 开挖、基 坑开挖、 垫层浇 筑、钢筋 加 工 绑 扎、模板	2020.07.01	2020.07.30			100%		



	安装。							
4	11#风机平台开挖、基础开挖、垫层浇筑、钢筋加工绑扎、模板安装、预埋管安装、风机接地焊接、沉降观测柱模板安装、基础浇筑。	2020.07.15	2020.07.30			100%		
5	11#弃渣场挡土墙砌筑	2020.07.01	2020.07.30			100%		

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事故	划文件（份）	人数	分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	2份	70人	2	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，加快风机位进度。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限



	度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

