



正衡监理

编号: ZHJL-YB-20191225

监 理 月 报

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

2020 年 04 月 第 08 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2020 年 04 月 26 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

月次 第 8 次

月报开始时间 2020 年 03 月 26 日 结束日期 2020 年 04 月 25 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	赫章县大山坪风电场 项目	/	影像	/	/

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------



进度




①、升压站进站道路、站内道路混凝土浇筑完成。路沿石安装完成。站内道路边空地石子铺设完成。电缆沟盖板铺设完成，综合配电楼、生活楼、SVG 楼室、内外墙面刮腻子完成，屋面防水施工完成。生活楼内宿舍卫生间卫浴安装完成。吊顶完成。SVG 室、GIS 室、35KV 室、继保室防盗门、卷闸门安装完成。消防楼梯、GIS、SVG、生活楼钢爬梯安装完成。站内所有护栏安装完成。

②、升压站内一次接线完成 95%，二次接线完成 90%。母线桥架安装完成，35KV 室内屏柜、继保室内屏柜接线完成，以及各屏柜接地完成。避雷针构架吊装、接地完成。

①、配合直流厂家安装蓄电池；母线桥安装完成；二次放线、接线完成；一次电缆终端安装完成；站内一次导线及金具安装完成；SVG 设备安装及调试；通讯设备安装；一次二次设备试验；角比差试验；升压站具备带电条件；升压站大门安装完成；升压站外墙真石漆喷涂完成；升压站生活楼室内装饰装修完成；升压站进站道路边坡绿化完成；综合楼继保室静电地板安



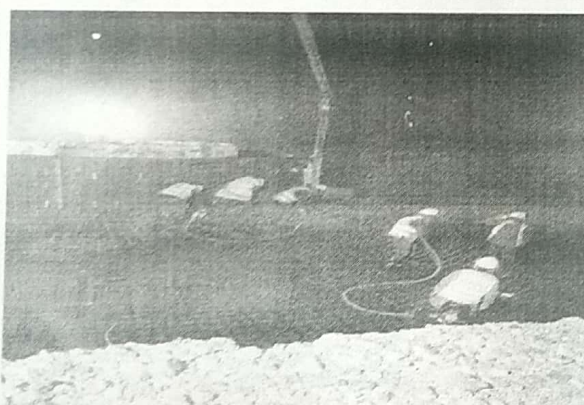

③、18#、16# 风机基础钢筋绑扎、预埋热镀锌扁铁接地、电缆管、排水管、混凝土浇筑完成。17#风机基础钢筋绑扎、预埋热镀锌扁铁接地、电缆管、排水管、模板支护完成。10#风机基础土方开挖完成。风机进场2#主路换填1000m。④、外线送出工程：铁塔基础线路复测全部完成；铁塔基础分坑测量放样完成36基；浇筑完成36基；铁塔组立完成32基；铁塔螺栓紧固完成32基。29号-36号导线、地线展放完成100%。G23号—G29号展放牵引绳工作完成40%，清理通道，整理金具，附件安装。

装完成；设备间环氧自流平施工完成；升压站土建收尾完成；10#风机基础开挖完成；17#风机基础钢筋绑扎完成、浇筑完成；10#风机基础换安装调平完成、钢筋绑扎基础浇筑完成；13#风机基础开挖；15#风机平台开挖、基础开挖；19#风机平台开挖、基础开挖。



	设备交付进度	陆续完成中	督促并完成
	设计交付进度	陆续完成中	督促并完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已进行	完善
	设计交底	道路基础、风机基础已交底、电气一、二次图已交底	陆续完成其他工序图纸会审交底
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	有	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	完善班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	增加安全文明标语标牌
质量	主要工序质量	已完成	已完成
	主要原材料质量	已完成	已完成
	构（配）件质量	已完成	已完成
	设备质量		已完成
	质量验评情况	工序施工符合要求	已完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/



合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	升压站综合楼、生活楼、SVG楼内外墙批腻子两遍完成。	2020.04.01	2020.04.15	2020.04.02	2020.04.18	100%		
2	升压站综合楼、生活楼、SVG楼外墙喷涂彩石漆	2020.04.15	2020.04.30	2020.04.18		50%		
3	主变油池铁篦子、鹅卵石安装、铺设施工完成	2020.04.20	2020.04.25	2020.04.20	2020.04.27	100%		
4	升压站室内外电缆沟盖板安装完成	2020.04.10	2020.04.15	2020.04.10	2020.04.13	100%		
5	综合配电楼、生活楼、SVG	2020.04.01	2020.04.30	2020.04.02	2020.04.20	100%		



	楼屋面防水施工完成							
6	综合配电楼继保室静电地板安装完成	2020.04.20	2020.04.25	2020.04.20	2020.04.25	100%		
7	升压站综合楼、配电楼、生活楼、SVG楼爬梯、消防楼梯、护栏安装完成	2020.04.13	2020.04.20	2020.04.13	2020.04.20	100%		
8	升压站进站道路混凝土硬化、站内外道路路沿石铺设施工完成	2020.04.05	2020.04.15	2020.04.07	2020.04.14	100%		
9	16# 风机基础钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑施工完成	2020.04.05	2020.04.15	2020.04.01	2020.04.13	100%		
10	17# 风机基础钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑施工完成	2020.04.16	2020.04.23	2020.04.16	2020.04.25	50%		混凝土未浇筑。
11	10# 风机基础开挖完成	2020.04.01	2020.04.20	2020.04.01	2020.04.26	100%		设计要求换填开挖1m,局部开挖换填1.5m。
12	风机位进场1#、2#道	根据道路情况,实时进行换填。		2020.04.10	2020.04.20			本月完成1000m



	路换填							
13	1# 风 机位平台 放线, 1# 主路、1# 支路放线 完成	2020.04.15	2020.04.20	2020.04.20	2020.04.26	100%		
14	外线 送出： 23-36# 铁 塔导线、 接地线、 光纤、附 件安装完 成	2020.04.01	2020.04.25	2020.04.01	2020.04.20	100%		
15	18-2 3 铁塔导 线安装完 成量			2020.04.20	2020.04.26	100%		

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	挡土墙 砌筑完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
2	升压站 围墙砌 筑完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
3	消防水 池基础 浇筑完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
4	升压站 给排水 系统完	2020.01.01	2020.01.30			100%		



	成							
5	升压站 道路换 填浇筑 完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
6	综合配 电楼继 保室设 备安装 完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
7	GIS室设 备安装 完成	2020.01.01	2020.01.30			100%		
8	外送工 程涉及 塔基共 计 36 基,累计 完成基 础开挖 36 基, 浇筑完 成 36 基,组塔 完成 36 基,同步 开展架 线作业	2020.01.01	2020.01.30			100%		
9								
10								
11								
12								

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	2 份	70 人	2	/	/	/



五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，升压站 SVG 基础砼浇筑完成、避雷针安装，18#风机基础换填。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

