



编号: ZHJL-YB-20190826

监 理 月 报

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

2019年8月 第 03期

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐耀生



报告日期: 2019年8月26日

监 理 月 报

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

月次 第 3 次

月报开始时间 2019 年 7 月 25 日 结束日期 2019 年 8 月 26 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	赫章县大山坪风电场 项目		影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划

进度	 工程名称：赫章县大山坪风电场项目 时间：2019-08-24 09:20:02  工程记录 施工区域：升压站 施工内容：生活楼屋面钢筋绑扎平行检验 拍摄时间：2019.08.22 15:28 天气：阴 30℃ 地点：毕节市·赫章县768县道 	升压站生活楼主体浇筑完成，升压站主变基础浇筑完成，升压站防火墙完成，升压站配电房基础浇筑完成，主体浇筑完成，SVG设备基础主体完成，构支架基础完成，5#风机基础浇筑完成，14#、15#、16#风机平台开挖，2#主路修路等
-----------	--	---



星期二

2019-08-13 ☁️ 22°

今日心情: ❤️❤️❤️❤️❤️

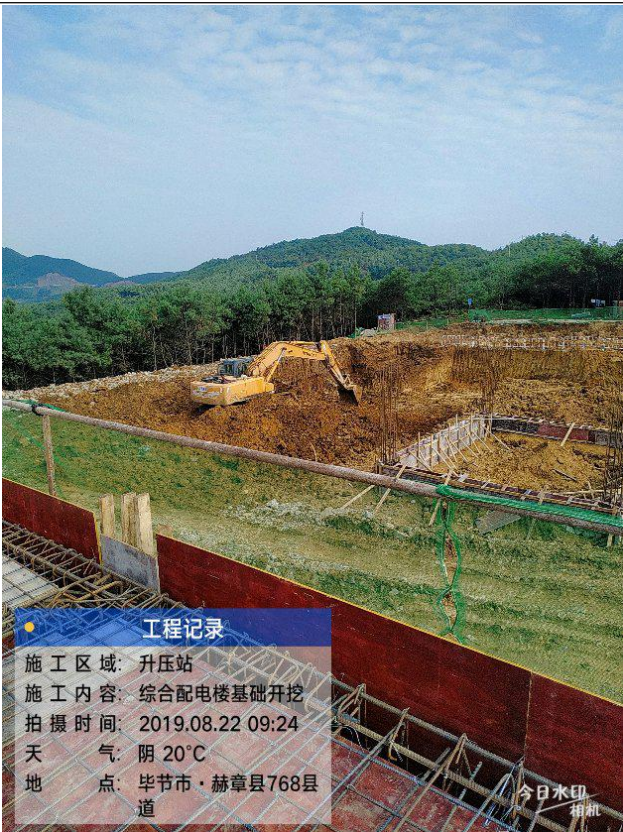
升压站及5#风机位安全检查

📍贵州省毕节赫章县

升压站生活楼标高校核



天气: 多云 20度 西风≤3级 湿度87%
工程名称: 赫章县大山坪风电场项目
时间: 2019-08-01 09:40:54

	 工程记录 施工区域: 升压站 施工内容: 综合配电楼基础开挖 拍摄时间: 2019.08.22 09:24 天气: 阴 20°C 地点: 毕节市·赫章县768县道		
	设备交付进度	陆续完成中	督促并完成
	设计交付进度	陆续完成中	督促并完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未进行	完善
	设计交底	道路基础、风机基础已交底	陆续完成其他工序图纸会审交底
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促新进员工安全培训
	安全交底情况	督促施工单位	完善班前交底

		对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	增加安全文明标语标牌
质量	主要工序质量	已完成	已完成
	主要原材料质量	已完成	已完成
	构（配）件质量	已完成	已完成
	设备质量		已完成
	质量验评情况	工序施工符合要求	已完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	升压站进	2019 年 5 月	2019 年 6	2019 年 6	2019 年 8		100%	临时道路

	站道路修整	20 日	月 15 日	月 6 日	月 15 日			
2	5#风机基础开挖	2019 年 6 月 20 日	2019 年 7 月 5 日	2019 年 6 月 20 日	2019 年 7 月 25 日		100%	
3	升压站生活楼基础浇筑完成	2019 年 6 月 25 日	2019 年 7 月 17 日	2019 年 6 月 25 日	2019 年 7 月 17 日		100%	
4	升压站 SVG 基础开挖	2019 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 10 日	2019 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 10 日		100%	
5	升压站避雷针基础挖槽	2019 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 10 日	2019 年 7 月 5 日	2019 年 7 月 10 日		100%	
6	升压站配电房基础开挖	2019 年 8 月 23 日	2019 年 8 月 25 日	2019 年 8 月 23 日	2019 年 8 月 25 日	100%	100%	
7	升压站配电房基础换填	2019 年 8 月 24 日	2019 年 8 月 26 日	2019 年 8 月 24 日	2019 年 8 月 26 日	100%	100%	
8	升压站生活楼主体钢筋及模板安装完成	2019 年 8 月 10 日	2019 年 8 月 28 日	2019 年 8 月 10 日		95%	95%	
9	升压站主变基础换填完成	2019 年 8 月 10 日	2019 年 8 月 28 日	2019 年 8 月 10 日		75%	75%	
10	5#风机基础垫层浇筑完成	2019 年 8 月 17 日	2019 年 8 月 17 日	2019 年 8 月 17 日	2019 年 8 月 17 日	100%	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
1	升压站生活楼主体浇筑完成	2019 年 8 月 28 日	2019 年 8 月 29 日			100%		
2	升压站 SVG 基础	2019 年 8 月 27 日	2019 年 9 月 26 日			75%		

	主体完成							
3	升压站配电房基础承台浇筑完成	2019 年 8 月 29 日	2019 年 9 月 26 日			100%		
4	升压站主体浇筑完成	2019 年 8 月 29 日	2019 年 9 月 17 日			100%		
5	5#风机基础浇筑完成	2019 年 8 月 30 日	2019 年 9 月 26 日			100%		
6	升压站配电房主体浇筑完成	2019 年 8 月 29 日	2019 年 9 月 26 日			100%		
7								
8								
9								
10								
11								
12								

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	2 份	26 人	2	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	根据工作面合理增加人员及机械，升压站 SVG 基础完成、避雷针安装，5#风机基础开挖完成
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。
