



编号: JXM15-NJBT-06

# 监 理 月 报

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

2019年11月

项目监理部 (章)

总监理工程师:



报告日期: 2019年11月27日


# 监 理 月 报

工程名称： 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 月次 第 6 次


月报开始时间 2019 年 10 月 26 日 结束日期 2019 年 11 月 27 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

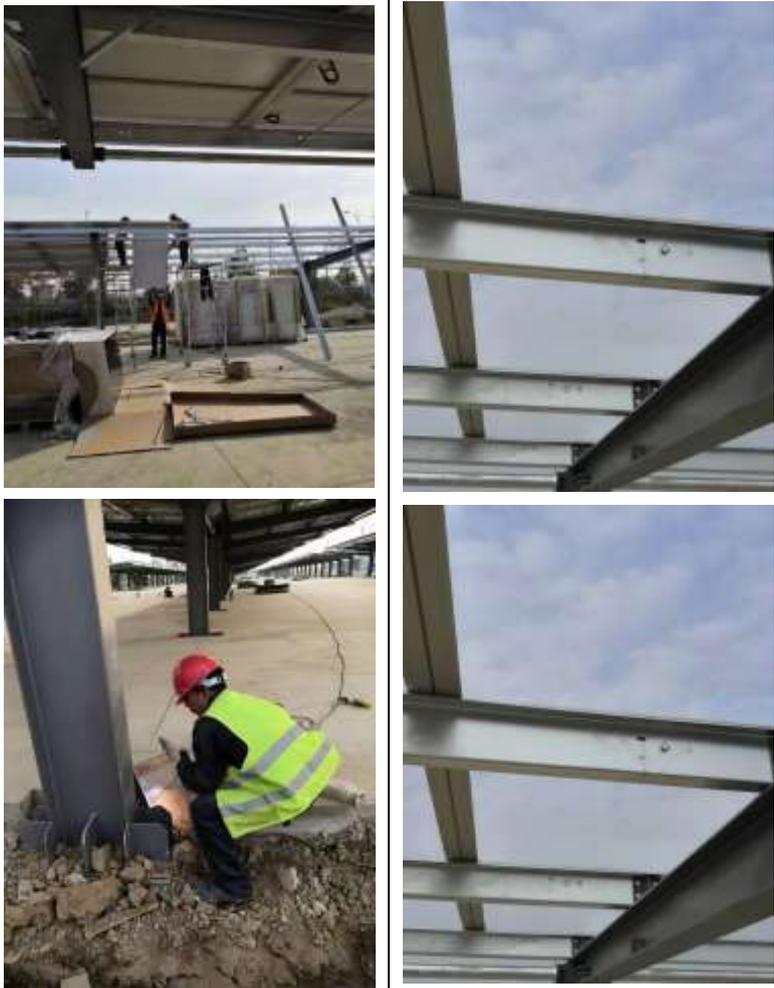序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目		照片	18	进度、质量、安全



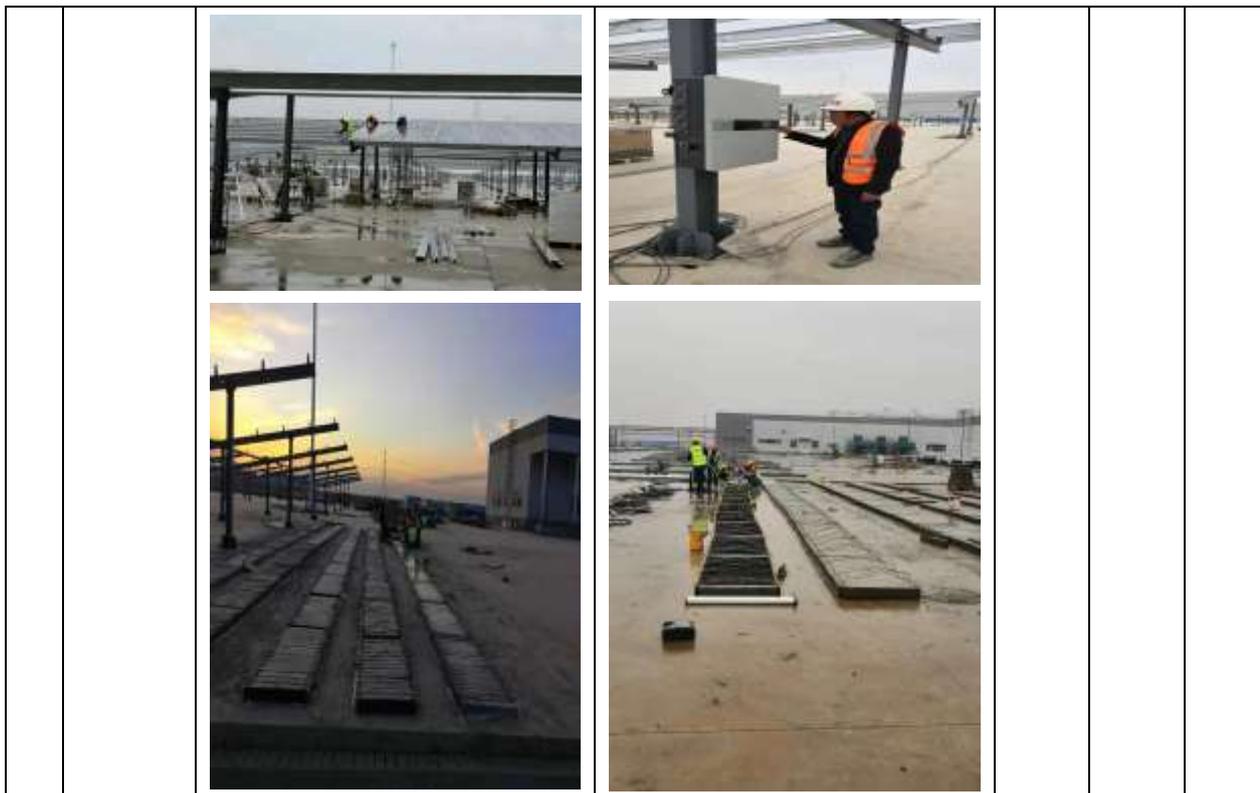

## 二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	车棚区域的土建工程	成品车棚二次混凝土浇筑，设备基础开挖、砌筑； 员工车棚组件安装； 组件条形混凝土基础预制	支架基础预制； 钢筋下料；钢筋笼焊接；
	钢结构安装工程	成品车棚钢梁安装完成	成品车棚拉杆构配件安装完成；
	设备交付进度	无	无
	设计交付进度	/	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	完成车棚土建部分施工图会审	
	设计交底	土建设计已交底	督促后续工序设计交底

	方案审查	土建部分资料已报审	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	土建部分技术已交底	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	组织新进场员工安全培训
	安全交底情况	对钢筋绑扎、临时用电、工器具使用、混凝土浇筑等安全文明施工进行监督检查。	对钢构安装、组件安装登高作业等安全文明施工进行监督检查。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	核对图纸，检查车棚基础钢筋、预埋件加工制作，混凝土浇筑前验收	检查车棚基础、车棚接地、车棚埋管、电缆沟等施工质量
	主要原材料质量	混凝土、钢筋、扁铁、钢管等	砂子、石子、水泥、砖
	构(配)件质量	钢结构主件和加固材料、组件	钢结构主件和加固材料、组件
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

### 三、本月进度情况

- 1、成品车棚组件安装累计 9 架；支架基础钢筋下料累计完成 75%；钢筋笼焊接 54%；逆变器安装 50 台；
- 2、组件到货累计 8 车；1\*4 电缆到货累计 199979 米；
- 3、成品车棚钢结构安装累计完成立柱及钢梁 39 组、檩条拉杆安装 28 组。

#### 四、下月进度计划

- 1、成品车棚组件安装；
- 2、成品车棚钢构安装完成；
- 3、员工车棚 1\*4 电缆绑扎、穿管
- 4、焊装车间组件安装。

#### 五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		26 人	2	/	/	/

#### 六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管 理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	范意识，落实安全文明施工措施。 审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施； 监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	混凝土、钢筋、扁铁、钢管、钢结构等原材料的进场检查；检查车棚基础、车棚接地、车棚埋管、电缆沟、钢构安装等施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	/	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理	/	对施工单位申请的工程款及时进行评审
物资供应	/	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

2019 年 11 月 27 日
