



正衡监理

编号: JXM15-NJBT-08

监 理 月 报

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

2020年03月

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2020年3月29日

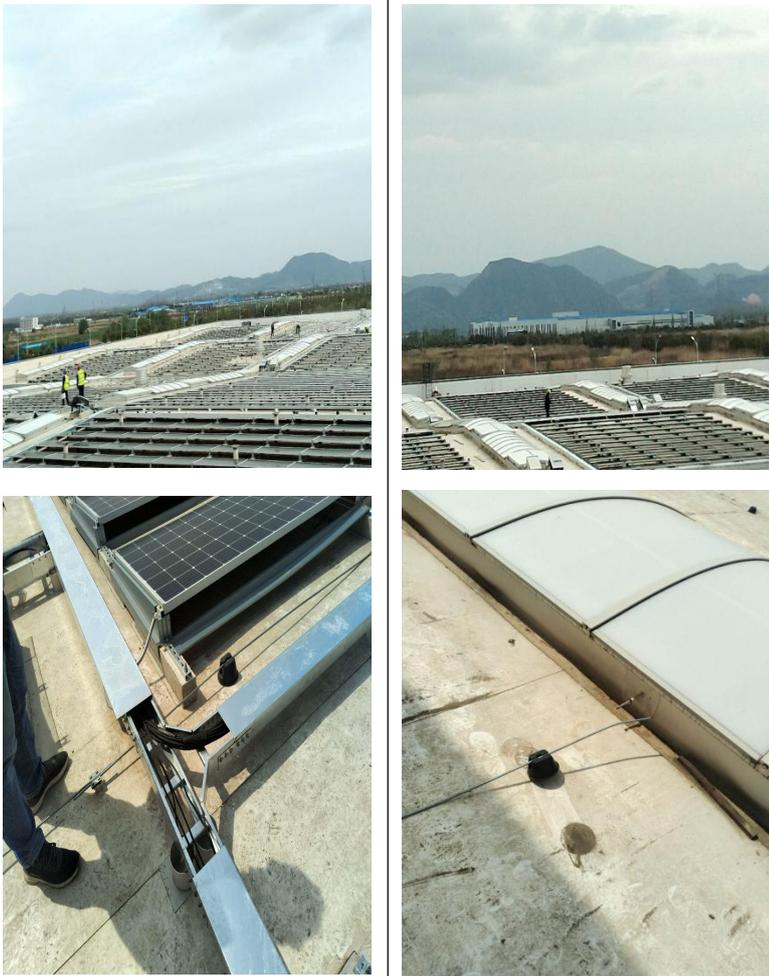
监 理 月 报

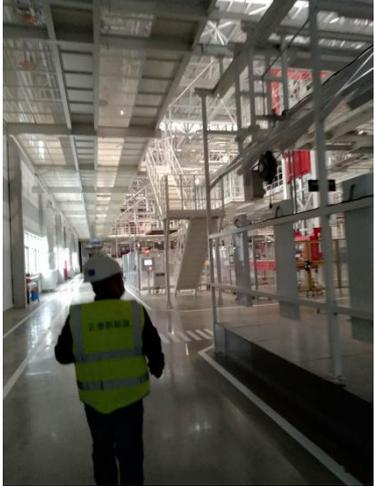
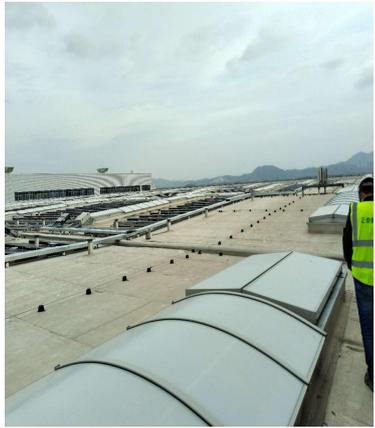
工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 月次 第 9 次

月报开始时间 2020 年 03 月 04 日 结束日期 2020 年 03 月 29 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目		照片	9	进度、质量、安全

		 	  			
--	--	--	---	--	--	--

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

	设备交付进度	焊装车间、总装车间设备接线施工，并网	总装车间部分组件安装
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	无	无
	方案审查	钢结构安装已报审	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	无	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	组织新进场员工安全培训
	安全交底情况	对焊装车间、总装车间的设备安装临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。	对设备安装、组件安装登高作业等安全文明施工进行监督检查。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	检查车棚基础、车棚接地、车棚埋管、电缆沟等施工质量	对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时整改
	主要原材料质量	组件、变压器、逆变器、电缆	组件、变压器、逆变器、电缆
	构（配）件质量	钢结构油漆粉刷收尾工作	对钢结构油漆厚度进行检查
	设备质量	基本符合要求	对设备进行检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

三、本月进度情况

- 1、成品车棚钢结构，进行油漆粉刷施工；
- 2、焊装车间设备安装及电缆敷设；
- 3、总装车架电缆敷设、设备安装及接线；
- 4、并网柜等设备进行电缆头制作；
- 5、5并网点进行并网送电。

四、下月进度计划

- 1、已并网工程进程消缺。
- 2、焊装车间屋顶土建施工、电气施工及并网；
- 3、总装车间部分组件安装。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		25人	2	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管 理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改

	<p>培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。</p> <p>审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。</p>	<p>要求并限期改正。</p>
质量管理	<p>督促施工单位质量通病防治措施；</p> <p>监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。</p>	<p>原材料的进场检查；检查施工质量；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。</p>
技术管理	/	<p>督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。</p>
造价管理	/	<p>对施工单位申请的工程款及时进行评审</p>
物资供应	/	<p>协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。</p>

常州正衡电力工程监理有限公司

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

2020 年 03 月 29 日
