



编号: JXM15-NJBT-10

监 理 月 报

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

2020 年 05 月

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2020 年 5 月 25 日

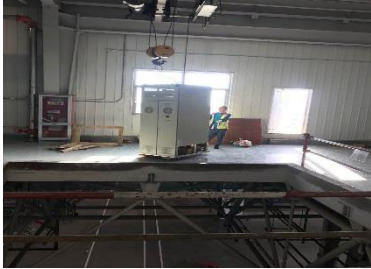
监 理 月 报

工程名称： 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 月次 第 10 次

月报开始时间 2020 年 05 月 01 日 结束日期 2020 年 05 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称		资料类型	资料数量	备注
1	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目	  	  	照片	16	进度、质量、安全

		         			
--	--	--	--	--	--

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	设备交付进度	焊装车间新增 1MW 项目组件安装、电缆敷设、开关柜、变压器安装等	焊装车间、总装车间挡风板、电缆桥架固定安装，屋顶光伏线缆绑扎固定，验收、消缺等
	质量体系运作	质量体系健全，运行良好落实	继续加强检查，发现问题即时督

	情况	质量保证体系，并对运行情况进行检查	促整改。
	施工图会审	无	无
	方案审查	方案已报审，后续如有方案继续督促报审	方案已报审，后续如有方案继续督促报审
	技术交底	无	/
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	/
	安全交底情况	对焊装车间设备安装临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。	对设备安装、组件安装登高作业等安全文明施工进行监督检查。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	检查焊装车间新增项目组件安装、电缆敷设、设备安装	对现场施工质量等要求进行管理，发现问题要求及时整改
	主要原材料质量	组件、变压器、逆变器、电缆	/
	构(配)件质量	钢结构油漆粉刷收尾工作	对钢结构油漆厚度进行检查
	设备质量	基本符合要求	对设备进行检查
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

三、本月进度情况

1、完成电站内二次通信调试；

2、焊装车间新增项目所有物料、设备已就位；

3、焊装车间新增项目组件安装完成 70%；

4、焊装车间新增项目电缆敷设完成 60%；

四、下月进度计划

1、焊装车间新增项目并网发电。

2、焊装车间、总装车间屋顶消缺整改；

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		16 人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

质量管理	督促施工单位质量通病防治措施； 监督施工项目部落实强制性条文的 执行计划。	原材料的进场检查；检查施工质量；单 位工程重点部位施工进行旁站；督促施 工单位质量通病防治措施；监督施工项 目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	/	/
造价管理	/	/
物资供应	/	/

常州正衡电力工程监理有限公司

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

2020 年 05 月 25 日
