



正衡监理

编号: PXWD-YB-001

监 理 月 报

工程名称: 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶
光伏发电项目

2019 年 6 月

项目监理部 (章):

总监理工程师: 徐耀生



日期: 2019 年 6 月 30 号



扫描全能王 创建

监 理 月 报

开始时间 2019 年 6 月 17 日 结束日期 2019 年 6 月 30 日

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	主要工作	1、第一次工地例会召开，介绍参会单位人员。 2、对前期报审资料审查，对施工人员安全教育，施工质量把控。 3、确认 630 部分并网目标，6 月 28 日完成。	1、督促施工进度。 2、督促设计会审问题回复函。 3、施工质量旁站监督。 4、安全文明施工。
	设备交付进度	主要设备组件、支架、逆变器等未到场，	督促 EPC 抓紧时间进行交涉，设备早点到场。
	设计交付进度	图纸完成	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	等待设计回复
	设计交底	完成	
	方案审查	资料正在审查	审查过程资料
	技术交底	完成	
	设计变更	目前未变更，按图纸施工	若有变更及时解决
安全	安全培训情况	进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育，安全文明施工加强。
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	场地安装及用电安全都已落实	吊装、防火、带电设备安全警示
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度



质量	主要工序质量	现阶段，要求质量严格按照业主要求监管。	强制性质量问题绝不放过
	主要原材料质量	主要材料进行质量检查	把控好材料进场质量问题
	构（配）件质量	把控好进场材料质量关	严抓构配件质量问题
	设备质量	按照要求进行质量验收	查看进场设备合格证书
	质量验评情况	将不符合设计要求的地方，要求施工方进行整改，然后进行一次验收。	施工方整改后，进行二次验收。

二、本月进度情况

- 1、6月17日开第一次工地例会，会议介绍各参建单位，监理工作的管理，以及施工单位的施工准备。
- 2、6月20日施工材料准备妥当，预制支架基础模板制作完成，进行支架基础混凝土浇筑，浇筑24块
- 3、6月24日支架、混凝土基础、组件吊装至辅助综合用房。
- 4、6月25日支架、组件安装完成630发电要求。
- 5、6月27日直流电缆穿管，逆变器安装接线，交流电缆敷设，临时并网柜安装接线完成，并网前电缆线路检查试验。
- 6、6.28早上成功发电，完成630部分并网要求。

三、下月进度计划

- 1、场外空地、屋顶支架基础模板制作，制作支架预制混凝土基础。
- 2、准备车棚基础施工。
- 3、考察轿子顶实地施工情况，进行施工安排。
- 4、大爬山屋顶及场外支架基础定位放线。
- 5、7月20日大爬山预制基础全部完成，轿子顶完成部分预制基础。
- 6、最迟7月底设备进场。




四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	施工单位 数量
人身重伤	机械设备	电网事故			
无	无	无	2 份	8 人	1
施工安全 文明交底	每日班前 会已交代	施工现场文明施工情况		良好	

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	预制基础制作浇筑，部分组件并网发电。	检查预制基础施工质量，屋顶定位放线复核，材料进场检查
安全管理	组件安装、施工人员安全帽佩戴	高空吊装作业、临时用电、检查警界线，车辆人员资质，用电安全等。
质量管理	发现有质量问题并要求施工方整改	发现有质量问题并要求施工方整改，整改完成后，进行查验。
技术管理	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。	检查现场施工质量
物资供应	督促施工单位进行	定好供货厂家，及时供货，保证施工进度



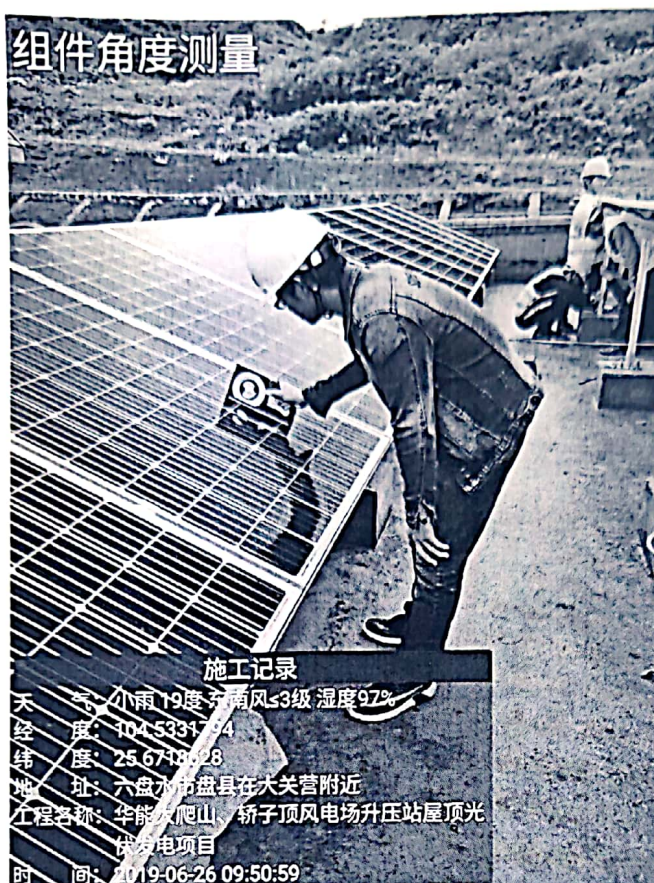



常州正衡电力工程监理有限公司

华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目监理部

2019 年 6 月

