

表号： GF-B10

编号： XXGF-001

监 理 月 报

工程名称： 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

2019 年 07 月 28 第 1 期

项目监理部(章)：

总监理工程师： 徐辉生



报告日期： 2019 年 07 月 28 日

监 理 月 报

- 1 本月工程实施情况**
- 2 本月监理工作情况**
 - 2.1 工程进度控制方面的工作情况
 - 2.2 工程质量控制方面的工作情况
 - 2.3 安全生产管理方面的工作情况
 - 2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况
 - 2.5 合同其他事项的管理工作情况
- 3 工程存在问题及建议**
- 4 下月监理工作重点**
 - 4.1 在工程管理方面的监理工作重点
 - 4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

1 本月工程实施情况

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	1 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	1 份
月报时限	2019 年 06 月 28 日--2019 年 07 月 28 日		
本月工程现场大事记			
工程概况：西秀经济开发区位于贵州省安顺市, 由西秀工业园区、高科技材料工业园区以及民族制药工业园区组成。 本项目拟采用西秀经济开发区内的部分建筑物屋面(标准化厂房区域现有建筑 55 栋)建设分布式光伏发电工程(具体装机容量见本招标文件 1.2 工程概况中第 2 条各个屋顶情况及装机容量), 包括太阳能光伏发电系统及相应的配套上网设施、运维设施的方案设计、安装和并网调试等。 项目由太阳能光伏组件、并网逆变器、配电装置、数据采集系统、运行显示和监控设备等组成, 项目采用自发自用模式, 太阳能光伏组件所发直流电经逆变器逆变、升压、汇流后并入公共电网。整个电站设置全自动控制系统, 可以实现无人值守: 设置计算机监控系统, 通过计算机监控软件实时采集系统各种信号量, 直观的显示在监视器上, 并可以远程监控、打印报表、查询历史数据等。该项目有四期厂房 55 个屋顶区域, 直流部分为光伏组件至逆变器部分, 交流部分为逆变器至汇流箱, 汇流箱直接接至附近 10kV 箱变, 各期分别配置一台 10kV 箱变, 再接入 10kV 开关站, 统一以 1 回 10kV 线路并入系统, 。每个厂区光伏系统拟按 22 块组件组成一光伏组串, 逆变器采用 50kW 组串逆变器, 该逆变器有 8 路输入, 逆变器汇入交流汇流箱, 再汇流然后接入升压变压器升压并网。			

本工程于 2019 年 6 月 28 日正式开工。

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2019 年 6 月 28 日	工程竣工日期	
本月计划完成至	2019. 06. 28-2019. 07. 28		
本月实际完成至	2019. 06. 28-2019. 07. 28		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
本月支墩预制完成累计 5050 个。现浇混凝土墩完成累计 1487 个，吊装完成 3846 个，测量放线 42 栋楼。			
下月工程进度展望			

1. 完成 B、C 区的支架、组件。
2. 完成 1#、2#箱变基础。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	1 项	其中几次验收合格	1 次
发出监理通知单（质量控制类）			1 份
工程质量情况简析（文字或图表）			
1. 工程存在的部分缺陷。 2. 施工质量基本符合要求。			
下月质量情况预计和目标			

1. 每天坚持 2 次巡视现场，发现问题现场指出，要求立即处理，当场整改。
2. 严格把控现场施工质量过关，对于不符合规范要求的及时提出并落实整改。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。 2. 检查临时用电规范化。 3. 检查高空作业人员特种作业证件，安全带合格证是否有效。 4. 检查起重吊装过程中的安全措施是否到位。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1、加强对施工单位的安全教育的监管；2、消除安全工作中麻痹思想；3、加强现场安全检查； |
|---|

2.4 合同其他事项的管理工作情况

本月工程合同管理及其它事项

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1、协调业主和总包之间的关系。2、对业主所提的各类要求，由我监理方下达施工单位。 |
|---|

3 工程存在问题及建议

3.1 工程存在问题

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1、由于接入系统报告未审查批复，严重影响后续工作。2、受初步设计审查影响，设备技术规范书未能确定，影响设备材料的采购工作。从而影响 |
|--|

整体规划。 3、业主要求尽快提交初步设计给业主审查。 4、支墩预制进度缓慢，需要调整预制工艺及方法。
3.2 建议 1、加大协调力度，配置强有力的资源，保证不因协调问题，影响施工进度； 2、光伏区外部干扰因素不可预测，施工单位须尽快进入施工状态； 3、考虑工期紧张，应安排经验丰富的支架及组件安装队伍进场施工； 4、施工单位应增加现场施工机械。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点
1、严控材料进场关，不符合设计及规范要求材料严禁进场； 2、对分部及分项工程、工序等的验收进行把控；

- 3、对关键工序、特殊作业进行旁站；
- 4、依据合同对施工单位进行管理；


4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

1. 组织相关人员学习专业知识；
2. 对图纸及规范仔细认真研读，领会设计意图；
3. 加强内部管理，做好资料的整理工作；

5 相关照片



开工仪式

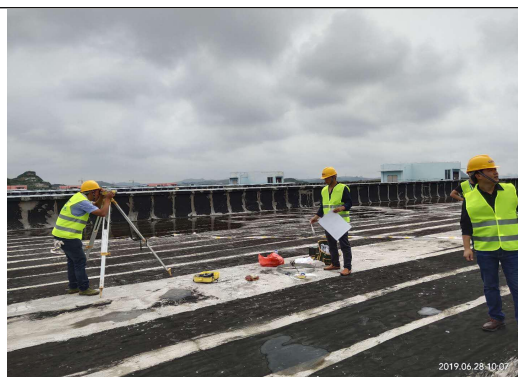

测量放线



基础浇筑




见证取样



安全学习



基础强度检查

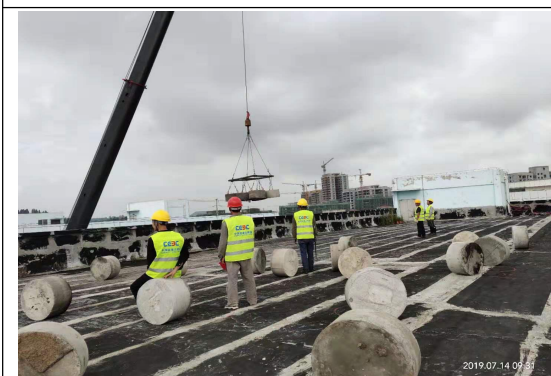

基础吊装



基础浇筑
