



编号: ZHJL-XYZT-02

监 理 月 报

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式
光伏发电项目

2019 年 08 月第 2 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2019 年 08 月 25 日

监 理 月 报

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 分布式光伏发电项目

月次 第 2 次


月报开始时间 2019 年 07 月 25 日 结束日期 2019 年 08 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有


限公司 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 分布式光伏发电项目		影像	40 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		本月电缆沟及过路电缆顶管已全部完成;目前 3#屋面至并网点电缆已开始敷设,已敷设 50%	应业主要求,因场区内 9 月有参观团,现有物资最晚截止到 9 月 5 日 2#屋顶安装完成,地面工作最迟 8 月底完成; 直埋电缆敷设完成 100%,电缆沟回填完成;

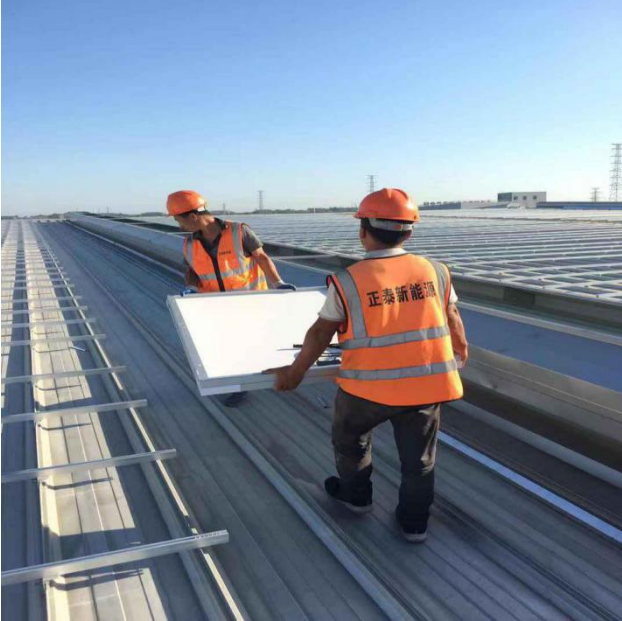	  	屋面临时围挡及采光带警戒线已安装完成； 光伏组件、支架、夹具已到场，汇流箱到场15个，逆变器尚未到场； 并网柜基础已砌筑完成，圈梁已浇筑完毕，外围已抹面，电缆进线及出线沟已开挖完成； 2#3#屋面垂直桥架已制作完毕，目前3#屋面垂直桥架需额外增加1条，暂未开始制作	逆变器及汇流箱支架安装完成；汇流箱安装完成； 接地扁铁焊接完成； 电缆桥架支架安装完成，电缆桥架固定完成； 地面施工所破坏绿化恢复完成；
--	--	--	--

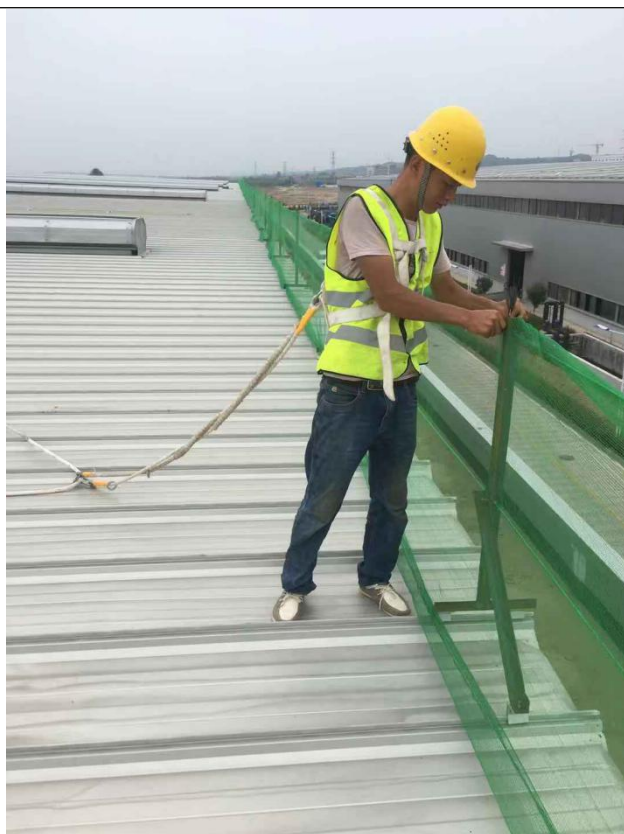

2#屋面光伏夹具已安装完成100%，光伏支架安装80%，光伏组件安装25%；



	设备交付进度	设备、支架、组件、桥架、电缆、箱逆变器均未进场	光伏电缆、汇流箱、支架、组件已部分到场
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	有	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安	目前尚未报验

		装，电缆桥架安装，电缆敷设，电缆头制作及逆变器；	
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同未签订	已签订
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		28 人	/	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	施工材料进场后，及时调整人力、物力，加快施工进度，保证施工安全
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。
------	--	------------------------------

常州正衡电力工程监理有限公司

陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目监理部

2019 年 08 月 25 日
