



编号: ZHJL-XYZT-03

监 理 月 报

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式
光伏发电项目

2019 年 09 月第 3 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2019 年 09 月 25 日

监 理 月 报

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 分布式光伏发电项目

月次 第 2 次

月报开始时间 2019 年 08 月 25 日 结束日期 2019 年 09 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有


限公司 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 分布式光伏发电项目		影像	60 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		2#3# 厂房屋面光伏组件已全部安装完成,因汇流箱及逆变器有遮挡,设计变更为共 12175 块组件	原计划 9 月底完成工程,由于阴雨天气较多,导致工程进度较为缓慢,预计 9 月初完成工程; 2#3# 厂房屋顶逆变器至汇流箱电缆接头制作,电缆安装完成;

		地面直埋电缆沟已回填完成，软土垫层，电缆以砖铺盖 施工所破坏的绿化已恢复完成； 光纤已熔接；	屋面清洗系统、接地扁铁安装完成； 组串至逆变器MC4插头制作完成，组串与逆变器接线完成；
		屋面电缆桥架已基本安装完成；检修通道已全部安装完成，清洗系统尚未开始安装；	汇流箱至并网柜电缆敷设完成，电缆头制作完成，接线完成；并网发电；

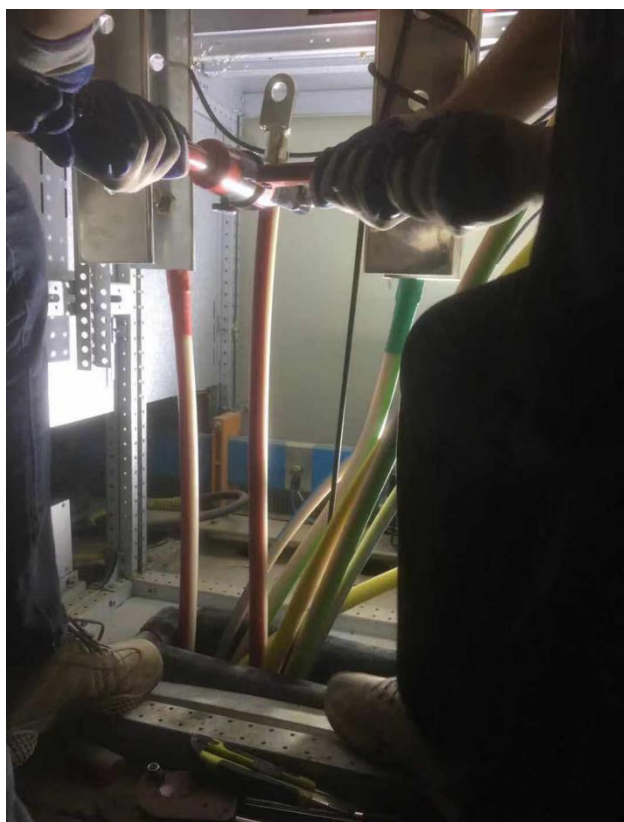

1*4 电缆放线完成 80%，逆变器至汇流箱电缆放线完成，汇流箱至并网柜电缆放线完成；

因厂区箱变低压室母排没有位置安装电缆，现已将母排改造，2#厂房 1#箱变母排已改造完成，电缆终端接头已制作，并安装完成

		3# 屋面逆变器至汇流箱电缆接头已制作完成，并且安装完成	
	设备交付进度	设备、支架、组件、桥架、电缆、箱逆变器均未进场	材料已全部到场
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	有	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工

			进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安 装，电缆桥架安 装，电缆敷设， 电缆头制作及 逆变器；	目前尚未报验
	主要原材料质量	电缆外观质量 合格，支架外观 检查合格，组件 观感质量合格；	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同未签 订	已签订

	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		16 人	/	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	施工材料进场后，及时调整人力、物力，加快施工进度，保证施工安全
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	措施。	
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

陕西正泰电缆有限公司二期3.48MWp屋顶分布式光伏发电项目监理部

2019年09月25日
