



编号: ZHJL-KSFT-03

监 理 月 报

工程名称: 昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业(昆山)
有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目

2019 年 10 月第 3 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐耀生



报告日期: 2019 年 10 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目




月次 第 1 次 月报开始时间 2019 年 10 月 1 日 结束日期 2019 年 10 月 31 日



监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目	昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目	影像	10 张	

形象照片

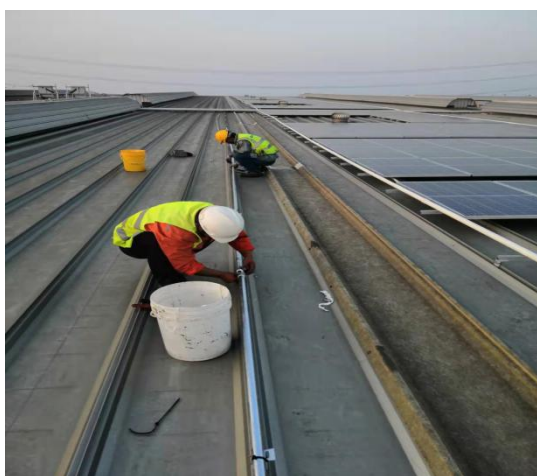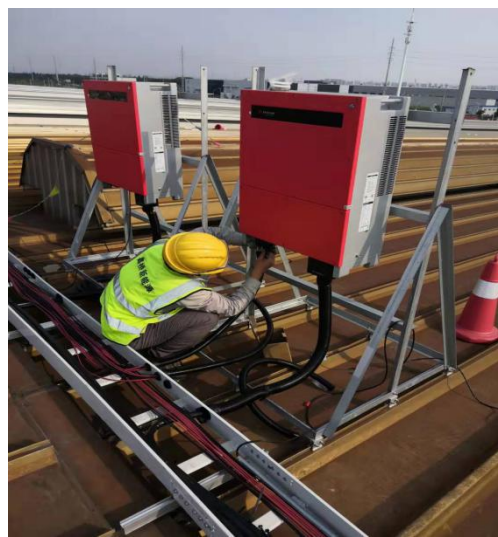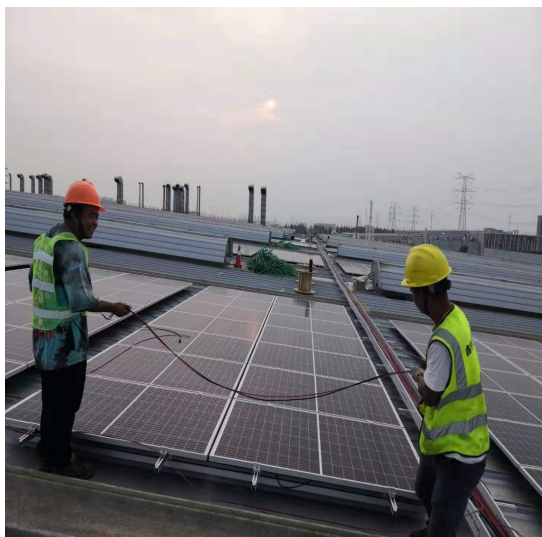

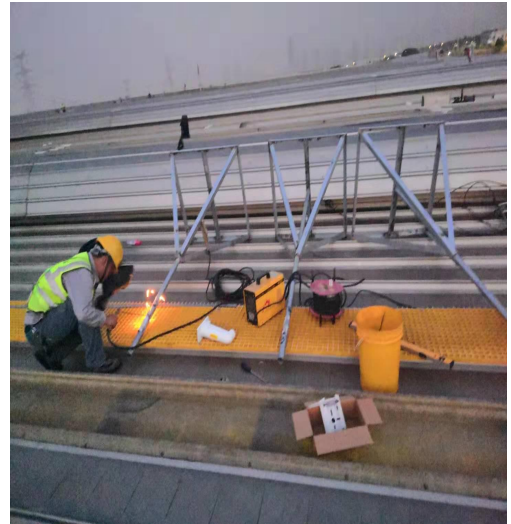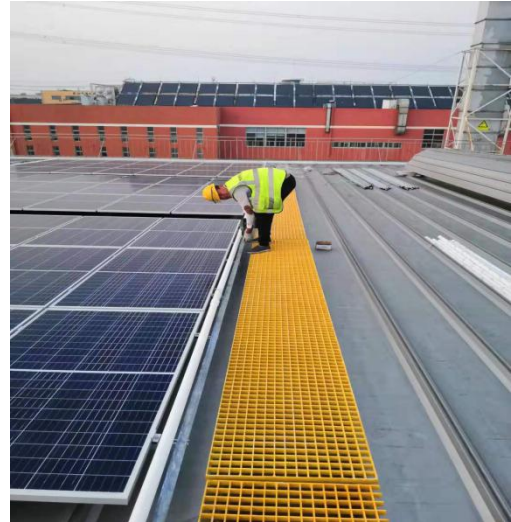

二、 主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

在监理过程中，认真执行监理规范的要求，严格按监理规划、监理细则进行操作，按照有关规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按监理程序进行。

为保证工程质量，督促施工单位及时上报工程资料，并对提交的工程资料进行了认真、严格审核；监理部定期召开监理工地例会，对上周工作进行总结，并安排下周工作，对出现的问题进行协调解决，如现场出现特殊问题立即召开专题会议，尽快解决，并将会议纪要整理打印发于各单位。平时通过检查、旁站、巡视、验收，杜绝出现失控现象。在实际操作过程中严格执行验收程序，原材料不经监理验收合格，严禁进场使用。对工程中出现的质量问题认真对待，由各方共同商定处理方案，并督促其按处理方案进行整改，并再次验收合格后方可进行下道工序施工，确保质量符合要求。

本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，汇同各方检查了现场的机械设备、临时用电、消防、场容场貌等项目，针对存在安全隐患的，立即发出监理通知单要求整改，在监理的督促下和各方配合下，本月安全文明生产状况良好，施工现场未发生任何人身伤亡和设备损坏事故。

进度方面督促帮助施工单位合理安排人力、物力，积极的做好施工计划。另外本监理部及时对现场情况（如质量、安全、进度等）进行总结，并编制监理周报、月报，较好地促进了工程项目的实施。

三、本月施工进度计划

序号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始日期	施 工 结 束 日期	本 月 实 际 完 成（完 成 量 / 总 量）	累 计 完 成（完 成 量 / 总 量）	备注
1	支架安装	20190711	20190731	20190711	20190811	0%	100%	
2	组件安装	20190729	20190906	20190814	20191016	19%	100%	
3	桥架安	20190801	20190810	20190826		5%	95%	

	装							
4	防雷接地、清洗系统	20190811	20190820	20191018		95%	95%	
5	逆变器安装	20190801	20190820	20190826	20190907	0%	100%	
6	电缆铺设	20190805	20190830	20190907	20191016	20%	100%	
7	监控系统、通信调试	20190801	20190913	20191006		80%	80%	
8	并网柜进场	20190824	20190824	20190910	20190910	0%	100%	
9	并网接入	20190913	20190915	20190926	20190926	0%	100%	

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故	划文件（份）	人数	分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	20T 吊车 1 台	无	0 份	7 人	1	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	直流电缆敷设、清洗系统施工、屋面防雷接地施工、通讯调试、检修通道格栅板安装、项目全容量并网	项目消缺、验收
安全管理	对新进施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。对特殊作业人员进行重点检查，要求必须持证上岗。	安全管理委员会定期大检查，包括现场施工和生活区检查，工人安全设备佩戴情况
质量管理	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位做好质量通病防治措施；监督施工	按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。

	项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
物资供应	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	积极督促施工单位将所需物资加紧到场，以便施工。

六、工程存在问题及建议总结

- 1、截止目前项目已完成全容量并网，已基本施工完成，要求施工单位尽快完成项目收尾工作，进行项目验收。

常州正衡电力工程监理有限公司

昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业（昆山）有限公司
1.8MW 分布式光伏发电项目

2019 年 10 月 31 日
