



编号: ZHJL-YB-04

监 理 月 报

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电
项目

2019 年 11 月第 04 期

项目监理部(章):



总监理工程师:

刘士发

报告日期: 2019 年 11 月 30 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报

工程名称: 荆门万华家居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电项目 月次 第 4 次

月报开始时间 2019 年 11 月工程 01 日 结束日期 2019 年 11 月 30 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	荆门万华家居(二期) 5.38758MWp 屋顶光伏 分布式发电项目	湖北东臣泰建设有 限公司	影像	85 张	

监理重点工作情况

专 业 事 项	影视照片重点事项	本月重点工 作情况	下月重点工 作计划
		1、2#仓库加 固。	



扫描全能王 创建

进度




2、电缆沟开挖。

3、2#组件吊装。

下月重点工作: 3#仓库檀条加固; 3#仓库组件吊换、安装; 2#、3#仓库4平方直线铺设。汇流箱至箱式变压器、箱式变压器至一次舱高压电缆铺设。



扫描全能王 创建

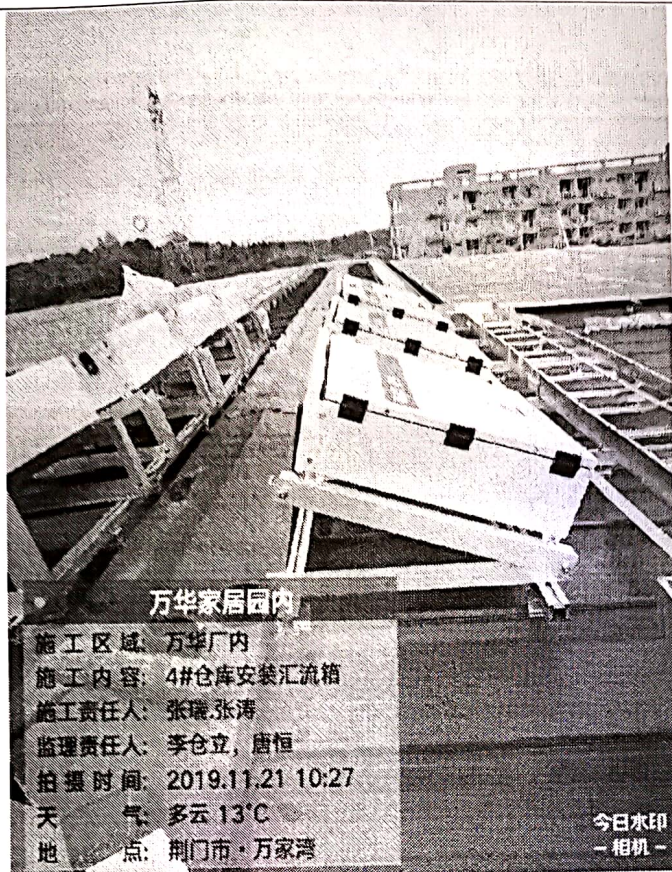

4、屋面汇流箱安装。




5、3#仓库加固。




扫描全能王 创建



6、2#仓库组
件安装。

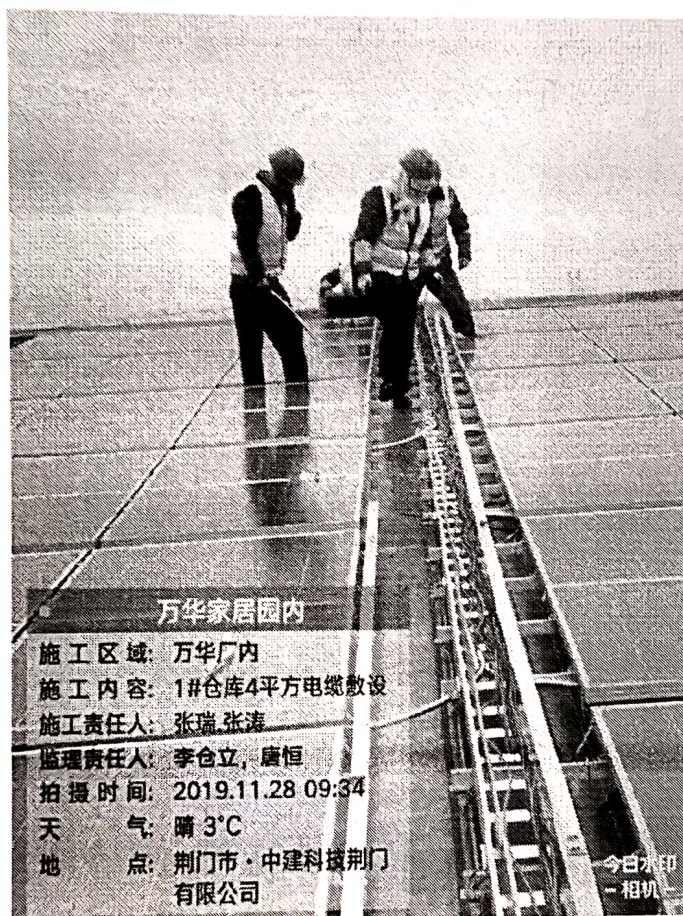

7、1#仓库 4
平方线铺设。

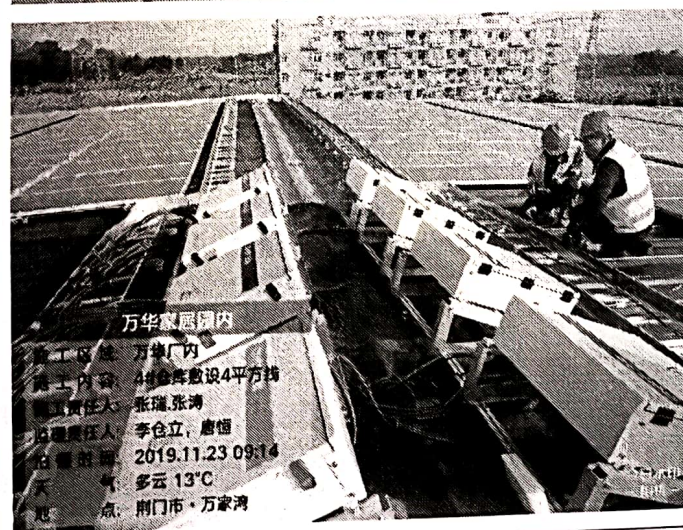


8、4#仓库 4
平方线铺设。





9、一次舱、
1#、2#、3#、
4#箱变吊装
就位。

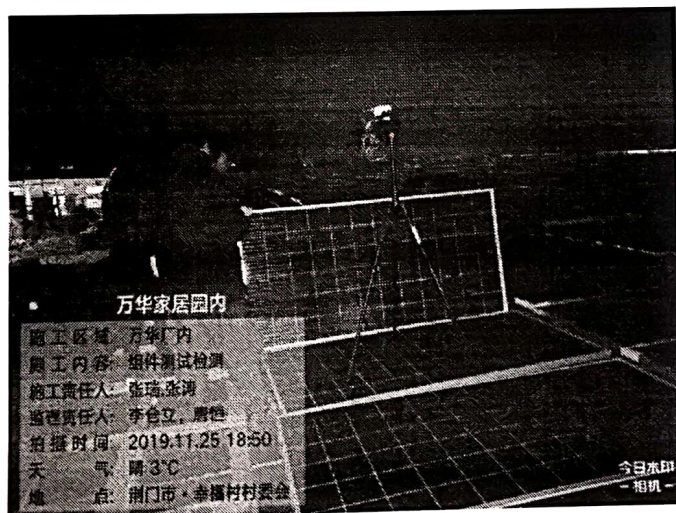


10、组件测
试。



11、接线柜施
工。

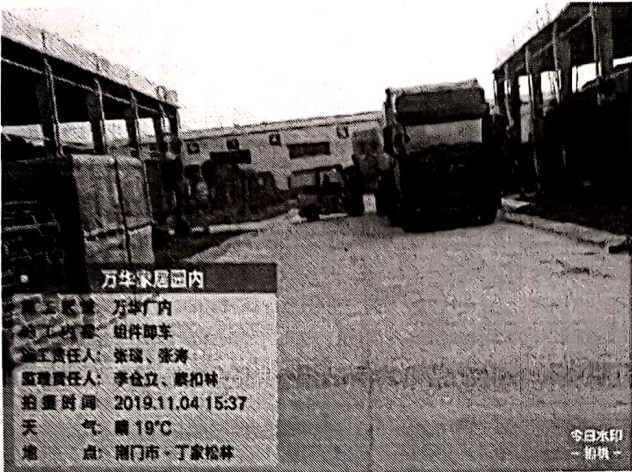

	设备交付进度 	12、第三批组 件设备到场	/
	设计交付进度	图纸未完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保 证体系，并对 运行情况进行 检查
	施工图会审	已完成	会议记录未 到项目
	设计交底	已完成	
	方案审查	已报审	报审施工资 料审核完成
	技术交底	已完成	/
	设计变更	多项设计变 更未到现场	/
安全	安全培训交低 	13、早班会进 行安全培训	督促施工单 位对进场新 员工进行安 全教育






14、督促施工单位对危险作业点进行防护措施

继续督促施工单位进行班前交底

安全措施落实情况


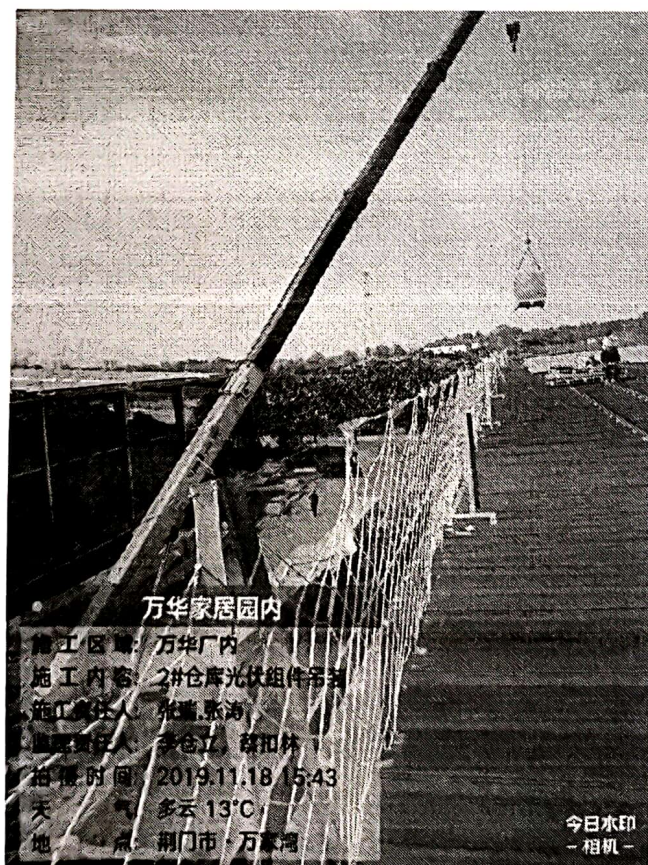


15、吊装组件。


继续监督施工单位认真做好安全措施工作



扫描全能王 创建

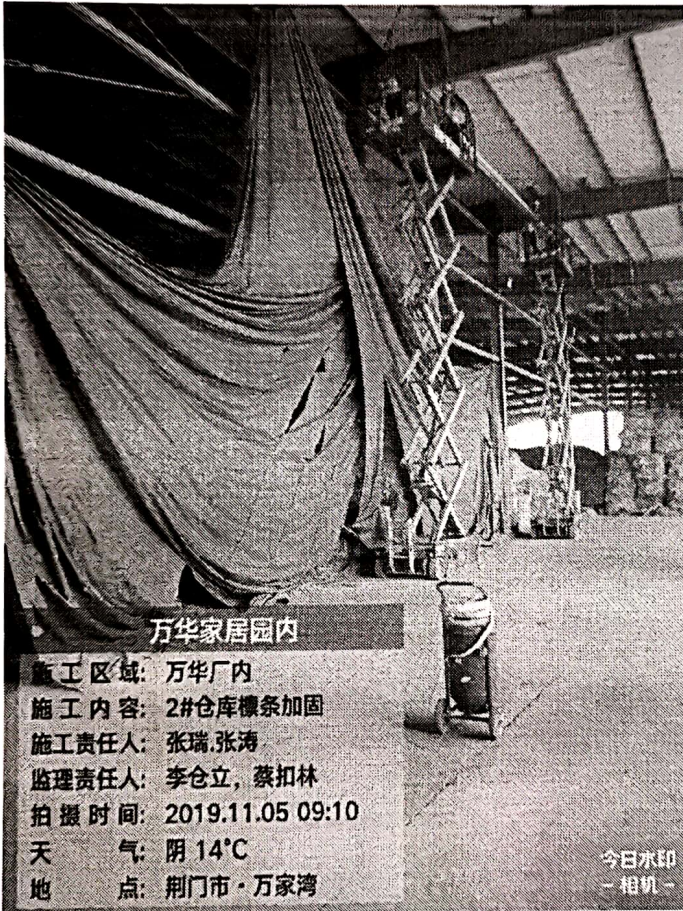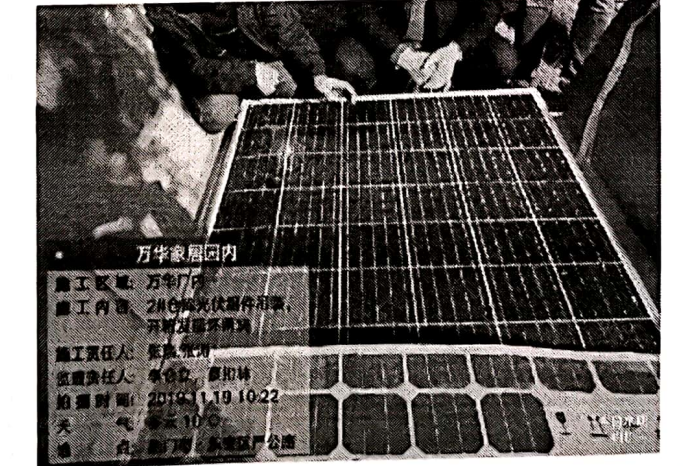	 万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 2#箱变吊装 施工责任人: 张瑞, 张涛 监理责任人: 李合立, 唐恒 拍摄时间: 2019.11.26 09:12 天气: 阴 2°C 地点: 荆门市·万家湾	16、吊装箱变。	
	安全文明施工情况  万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 2#仓库檩条加固 施工责任人: 张瑞, 张涛 监理责任人: 李合立, 蔡扣林 拍摄时间: 2019.11.05 09:10 天气: 阴 14°C 地点: 荆门市·万家湾	17、安全防火措施	加强现场安全管理力度
质量	 万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 2#仓库光伏组件吊装, 开箱及搬运 施工责任人: 张瑞, 张涛 监理责任人: 李合立, 蔡扣林 拍摄时间: 2019.11.19 10:22 天气: 阴 10°C 地点: 荆门市·新康区广公港	18、2#组件吊装开箱时发现组件碎裂。	检查各项施工工序



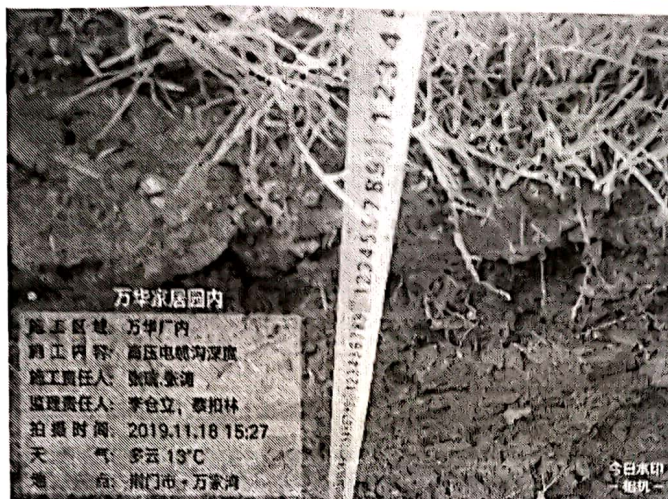

19、高压电缆
沟挖掘深度
宽度不符合
设计要求。



20、一次舱接
地极焊接不
符合要求。



21、屋面加固
焊接后焊渣
未清除。



扫描全能王 创建

	主要原材料质量		对主要材料进行检查
	构（配）件质量	支架无缺陷	把控好进场材料质量关
	设备质量	组件到场已开箱检验	对进场材料督促报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	第一次工程款审批	370 万
	预算外签证		/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	按合同执行
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		28 人	/	/	/	/

二、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----------	----------



扫描全能王 创建

进度管理	督促施工单位优化人、机、料资源配置，充分调动施工人员的积极性	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力，加快施工进度
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，做好班前安全交底，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施；特别是仓库内动火、注意防火。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，仓库内动火注意防火措施。发现问题及时提出整改按要求并限期改正。
质量管理	支架、组件到场进行开箱检查；做到轻放，不踩不压，严防隐裂、反面磨损等，督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	按合同要求审核工程进度款	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照合同日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司
 荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部
 2019 年 10 月项目 31 日



扫描全能王 创建
