



编号: ZHJL-YB-02

监 理 月 报

工程名称: 荆门万华家居(二期) 5MW 屋顶分布式光伏发电
项目

2019 年 09 月第 02 期

项目监理部(章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2019 年 09 月 30 日



扫描全能王 创建

监 理 月 报

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 月次 第 2 次

月报开始时间 2019 年 09 月工程 01 日 结束日期 2019 年 09 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	荆门万华家居（二期） 5.38758MWp 屋顶光伏 分布式发电项目	湖北东臣泰建设有 限公司	影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专业 事项		本月重点工 作情况	下月重点工 作计划
进度		1、本月监理 进场对施工 单位前期资 料审查	下月重点工 作：1#、2#、 3#库房檩条 加固；4#库房 支架安装及 活动中心屋 顶支架安装。



	 万华家居园 施工区域: 4#仓库 施工内容: 支架安装 施工责任人: 张镇, 张涛 监理责任人: 李合立 拍摄时间: 2019.09.13 08:16 天气: 多云 24℃ 地点: 荆门市·万家乡  万华家居园 施工区域: 项目部 施工内容: 4#仓库支架安装 施工责任人: 张镇, 张涛 监理责任人: 李合立 拍摄时间: 2019.09.20 08:53 天气: 晴 19℃ 地点: 荆门市·万家乡  万华家居园 施工区域: 项目部 施工内容: 1#仓库加固 施工责任人: 张镇, 张涛 监理责任人: 李合立, 刘柏林 拍摄时间: 2019.09.25 08:42 天气: 阴 24℃ 地点: 荆门市·万家乡	2、3#、4#仓库及活动中心支架安装。 3、上班前对施工人员进行“三级教育”。 4、随时安全检查屋面安全防护。 5、1#库房檩条加固必须增强防火意识。	
	设备交付进度	无设备到场	/
	设计交付进度	图纸未完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健	落实质量保

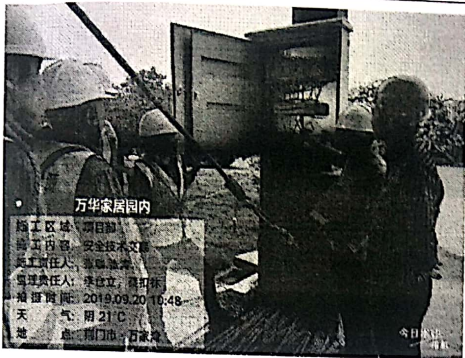
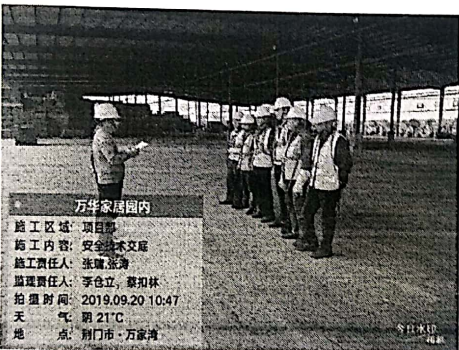


扫描全能王 创建

		全, 运行良好	证体系, 并对 运行情况进行 检查
	施工图会审	已完成	/
	设计交底	已完成	/
	方案审查	已报审	报审施工资 料审核完成
	技术交底	已完成	/
	设计变更	多项设计变 更未到现场	/
安全	安全培训情况  万华家居园内 施工区域: 项目部 施工内容: 安全技术交底 施工责任人: 张瑞, 张涛 监理责任人: 李仓立, 蔡扣林 拍摄时间: 2019.09.20 10:49 天气: 阴 21°C 地点: 荆门市·万豪湾	新进场员工 已进行安全 培训	督促施工单 位对进场新 员工进行安 全教育
	安全交底情况	督促施工单 位对危险作 业点进行班 前交底	继续督促施 工单位进行 班前交底

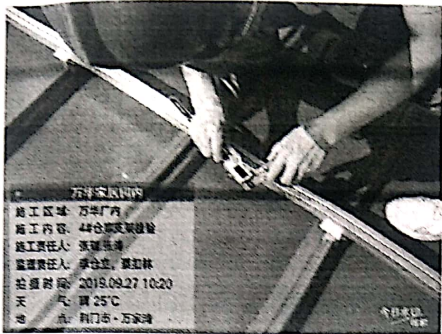
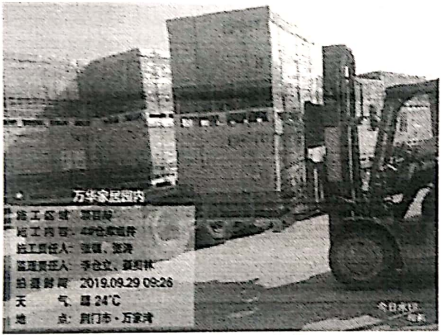


扫描全能王 创建

	 万华家居园内 施工区域: 项目卸 施工内容: 安全技术交底 施工责任人: 张瑞海 监理单位: 李合立, 蔡和林 拍摄时间: 2019.09.20 16:48 天气: 阴 21℃ 地点: 荆门市, 万华湾 今日施工: 荆新		
	安全措施落实情况  万华家居园内 施工区域: 项目卸 施工内容: 安全技术交底 施工责任人: 张瑞海 监理单位: 李合立, 蔡和林 拍摄时间: 2019.09.20 10:47 天气: 阴 21℃ 地点: 荆门市, 万华湾 今日施工: 荆新	施工单位落 实情况良好	继续监督施 工单位认真 做好安全措 施工作
	安全文明施工情况 	现场安全、文 明, “五图一 牌”警示牌、 警示标语未 安装	加强现场安 全管理力度
质量	主要工序质量	检查支架安 装施工质量	检查各项施 工工序



扫描全能王 创建

	 施工区域: 万华厂内 施工内容: 4#仓架梁安装 施工责任人: 张耀东 监理责任人: 李立文、姜利林 拍摄时间: 2018.09.27 10:20 天气: 晴 25℃ 地点: 荆门市·万华湾	支架导轨配件检查	
	主要原材料质量  施工区域: 万华厂内 施工内容: 4#仓架梁组件 施工责任人: 张耀东 监理责任人: 李立文、姜利林 拍摄时间: 2018.09.29 09:26 天气: 晴 24℃ 地点: 荆门市·万华湾	组件到场未开箱检	对主要材料进行检查
	构(配)件质量	无	把控好进场材料质量关
	设备质量	无	对进场材料督促报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度, 加大工序报验抽查力度
	资金情况	/	/
投资	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/



扫描全能王 创建

合同	合同签订情况	施工合同已 签订	按合同执行
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执 行工作

二、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		14 人	/	/	/	/

三、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料资源配置，充分调动施工人员的积极性	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力，加快施工进度
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，做好班前安全交底，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改按要求并限期改正。
质量管理	支架、组件到场进行开箱检查；做到轻放，不踩不压，严防隐裂、反面磨损等，督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照	参与过程中重要环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。



	技术交底内容进行施工。	
造价管理	按合同要求审核工程进度款	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照合同日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目监理部

2019 年 09 月项目 30 日



扫描全能王 创建
