



编号: ZHJL-YB-005

监 理 月 报

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体
现代渔业园项目

2020年01月 第 05期

项目监理部 (章)

总监理工程师



报告日期: 2020 年 01 月 16 日

监 理 月 报

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

月次 第 5 次

月报开始时间 2019 年 12 月 26 日 结束日期 2020 年 01 月 17 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目	管桩定位放线、管桩施工、钢梁焊接、支架安装、组件安装、电缆敷设、箱变安装接线、箱逆变安装	影像	45 张	

二、监理重点工作情况


专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

进度	 边锚拉杆宽度测量  电缆沟铺沙盖砖检查 	管桩定位放线、 管桩打桩，支架 柱头焊接及防腐， 支架组件安装、 电缆敷设、 逆变器汇流箱 安装、春节检查 等 要求施工单位 做好春节期间 防火、防盗、防 风及物资保管 工作等工作
-----------	---	---

铺沙盖砖深度检查



组件串线

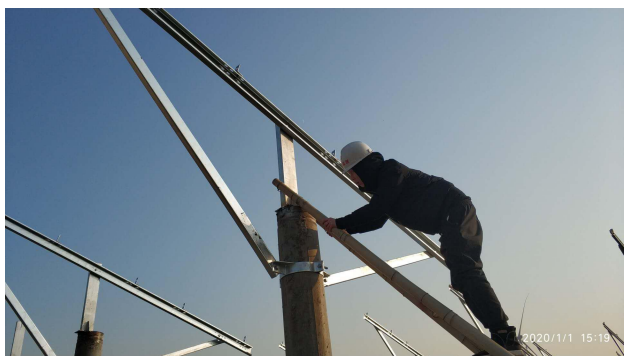

立柱焊接检查



组件安装检查



支架组件春节大检查



春节大检查



39 区打桩




高庄组件安装整改



组件安装



电缆沟铺沙盖砖

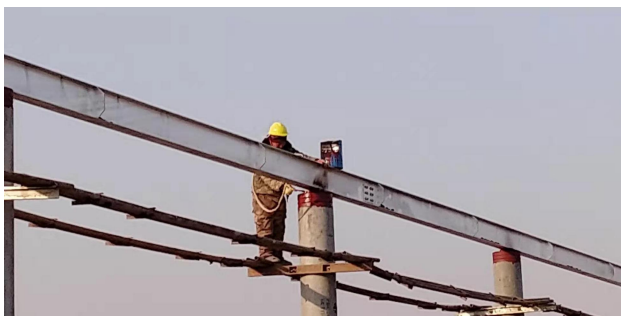

柔性区防腐

	 柔性区逆变器安装  箱变围栏除锈		
	设备交付进度	已完成	
	设计交付进度	已完成	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系。
	施工图会审	完成	
	设计交底	已完成	
	方案审查	已完成	
	技术交底	已完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	

	安全措施落实情况	已要求施工单位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	增加消防设备
质量	主要工序质量	支架安装、组件安装部分紧固件未紧固、箱变平台部分防腐未做	
	主要原材料质量	本月进场材料开箱检查合格	
	构（配）件质量	审查合格	
	设备质量	外观均无破损，需进行设备试验	
	质量验评情况	工序施工符合要求	
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	打桩	2019.09.12	2019.11.06	2019.09.02		15%	68.0%	

2	支架柱头焊接	2019.09.12	2019.11.06	2019.09.10		3%	67%	
3	支架安装	2019.09.12	2019.11.06	2019.09.18		5%	68%	
4	组件安装	2019.09.20	2019.12.01	2019.10.09		8%	65%	
5	电缆敷设	2019.10.05	2019.12.12	2019.11.05		8%	53%	
6	汇流箱	2019.10.01	2019.12.05	2019.11.03		10%	45%	
7	箱变安装	2019.10.20	2019.12.15	2019.11.18			6.2%	
8	逆变器安装							
9	羲和钢梁安装	11月25日	12月20日	11月30日		1%	100%	南侧集电线路电缆电缆沟暂时不能回填
10	羲和交流电缆敷设	12月20日	12月25日	12月15日		5%	95%	
11	羲和桥架安装	12月10日	12月20日	12月8日			50%	

四、下月进度计划

春节假期暂停施工

五、安全文明施工情况

事故（起）			安全策划文 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	4份	68人	3	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促根据工作面合理增加人员及机械，工序材料及时进场。支架管桩材料加快供应速度。	
安全管理	实施安全监理，发现问题及时提出整	要求施工单位做好春节期间防火、防风、物料保管等

	改要求并限期改正。	各项安全措施
质量管理	设备、材料到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划， 01月12日至14日进行了春节前质量大检查。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请工程款及时进行评审	
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	
