



编号: ZHJL-YB-009

# 监 理 月 报

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体  
现代渔业园项目

2020年06月 第09期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 符耀生

报告日期: 2020 年 06 月 25 日

# 监 理 月 报

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

月次 第9次

月报开始时间 2020年05月26日 结束日期 2020年06月25日



监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料


| 序号 | 单位工程标准名称                                   | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|----|--------------------------------------------|--------|------|------|----|
| 1  | 天津市滨海新区杨家泊镇<br>通威渔光一体现代（海水）<br>渔业园（光伏部分）项目 |        | 影像   | 16张  |    |

## 二、监理重点工作情况

| 专业 | 事项照片 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
|----|------|----------|----------|
|    |      |          |          |
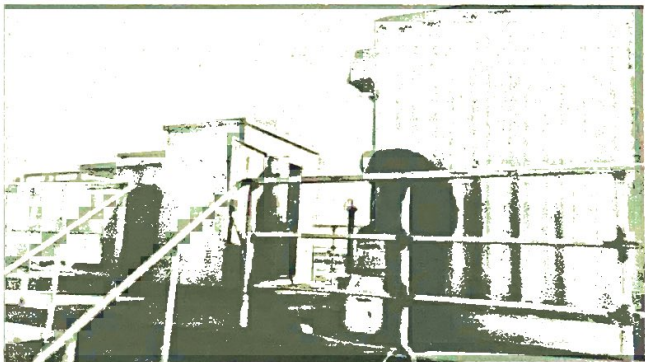
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>进度</p> | <div data-bbox="328 179 969 633">  </div> <div data-bbox="527 642 769 684"> <p>高庄立柱焊接检查</p> </div> <div data-bbox="328 702 969 1049">  </div> <div data-bbox="586 1067 712 1106"> <p>监理例会</p> </div> <div data-bbox="328 1125 969 1485">  </div> <div data-bbox="555 1496 742 1538"> <p>高压耐压试验</p> </div> <div data-bbox="328 1556 969 2008">  </div> <div data-bbox="522 2025 773 2066"> <p>箱变绝缘电阻试验</p> </div> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、每月进行周例会共三次，安全例会1次。</li> <li>2、每日对现场各工序进行检查。</li> <li>3、对疫情管控进行督促落实。</li> <li>4、对到货材料开箱检查。</li> <li>5、严格把控施工质量。</li> <li>6、项目管控安全文明施工落实。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、督促施工单位按照建设单位要求施工计划及时完工。</li> <li>2、检查现场安全文明施工情况。</li> <li>3、对施工质量进行检查，严格把控施工质量。</li> </ol> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|






箱变绝缘测试旁站




安全月宣讲




高庄组件安装检查

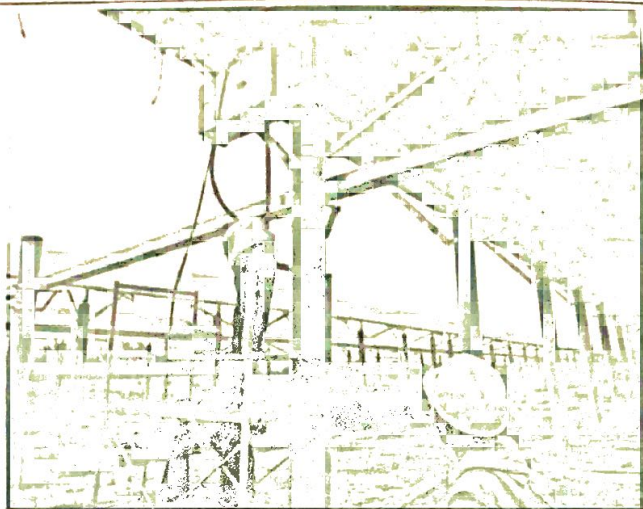

杨家泊逆变器接线检查

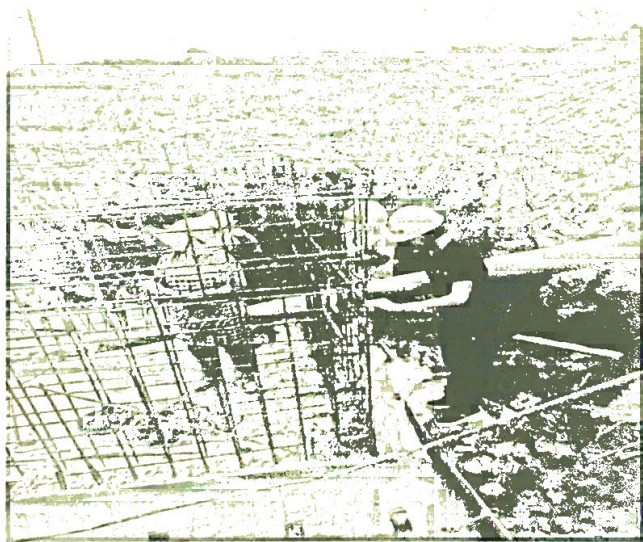

集电线路电缆井检查

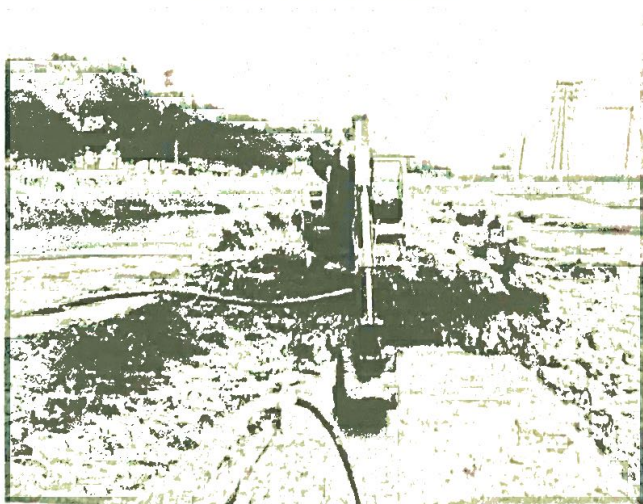

集电线路 12#电缆井施工






13#电缆井支模检查



13#电缆井浇筑检查



14#电缆井尺寸测量

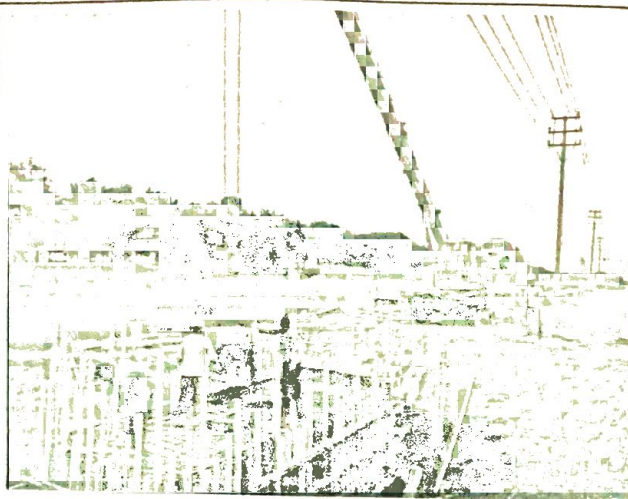

14#电缆井浇筑旁站



9-2#电缆井检查



高庄组件安装检查

设备交付进度

已完成



|    |          |                                         |                             |
|----|----------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|    | 设计交付进度   | 已完成                                     |                             |
|    | 质量体系运作情况 | 质量体系健全，<br>运行良好                         | 落实质量保证体系。                   |
|    | 施工图会审    | 完成                                      |                             |
|    | 设计交底     | 已完成                                     |                             |
|    | 方案审查     | 已完成                                     |                             |
|    | 技术交底     | 已完成                                     |                             |
|    | 设计变更     | 无                                       |                             |
| 安全 | 安全培训情况   | 新进场员工已进行安全培训，                           | 督促进场人员安全培训工作。               |
|    | 安全交底情况   | 已落实完成，本月开展安全教育宣传。                       | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底，进行安全月活动。 |
|    | 安全措施落实情况 | 已要求施工单位认真落实                             | 完善安全措施                      |
|    | 安全文明施工情况 | 现场安全、文明措施良好，防疫物资已配备                     | 落实安全保障体系                    |
| 质量 | 主要工序质量   | 个别组价组件安装存在波浪线，高低差。电缆井工艺不符合设计要求，发送通知单整改。 | 对各工序进行验收检查，确保质量合格。          |
|    | 主要原材料质量  | 本月进场材料                                  |                             |



|    |         |                |                  |
|----|---------|----------------|------------------|
|    |         | 开箱检查合格         |                  |
|    | 构（配）件质量 | 审查合格           |                  |
|    | 设备质量    | 到货设备质量<br>文件齐全 | 进行设备试验           |
|    | 质量验评情况  | 工序施工符合<br>要求   | 督促严格按照<br>工艺要求施工 |
| 投资 | 资金情况    | /              | /                |
|    | 款项支付情况  | /              | /                |
|    | 预算外签证   | 无              | /                |
| 合同 | 合同签订情况  | 施工合同签订         | /                |
|    | 合同执行情况  | 按合同执行          | 做好合同执行<br>工作     |

### 三、本月进度情况

| 序号 | 任务名称     | 计划开始时间     | 计划结束时间     | 施工开始日期     | 施工结束日期 | 本月实际完成（完成量/总量） | 累计完成（完成量/总量） | 备注 |
|----|----------|------------|------------|------------|--------|----------------|--------------|----|
| 1  | 打桩       | 2019.09.12 | 2019.11.06 | 2019.09.02 |        |                | 100%         |    |
| 2  | 支架柱头焊接   | 2019.09.12 | 2019.11.06 | 2019.09.10 |        | 10%            | 97%          |    |
| 3  | 支架安装     | 2019.09.12 | 2019.11.06 | 2019.09.18 |        | 3%             | 94%          |    |
| 4  | 组件安装     | 2019.09.20 | 2019.12.01 | 2019.10.09 |        | 1.8%           | 90%          |    |
| 5  | 电缆敷设     | 2019.10.05 | 2019.12.12 | 2019.11.05 |        | 18%            | 94%          |    |
| 6  | 汇流箱      | 2019.10.01 | 2019.12.05 | 2019.11.03 |        | 30%            | 92%          |    |
| 7  | 箱变安装     | 2019.10.20 | 2019.12.15 | 2019.11.18 |        | 55%            | 100%         |    |
| 8  | 逆变器安装    |            |            |            |        | 45%            | 90%          |    |
| 9  | 羲和钢梁安装   | 11月25日     | 12月20日     | 11月30日     |        |                | 100%         |    |
| 10 | 羲和交流电缆敷设 | 12月20日     | 12月25日     | 12月15日     |        |                | 100%         |    |
| 11 | 羲和桥架安装   | 12月10日     | 12月20日     | 12月8日      |        |                | 100%         |    |
| 12 | 羲和组件     | 2020.03.20 | 2020.03.20 | 2020.04.20 |        | 10%            | 95%          |    |

|    |         |            |            |            |  |  |      |  |
|----|---------|------------|------------|------------|--|--|------|--|
|    | 索安装     |            |            |            |  |  |      |  |
| 13 | 羲和承重索安装 | 2020.03.20 | 2020.03.20 | 2020.04.20 |  |  | 100% |  |

#### 四、下月进度计划

完成全容量并网，所有工程量全部完工。

#### 五、安全文明施工情况

| 事故（起） |    |      | 安全策 | 施工人  | 安全分包情况 |     |      |      |
|-------|----|------|-----|------|--------|-----|------|------|
| 人身    | 机械 | 电网事故 | 划文  | 数    | 分包队    | 分包队 | 系统外包 | 系统外队 |
| 重伤    | 设备 |      | （份） |      | 伍数量    | 伍人数 | 队伍数量 | 伍人数  |
| 无     | 无  | 无    | 2 份 | 86 人 | 2      | /   | /    | /    |

#### 六、施工重点工作情况

| 专业   | 本月重点工作情况                  | 下月重点工作计划                                          |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 进度管理 | 进度未达到进度计划要求，已滞后           | 督促根据工作面合理安排进度，及时完工。                               |
| 安全管理 | 要求加强现场安全管理，现场必须配置专职安全员。   | 实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。                         |
| 质量管理 | 对施工各项工序进行检查，要求严格按照工艺要求施工。 | 单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划 |
| 技术管理 | 督促施工单位对施工人员进行技术交底。        | 现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。                           |
| 造价管理 |                           | 对施工单位申请工程款及时进行评审                                  |
| 物资供应 | 已完成                       | 督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。       |
