



正衡监理

编号: ZHJL-YB-011

监 理 月 报

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体
现代渔业园项目

2020 年 08 月 第 11 期

项目监理部 (章)



总监理工程师:

符耀生

报告日期: 2020 年 08 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

月次 第 11 次

月报开始时间 2020 年 07 月 26 日 结束日期 2020 年 08 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	天津市滨海新区杨家泊镇 通威渔光一体现代（海水） 渔业园（光伏部分）项目		影像	18 张	

二、监理重点工作情况

专业	事项照片	本月重点工作情况	下月重点工作计划

进度	 杨家泊支架安装  9-1 电缆井支模  杨家泊组件安装  9-1 电缆井浇筑	1、本月进行资料归档会议及并网前协调会议。 2、每日对现场各工序进行检查。 3、对现场进度进行把控。 4、对集电线路检查。 5、严格把控施工质量。 6、项目管控安全文明施工落实。	1、督促施工单位按照建设单位要求施工进度及时完成容量并网。 2、检查现场安全文明施工情况。 3、对施工质量进行检查，严格把控施工质量。
-----------	---	--	---



8#电缆井拆模



资料归档会议




集电线路高压电缆敷设



集电线路高压电缆敷设检查



电缆沟铺沙盖砖

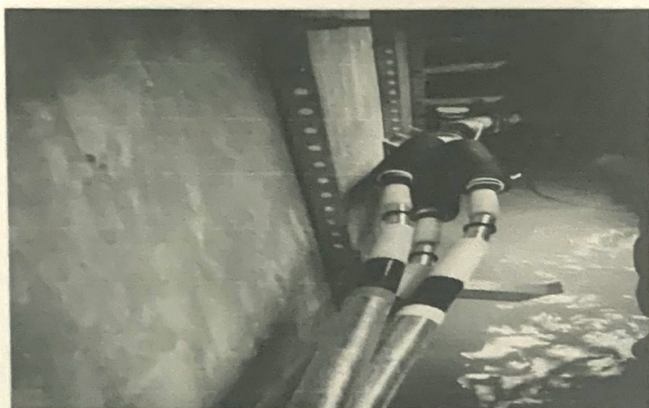

电缆中间头制作




集电线路进入 27#箱变



集电线路进入 27#箱变高压电缆头制作




27#箱变集电线路高压电缆头制作旁站

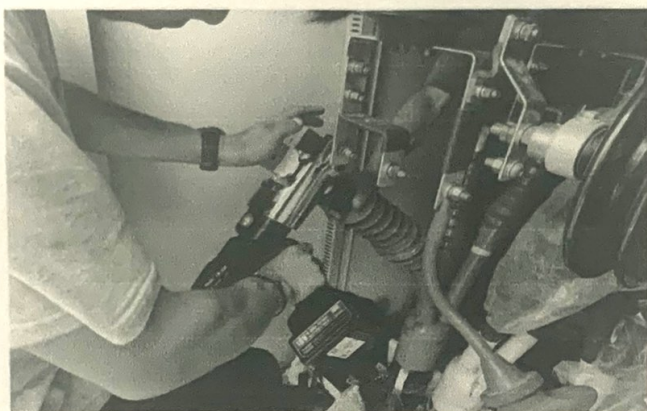

集电线路进入 39#箱变高压电缆头制作



39#箱变集电线路高压电缆头制作

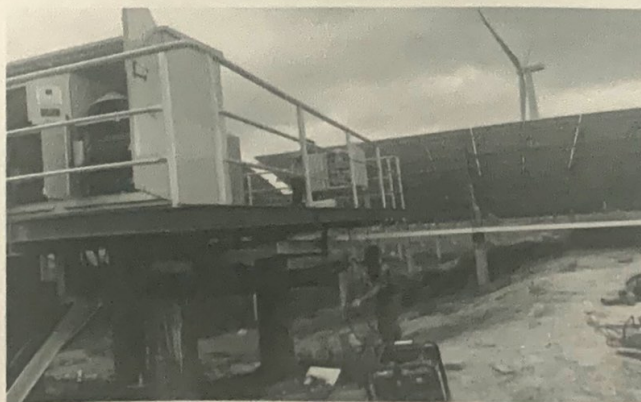

39#通讯电缆接线



并网前协调会议



杨家泊支架安装

设备交付进度

已完成

	设计交付进度	已完成	
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系。
	施工图会审	完成	
	设计交底	已完成	
	方案审查	已完成	
	技术交底	已完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训，	督促进场人员 安全 培训工 作。
	安全交底情况	已落实完成，本 月开展安全教 育宣传。	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底， 进行安全月活 动。
	安全措施落实情况	已要求施工单 位认真落实	完善安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好，防疫 物资已配备	落实安全保障 体系
质量	主要工序质量	个别组价组件 安装存在波浪 线，高低差。 电缆井工艺不 符合设计要求， 发送通知单整 改。	对各工序进行 验收检查，确保 质量合格。
	主要原材料质量	本月进场材料	

		开箱检查合格	
	构（配）件质量	审查合格	
	设备质量	到货设备质量 文件齐全	进行设备试验
	质量验评情况	工序施工符合 要求	督促严格按照 工艺要求施工
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	打桩	2019.09.12	2019.11.06	2019.09.02			100%	
2	支架柱头焊接	2019.09.12	2019.11.06	2019.09.10			100%	
3	支架安装	2019.09.12	2019.11.06	2019.09.18		3%	94%	
4	组件安装	2019.09.20	2019.12.01	2019.10.09		0.5%	99.5%	
5	电缆敷设	2019.10.05	2019.12.12	2019.11.05		4%	97%	
6	汇流箱	2019.10.01	2019.12.05	2019.11.03			100%	
7	箱变安装	2019.10.20	2019.12.15	2019.11.18			100%	
8	逆变器安装						100%	
9	羲和钢梁安装	11月25日	12月20日	11月30日			100%	
10	羲和交流电缆敷设	12月20日	12月25日	12月15日			100%	
11	羲和桥架安装	12月10日	12月20日	12月8日			100%	
12	羲和组件索安装	2020.03.20	2020.03.20	2020.04.20		5%	100%	

13	義和承重 索安装	2020.03.20	2020.03.20	2020.04.20			100%	
----	-------------	------------	------------	------------	--	--	------	--

四、下月进度计划

完成全容量并网，所有工程量全部完工。

五、安全文明施工情况

事故（起）			安全策 划文 （份）	施工人 数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无	2 份	48 人	4	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	进度未达到进度计划要求，已滞后	督促根据工作面合理安排进度，及时完成全容量并网。
安全管理	要求加强现场安全管理，现场必须配置专职安全员。	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	对施工各项工序进行检查，要求严格按照工艺要求施工。	单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底。	现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理		对施工单位申请工程款及时进行评审
物资供应	已完成	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。
