

编号: JXM16-ZHJL-001

监 理 月 报

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

2019 年 10 月 第 01 期

监理项目部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 10 月 31 日



扫描全能王 创建

监理月报

1. 本月工程实施情况（形象进度表、照片）

- 1、A、B 两个并网盘柜基础施工完成。
- 2、两个水泥屋顶组件、桥架、电缆安装完成。
- 3、1#、3#、4#、6#彩钢瓦屋顶夹具、导轨安装完成。
- 4、6 坐厂房屋面逆变器安装完成 31 台。剩余 3 台未安装，缺背板。
- 5、光伏专用电缆敷设完成。
- 6、光钎敷设完成。
- 7、汇流箱 10 台安装完成。
- 8、485 通讯电缆安装完成。
- 9、水清洗系统安装完成。

2. 本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、本月监理日常巡视工地，对质量、进度、安全文明等进行检查，发现问题及时提出并督促整改；
- 2、本月共发出监理通工作联系单 1 份，监理检查记录 3 份；
- 3、本月共组织召开 3 次监理工地例会。
- 4、本月共进行 6 次平行检验，分别为 1#、2#、3#、4#、5#、6#屋面已完成安装的夹具、导轨、组件、支架、桥架安装验收。
- 5、对进场材料设备进行了到货检。
- 6、旁站电缆头接线情况。

3. 工程存在问题及建议

- 1、部分工人安全文明意识较差，施工现场不戴安全帽和吸烟现象时有发生。
- 2、现场成品保护工作差。
- 3、汇流箱、电缆和并网盘现场进度慢，预计达不成原定计划的并网验收节点。


针对以上问题，监理部与施工单位及时提出，要求加强现场管理工作，并发出监理工作联系单。


4. 下月监理工作重点



- 1、现场日常巡视，对逆变器安装、组件安装、并网柜安装等工序进行验收；
- 2、对现场材料设备进行到场检查，电缆、逆变器、并网柜、组件等；
- 3、现场安全文明管理工作；
- 4、配合并网验收相关工作。

工程影像图片：

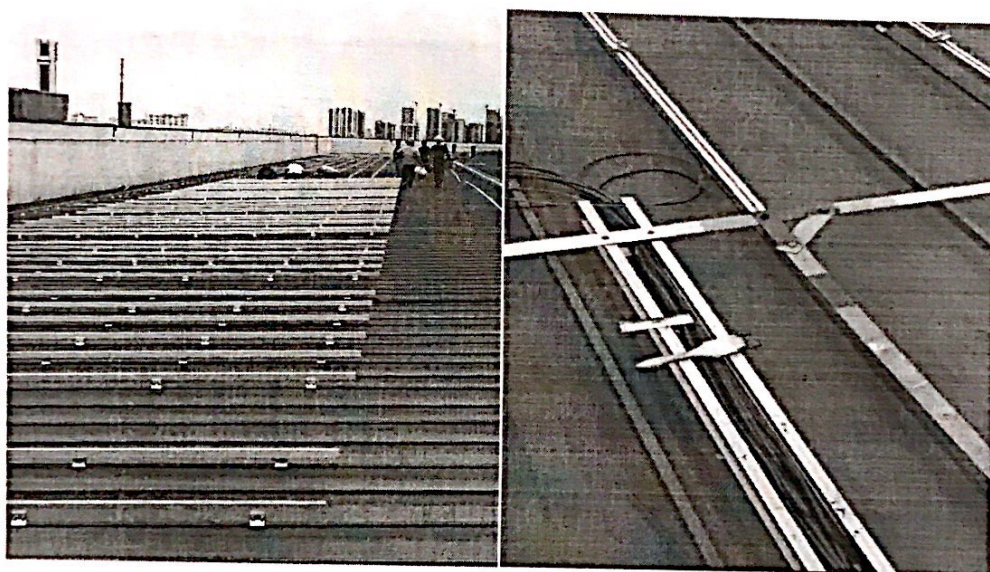

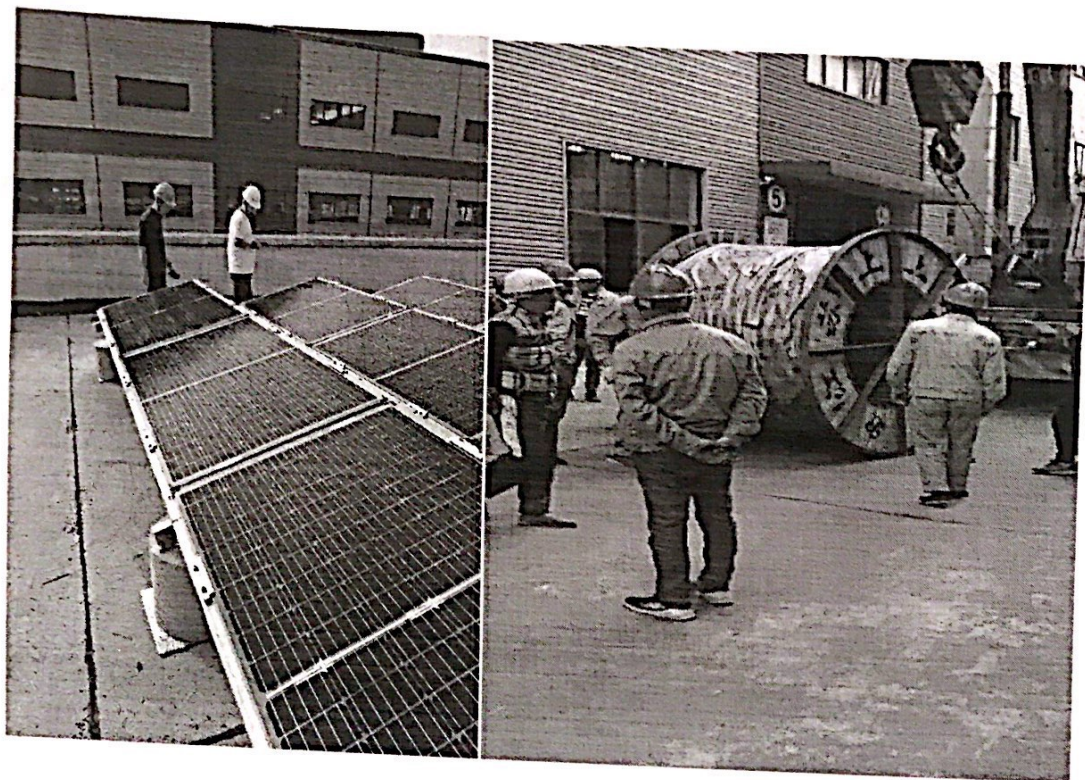

溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目监理项目部

2019 年 10 月 31 日



扫描全能王 创建
