



编号：ZHJL-ZNDQ-05

监 理 月 报

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

2020 年 05 月 第 5 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：刘士发

报告日期：2020 年 05 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

月次 第 5 次 月报

开始时间 2020 年 04 月 26 日 结束日期 2020 年 05 月 25 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电 项目		影像	60 张	

一、 监理重点工作情况


专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		4#5# 屋面组串线接头已全部制作完成，屋面逆变器及汇流箱已运行；项目已全额并网发电；	项目竣工验收；




屋面缺少
的电缆桥
架已到场
，并安装
完成；设
备到主桥
架间电缆
桥架通道
已安装完
成；

屋面接地
扁铁及设
备接地、
支架接地
已全部完
成；

防火封堵
已全部完
成；

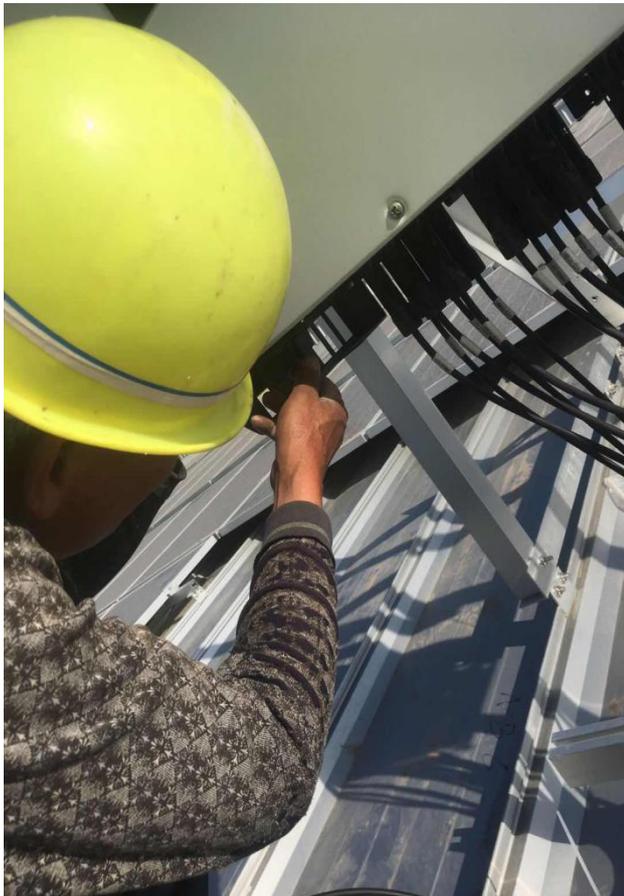

对项目进
行预验收
，验收问
题详见通
知到 006

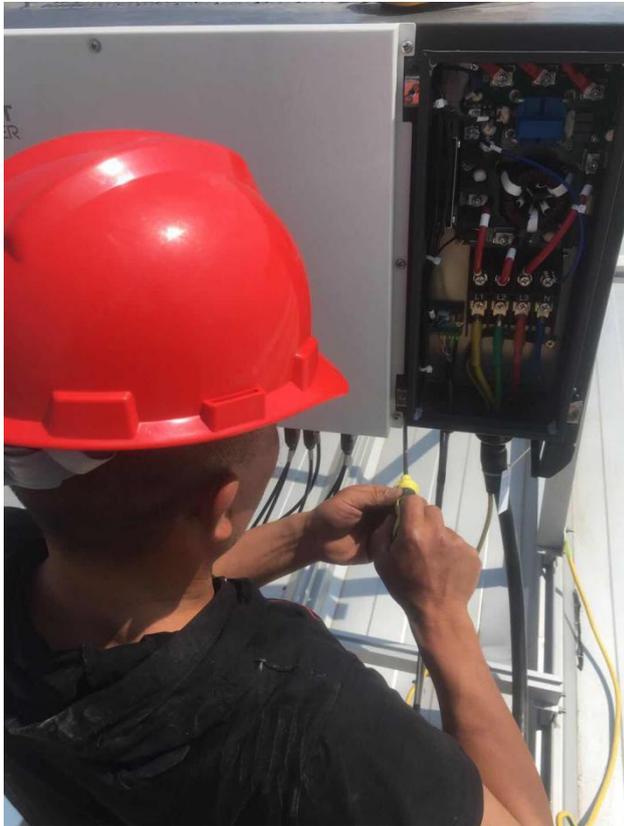

设备交付进度	已全部到场	
设计交付进度	图纸完成	图纸完成
质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
施工图会审	完成	

	设计交底	完成	
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	有	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装，电缆桥架安装，电缆敷设，电缆头制作及逆变器；	符合规范要求
	主要原材料质量	做好设备开箱检查记录，并要求施工单位做好材料报审；	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合	加强过程检查

		要求	力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同未签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无		1人	/	/	/	/

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	项目已基本完工，等待竣工验收
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	已完成。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条	对工程组织预验收，提出的问题要求施工单位尽快整改

	文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	已完成
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	施工进度款已申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 05 月 25 日
