



编号：ZHJL-HFLB-YB-04

监 理 月 报

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式
光伏发电项目

2020 年 03 月第 4 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：于彬

报告日期：2020 年 03 月 29 日

监 理 月 报

工程名称: 联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 第 4 月次 第 4 次

月报开始时间 2020 年 03 月 03 日 结束日期 2019 年 03 月 31 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	厂房钢结构加固 屋面光伏施工	影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		厂房钢结构加固 屋面光伏暂时停工	厂房钢结构加固 屋面光伏暂时停工
	设备交付进度	完成 80%	/
	设计交付进度	钢结构图纸完成 屋面光伏施工图纸完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系	

	施工图会审	已完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位报 审其他资料
	技术交底	完成	完成
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对高空作业、危险作业点进行班前交底	督促施工单位对 高空作业、危险作 业点进行班前交 底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改。	督促施工单位彻 底落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管 理力度
质量	主要工序质量	斜支撑焊接 组件安装 变压器安装 逆变器安装 高低压柜安装 电缆敷设	/
	主要原材料质量	钢管外观检查合格 钢板外观检查合格 圆钢外观检查合格 檩条外观检查合格 檩条涂料厚度测量合格 组件外观检查合格 组件 EL 检测合格	/

		电缆外观检查合格	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	/
	设备质量	变压器开箱检查合格 逆变器开箱检查合格 各保护装置柜开箱检查合格	
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

1、本月厂房钢结构

本月厂房钢结构

2#库加固施工情况

拉条共计 2176 根，累计完成 1144 根；完成 53%；

斜支撑共计 56 根，累计完成 56 根，完成 100%；

斜支撑连接板共计 112 块、累计完成 112 块，完成 100%；

檩条共计 230 根，累计完成 95 根，完成 41%。

2、本月屋面光伏施工：

三、 下月进度计划

厂房钢结构加固斜支撑焊接、斜支撑连接板安装、檩条安装、拉条安装；

四、 安全文明施工情况


事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		30 人	2	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	钢结构材料到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	光伏组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。

	容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对施工单位申请的工程款及时进行评审



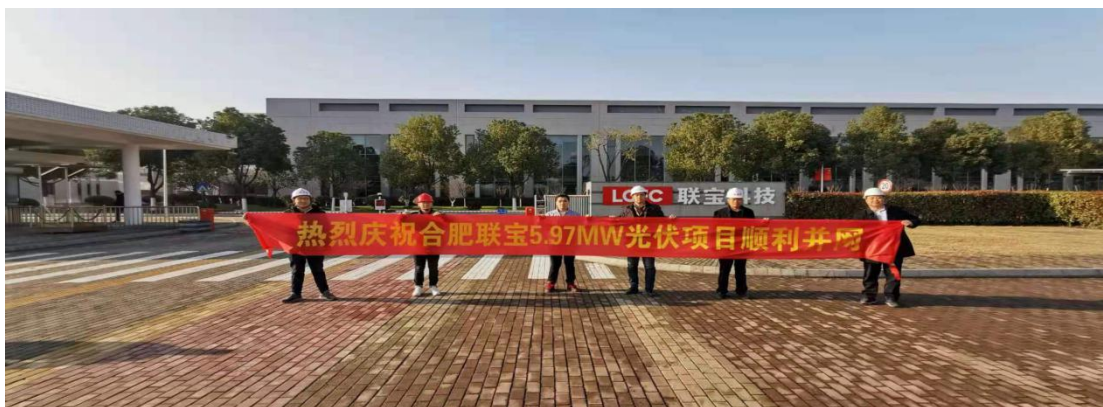

常州正衡电力工程监理有限公司

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

2020 年 03 月 31 日
