



编号：ZHJL-HFLB-YB-05

监 理 月 报

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式
光伏发电项目

2020 年 04 月第 5 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：于彬

报告日期：2020 年 04 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 第 4 月次 第 5 次

月报开始时间 2020 年 03 月 31 日 结束日期 2019 年 04 月 30 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	厂房钢结构加固 屋面光伏施工	影像		见附件

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		厂房钢结构加固 屋面光伏暂时停工	厂房钢结构加固 屋面光伏暂时停工
	设备交付进度	完成 80%	/
	设计交付进度	钢结构图纸完成 屋面光伏施工图纸完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系	

	施工图会审	已完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位报 审其他资料
	技术交底	完成	完成
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对高空作业、危险作业点进行班前交底	督促施工单位对 高空作业、危险作 业点进行班前交 底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实，检查现场存在的安全隐患，发现问题及时整改。	督促施工单位彻 底落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管 理力度
质量	主要工序质量	斜支撑焊接 组件安装 变压器安装 逆变器安装 高低压柜安装 电缆敷设	/
	主要原材料质量	钢管外观检查合格 钢板外观检查合格 圆钢外观检查合格 檩条外观检查合格 檩条涂料厚度测量合格 组件外观检查合格 组件 EL 检测合格	/

		电缆外观检查合格	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	/
	设备质量	变压器开箱检查合格 逆变器开箱检查合格 各保护装置柜开箱检查合格	
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

1、本月厂房钢结构

本月厂房钢结构

1#库加固施工情况

拉条共计2122根，累计完成626根，完成30%；

斜支撑共计56根，累计完成45根，完成80%；

斜支撑连接板共计112块，累计完成90块，完成80%；

檩条共计230根，累计完成57根，完成25%。

2#库加固施工情况

拉条共计2176根，累计完成1410根；完成65%；

斜支撑共计56根，累计完成56根，完成100%；

斜支撑连接板共计112块，累计完成112块，完成100%；

檩条共计230根，累计完成230根，完成100%。

3#库加固施工情况

拉条共计1440根，累计完成590根，完成41%；

斜支撑共计66根，累计完成10根，完成15%；

斜支撑连接板共计132块，累计完成20块，完成15%；

檩条共计143根，累计完成0根，完成0%。

4#库加固施工情况

拉条共计1998根，累计完成1464根。完成73%；
斜支撑共计56根，累计完成56根，完成100%；
斜支撑连接板共计112块，累计完成112块，完成100%；
檩条共计232根，累计完成83根，完成36%。

5#库加固施工情况

拉条共计1680根，累计完成1375根，完成82%；
斜支撑连接板共计104块，累计完成90块，完成87%；
斜支撑共计52根，累计完成46根，完成88%；
檩条共计230根，累计完成180根，完成78%。

6#库加固施工情况

拉条共计1860根，累计完成1412根，完成76%；
斜支撑共计73根，累计完成55根，完成75%；
斜支撑连接板共计146块，累计完成111块，完成76%；
檩条共计170根，累计完成86根，完成47%。

2、本月屋面光伏施工：

停工

暂未入场

三、 下月进度计划

厂房钢结构加固斜支撑焊接、斜支撑连接板安装、檩条安装、拉条安装；

四、 安全文明施工情况




事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
					数量		数量	数
无	无	无		30 人	2	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安

	度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	钢结构材料到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	光伏组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。按正式设计交付图纸要求监理，发现问题及时要求整改。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对施工单位申请的工程款及时进行评审



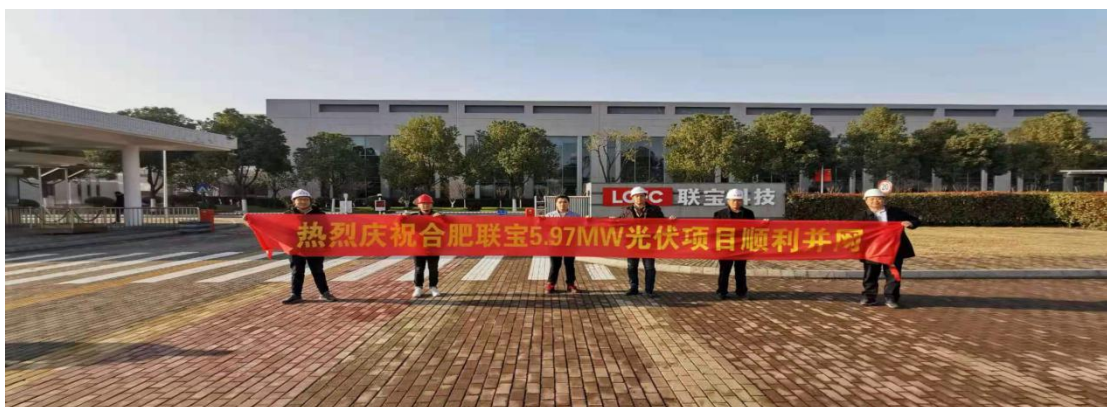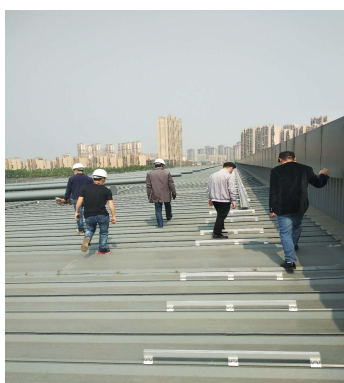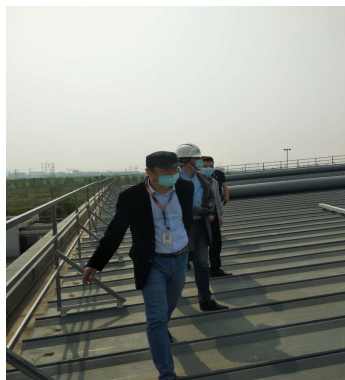

常州正衡电力工程监理有限公司

联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

2020 年 04 月 30 日
