

编号: JXM16-ZHJL-010

监 理 月 报

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

2020 年 10 月 第 10 期

监理项目部(章)



总监理工程师:

报告日期: 2020 年 10 月 31 日

监 理 月 报

一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

- 1、35KV 集电线路导线紧线、金具、绝缘子、光纤等完成 100%；
- 2、光伏区消缺完成、池塘内施工垃圾清理完成；
- 3、2020 年 10 月 23 日 35KV 集电线路带电；10 月 24 日并网成功。

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、本月监理日常巡视施工现场，对质量、进度、安全文明等进行检查，发现问题及时提出并督促整改；
- 2、10 月 22 日业主组织召开集电线路带电及并网前的前期准备工作会议；
- 3、并网前监理、业主及施工单位对光伏区、集电线路进行了安全、质量检查；
- 4、对光伏区资料已签字盖章完成。

三、工程存在问题及建议




- 1、35KV 集电线路在没有安装避雷器、计数器的情况下，业主就坚持集电线路送电。
- 2、现场施工过程资料报审不及时，未能跟施工同步报审。
- 3、集电线路施工单位负责人、现场管理人员需加强管理，需每天班前对施工人员做好安全技术交底，确保项目施工安全及施工质量。

针对以上问题，监理部与施工单位及时提出，要求加强现场管理工作、尽快完善施工资料并报监理部审批。

四、下月监理工作重点

- 1、完善监理资料、对集电线路施工资料进行审查、签字、盖章；
- 2、预计2020年11月10日通威公司人员对项目进行实体、资料验收；11月20日省质检站对项目实体、资料进行验收；
- 3、对集电线路基塔接地、塔腿防护帽施工检查；
- 4、督促集电线路施工单位完成施工资料；
- 5、与建设方项目经理（陈坚）协商，监理在省质检站验收结束后撤场（预计11月底）。

工程影象图片：

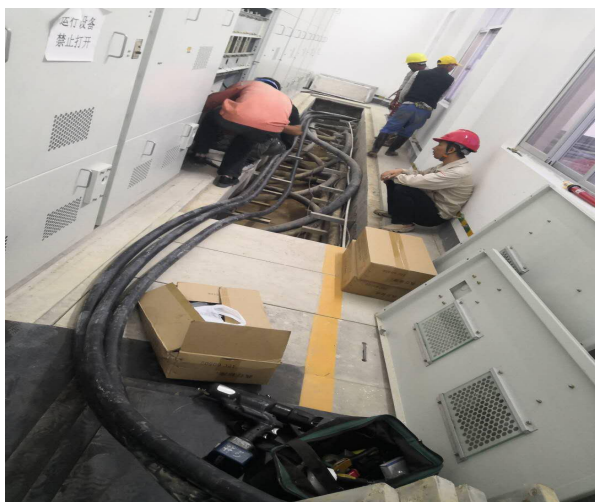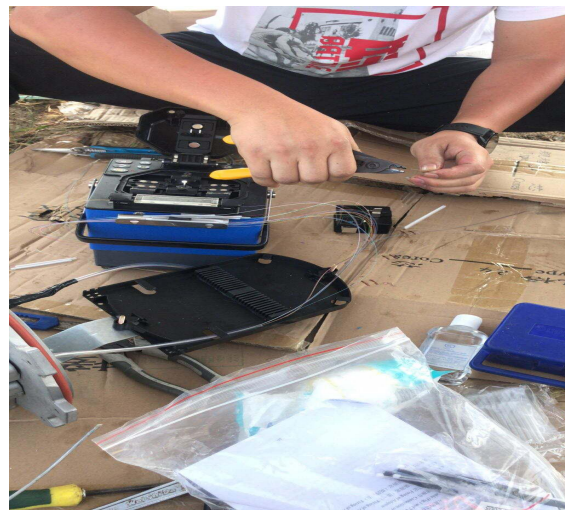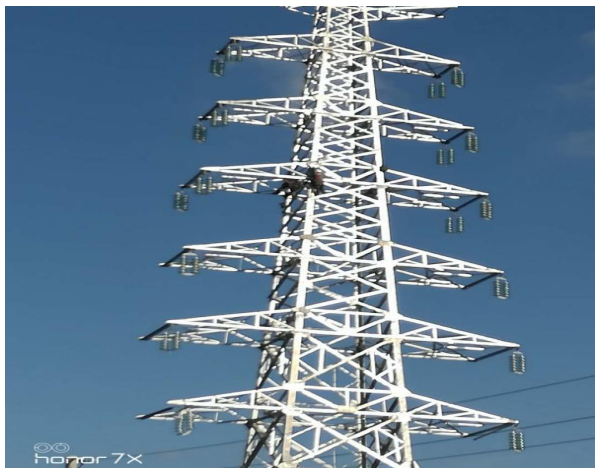

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）

光伏发电项目监理项目部

2020年10月31日
