

编号：JXM16-ZHJL-002

监 理 月 报

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

2019年12月 第02期

监理项目部（章）：



总监理工程师： 赵士发

报告日期：2019年12月30日



扫描全能王 创建

监理月报

一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

- 1、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#塔已完成。(8#、9#、11#、16#、17#未完成；完成约35%)。
- 2、18#塔基础A腿打桩完成，17#桩进场道路确认，9#需协调进场；
- 3、光伏区支架基础放点完成2572个；
- 4、管桩累计到货2489条，到货完成至47.15%；
- 5、箱变吊装完成；
- 6、基础桩累计打桩2347根；占总量比列44.46%；
- 7、支架安装173组，占总量比列21.12%；
- 8、组件安装115组，占总量比列14.04%；
- 9、逆变器安装20台，占总量比列14.59%；

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、本月监理日常巡视工地，对质量、进度、安全文明等进行检查，发现问题及时提出并督促整改；
- 2、本月共发出监理通知单7份，监理检查记录7份，旁站监理记录23份；
- 3、本月共组织召开4次监理工地例会。
- 4、对进场材料设备进行了到货检。

三、工程存在问题及建议

- 1、部分工人安全文明意识较差，施工现场不戴安全帽和吸烟现象时有发生。
- 2、现场大型机械设备较少，施工人员分配不合理，施工进度较慢。
- 3、现场施工过程资料报审不及时，未能跟施工同步报审。

针对以上问题，监理部与施工单位及时提出，要求加强现场管理工作，并发出监理通知书。




四、下月监理工作重点

- 1、现场日常巡视，对桩基开挖，混凝土浇筑，钢筋捆扎等工序进行验收；
- 2、对现场材料设备进行到场检查，电缆、逆变器等；
- 3、现场安全文明管理工作；
- 4、配合并网验收相关工作。



扫描全能王 创建

工程形象图片：

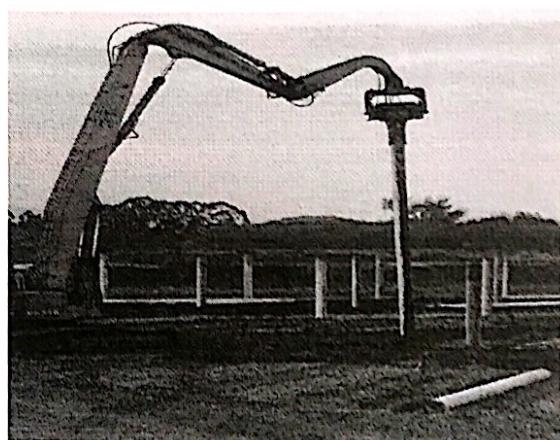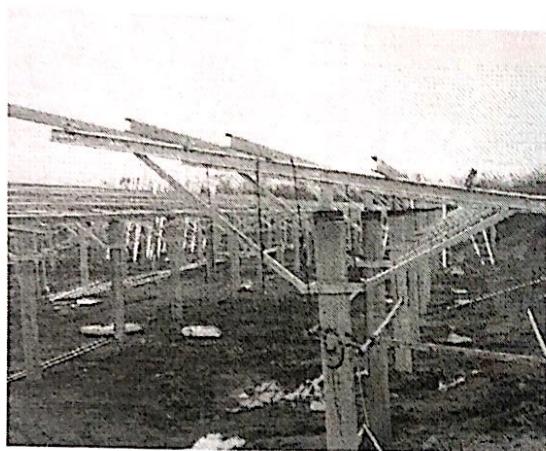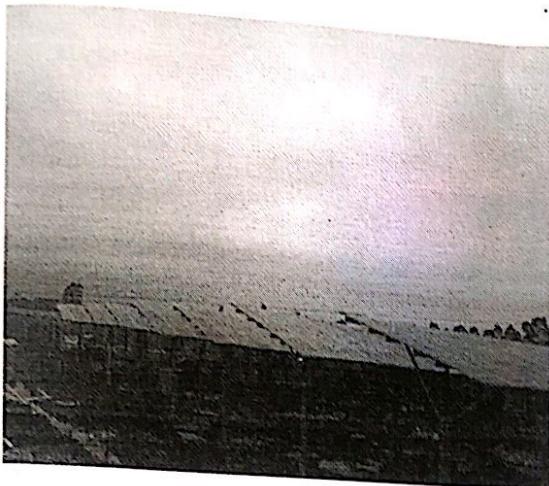

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）

光伏发电项目监理项目部

2019年12月30日

钦州康熙岭渔光
一体光伏电站
项目部



扫描全能王 创建
