

编号: JXM16-ZHJL-004

监 理 月 报

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

2020 年 04 月 第 04 期

监理项目部(章):



总监理工程师:

刘士发

报告日期: 2020 年 04 月 30 日



扫描全能王 创建

监理月报

一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

- 1、1#、16#、18#塔桩基完成。9#、10#、17#未完成；完成约 50%
- 2、2#、3#、4#、5#、6#、7#、12#、13#、14#、15#已完成；未开挖 8#、11#、13#、完成 66%；
- 3、1#、2#、3#、4#、5#、7#、6#、12#、13#、14#、15#、18#浇筑完成，完成约 61%；
- 4、2#、3#、4#、6#、7#、5#、12#、13#、14#、15#基础回填完成。1#、2#、6#、7#、18#组塔完成。
- 5、光伏区支架基础放点完成 4402 个；
- 6、管桩累计到货 4941 条，到货完成至 95.14%；
- 7、箱变吊装完成；
- 8、基础桩累计 4225 根；占总量比列 81.31%；
- 9、支架累计安装 449 组；占总量比列 54.82%；
- 10、组件累计安装 445 组；占总量比列 54.33%；
- 11、逆变器累计安装 76 台；占总量比列 55.47%；

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、本月监理日常巡视工地，对质量、进度、安全文明等进行检查，发现问题及时提出并督促整改；
- 2、本月共发出监理通知单 9 份，监理检查记录 5 份，旁站监理记录 13 份；
- 3、本月共组织召开 5 次监理工地例会。
- 4、对进场材料设备进行了到货检。

三、工程存在问题及建议

- 1、部分工人安全文明意识较差，施工现场不戴安全帽和吸烟现象时有发生。
- 2、现场大型机械设备较少，施工人员分配不合理，施工进度较慢。
- 3、现场施工过程资料报审不及时，未能跟施工同步报审。


针对以上问题，监理部与施工单位及时提出，要求加强现场管理工作，并发出监理通知单。

四、下月监理工作重点



- 1、现场日常巡视，对桩基开挖，混凝土浇筑，钢筋捆扎等工序进行验收；
- 2、对现场材料设备进行到场检查，电缆、逆变器等；
- 3、现场安全文明管理工作；
- 4、配合并网验收相关工作。

工程影象图片：

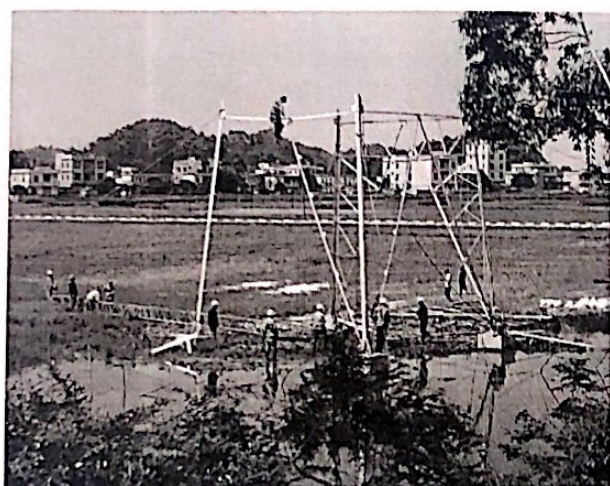

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）

光伏发电项目监理项目部

2020年04月30日

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）
监理项目部



扫描全能王 创建
