

编号: JXM16-ZHJL-005

监 理 月 报

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

2020 年 05 月 第 05 期

监理项目部(章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2020 年 05 月 30 日



扫描全能王 创建

监理月报

一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

- 1、1#、9#、16#、17#、18#塔桩基完成。8#、10#未完成；完成约 71%；
- 2、2#、3#、4#、5#、6#、7#、11#、12#、13#、14#、15#基础施工已完成，完成 90%；
- 3、1#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、6#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#浇筑完成，完成约 91%；
- 4、1#、2#、3#、5#、6#、7#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#组塔完成 83%。
- 5、基础桩打桩完成；
- 6、逆变器安装累计 137 台；占总量比列 100%；
- 7、立柱焊接累计 4872 个；占总量比例 99.14%；
- 8、桥架支撑安装累计 686 套；桥架安装累计 3560 米； $\phi 16$ 接地焊接累计 1978 米；支架跨接焊接累计 408 米；集成线路桥架支撑安装累计 270 个；
- 9、支架安装累计 759 组；占总量比列 92.67%；
- 10、组件安装累计 759 组；占总量比列 91.45%；

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、本月监理日常巡视工地，对质量、进度、安全文明等进行检查，发现问题及时提出并督促整改；
- 2、本月共发出监理通知单 6 份，监理检查记录 3 份，旁站监理记录 3 份；
- 3、本月共组织召开 5 次监理工地例会。

三、工程存在问题及建议

- 1、部分工人安全文明意识较差，施工现场不戴安全帽和吸烟现象时有发生。
- 2、现场大型机械设备较少，施工人员分配不合理，施工进度较慢。
- 3、现场施工过程资料报审不及时，未能跟施工同步报审。

针对以上问题，监理部与施工单位及时提出，要求加强现场管理工作，并发出监理通知单。

四、下月监理工作重点


- 1、现场日常巡视，对桩基开挖，混凝土浇筑，钢筋捆扎等工序进行验收；
- 2、对现场材料设备进行到场检查，电缆、逆变器等；



3、现场安全文明管理工作；

4、配合并网验收相关工作。

工程影像图片：

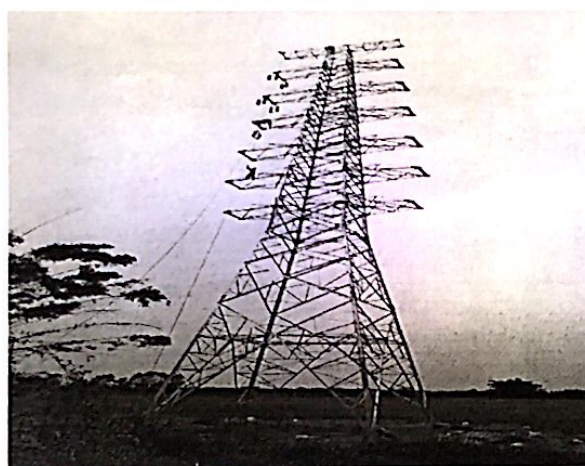

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）

光伏发电项目监理项目部

2020年05月30日



扫描全能王 创建
