

编号: JXM16-ZHJL-007

监 理 月 报

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

2020 年 07 月 第 07 期

监理项目部(章)



总监理工程师:

报告日期: 2020 年 07 月 31 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

一、本月工程实施情况（形象进度表、照片）

- 1、集电线路由于阻工而停工；
- 2、支架安装 819 组；占总量比列 100%；
- 3、组件安装 819 组；占总量比列 100%；
- 4、桥架支撑安装累计 693 套；桥架安装累计 3888 米（光伏区）盖板未盖；
- 5、 $\phi 16$ 接地焊接 400 米，累计 3706 米；支架跨接 70 米，焊接累计 591 米；
- 6、集成线路桥架支撑安装累计 270 个；
- 7、逆变器公母头连接累计 49 台；1*4 小线累计 9000 米，敷设 140560 米；
- 8、3*120 电缆敷设累计 22964 米；3*120 铜铝过渡端子压接 300 个，累计 615 个；
- 9、3*150 高压头制作累计 10 个（100%）；3*70 高压头制作累计 2 个（100%）；
- 10、组件公母头压接累计 4737 套；箱变围栏安装累计 7 个（100%）；
- 11、桥架盖板连接累计 1100 米；通讯箱安装 3 个，累计 7 个（100%）；
- 12、60*60*6 铜包角钢捶打累计 53 根，40*40 铜包角钢连接累计 307 米；

二、本月监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

- 1、本月监理日常巡视工地，对质量、进度、安全文明等进行检查，发现问题及时提出并督促整改；
- 2、本月监理检查记录 1 份、本月 30 日建设方、监理、施工单位对光伏区进行初步验收，对发现的缺陷及未完成项以验收报告分发给建设方、施工单位。
- 3、本月共组织召开 2 次监理工地例会。

三、工程存在问题及建议

- 1、部分工人安全文明意识较差，施工现场不戴安全帽和吸烟现象时有发生。
- 2、要求施工单位对初验汇总的缺陷、未完成项抓紧时间安排人员进行整改、完善。
- 3、现场施工过程资料报审不及时，未能跟施工同步报审。

针对以上问题，监理部与施工单位及时提出，要求加强现场管理工作、尽快完善施工资料并报监理部审批。





四、下月监理工作重点

- 1、完善监理资料、对施工资料进行审查；
- 2、现场安全文明管理工作；



3、监督现场对消缺项及未完成整改进行检查。

工程影像图片：

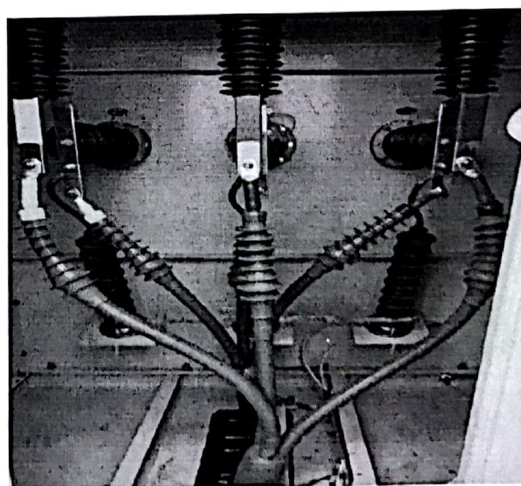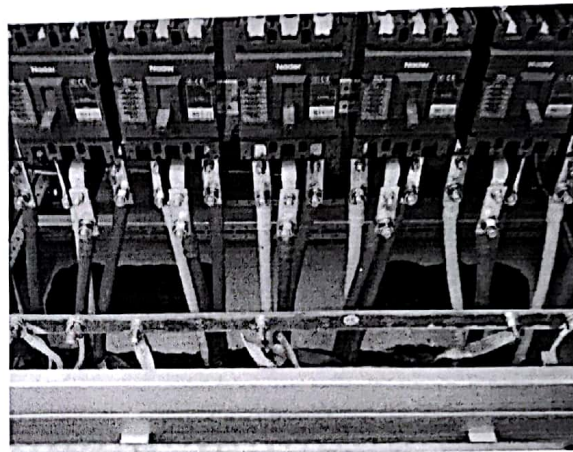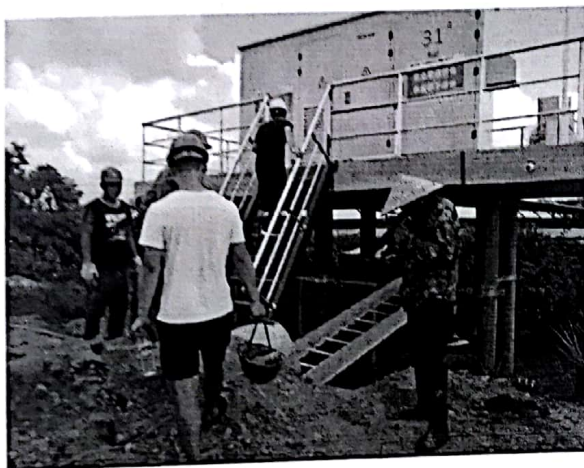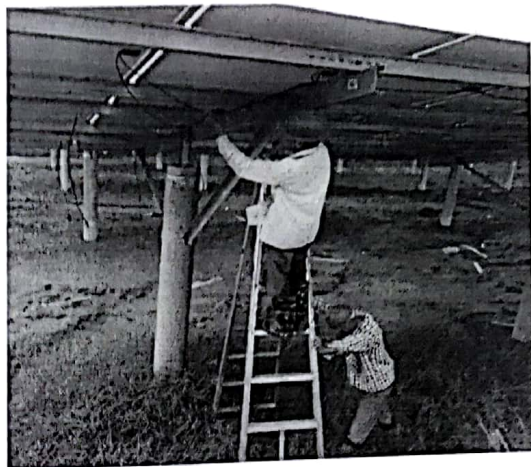

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）

光伏发电项目监理项目部

2020年07月31日



由 扫描全能王 扫描创建
