



正衡监理

编号: ZHYB-SHXH-01

监 理 月 报

工程名称: 海新华科技 310.2KWp 分布式光伏发电项目

2019 年 12 月

项目监理部 (章)



总监理工程师: 杜召栋

报告日期: 2019 年 12 月 31 日

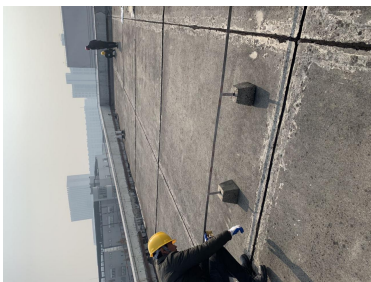
监 理 月 报

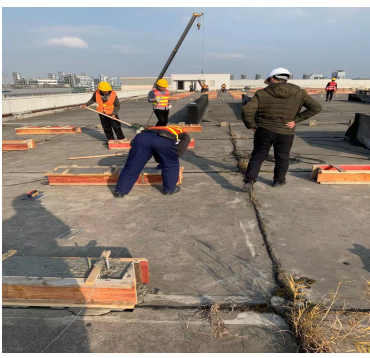
工程名称: 上海新华科技 310.2KWp 分布式光伏发电项目 月次 第 1 次

月报开始时间 2019 年 12 月 3 日 结束日期 2019 年 12 月 31 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	上海新华科技 310.2KWp 分布式光伏发电项目	     	照片	12	进度、质量、安全

		     			
--	--	--	--	--	--

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	屋顶的土建工程	屋顶混凝土浇筑； 员工屋顶接地扁钢焊接；	一号屋顶接地扁钢焊接
	桥架安装工程	2号、3号屋顶桥架安装完成， 屋顶至地下室电缆桥架也已经完成。	一号屋顶桥架安装
	设备交付进度	无	无

	设计交付进度	/	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	继续加强检查，发现问题即时督促整改。
	施工图会审	完成施工图会审	
	设计交底	土建设计已交底	督促后续工序设计交底
	方案审查		督促施工单位报审资料
	技术交底		督促施工单位报审资料
	设计变更	无	/
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	组织新进场员工安全培训
	安全交底情况	对设备材料吊运，临时用电、工器具使用、混凝土浇筑等安全文明施工进行监督检查。	对登高作业等安全文明施工进行监督检查。
	安全措施落实情况	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	安全文明施工情况	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。	继续加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	核对图纸，检查屋顶基础钢筋、混凝土浇筑前验收	检查混凝土基础、接地、桥架等施工质量
	主要原材料质量	混凝土、钢筋、扁铁、等	
	构（配）件质量	组件	组件
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序抽查力度	加强过程检查力度，加大工序抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/

合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

1、本月土建施工人员平均每天 6 人；电气施工人员 6 人；并网柜已经安装完成；并且并网柜隔离刀闸上端已经通电。

2、屋顶混凝土浇筑、支架安装完成100%；组件安装完成90%，电缆放线完成70%，电缆桥架完成70%，接地扁钢完成60%。

四、下月进度计划

1、一号屋顶电气安装全部完成，2020 年 1 月 6 日之前完成并网前全部准备工作，2020 年 1 月 3 日之前并网柜完成调试工作。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械设 备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数
无	无	无		13 人	1	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管 理	督促施工单位充分调动施工人员的积极性，尽快按业主要求完成施工。	按业主要求 2020 年 1 月 6 日之前完成并网前一切准备工作。
安全管 理	要求施工单位对施工人员进行安全技术交底，提高屋顶作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。电气安装必须要专业技术人员进行安装。发现问题及时提出整改要求并限期改正。	要求施工项目部加强施工人员安全防范意识。
质 量 管 理	混凝土、电缆桥架、扁铁等原材料的进场检查；混凝土基础、环网接地、电缆桥架等施工质量；单位工	

	程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施。	
技 术 管 理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造 价 管 理	/	/
物 资 供 应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	/

常州正衡电力工程监理有限公司

上海新华科技 310.2KWp 分布式光伏发电项目

2019 年 12 月 31 日
