

JXM16*: 监理月报

编号: CZZH-CDXD-YB-03

监 理 月 报

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp

分布式光伏发电项目

2020 年 06 月 第 1 期

总监理工程师:

监理项目部 (章):



报告日期: 2020 年 6 月 28 日

监理月报


1. 本月工程实施情况

工程名称	普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目
项目地址	成都新都物流园
建设单位	成都普蓝新能源有限公司
设计单位	浙江恒欣建筑设计股份有限公司 信息产业电子第十一设计研究科技工程股份有限公司
总包单位	阳光电源股份有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
工程概况	普洛斯成都新都物流园1.2MWp分布式光伏发电项目，项目建 设在四川省成都市新都区中集大道66号普洛斯成都新都物流园仓 库屋顶B-1/B-3/B-4屋顶上，总装机容量1.2MW，共4个并网点。每 个并网点由740块405W多晶单面组件，经由2台100KW逆变器和1台 50KW逆变器将直流电流逆变成380V交流电流，再通过1台380V低压 并网柜，经由ZRC-YJV22-0.6/1kV-3x150+1x70mm² 电缆并到原园区 内10KV箱变的低压侧母排上，所有发电量信息及现场视频监控经 由数据采集器采集并上传至云端服务平台，便于查看。项目建成 后，年发电量96万度，基本能满足园区白天的用电负荷，具备良 好的经济收益和环境效益。



工程实施情况

新都 3 个屋面逆变器、桥架、维修通道、围栏、夹具导轨、光伏电缆 NC4 接头，交流电缆已接线完成，B1 组件还缺等品科发货，并网柜主电缆接线完成，供电局已验收，等供电局装表。屋面清洗系统未动工，接地系统未完成。

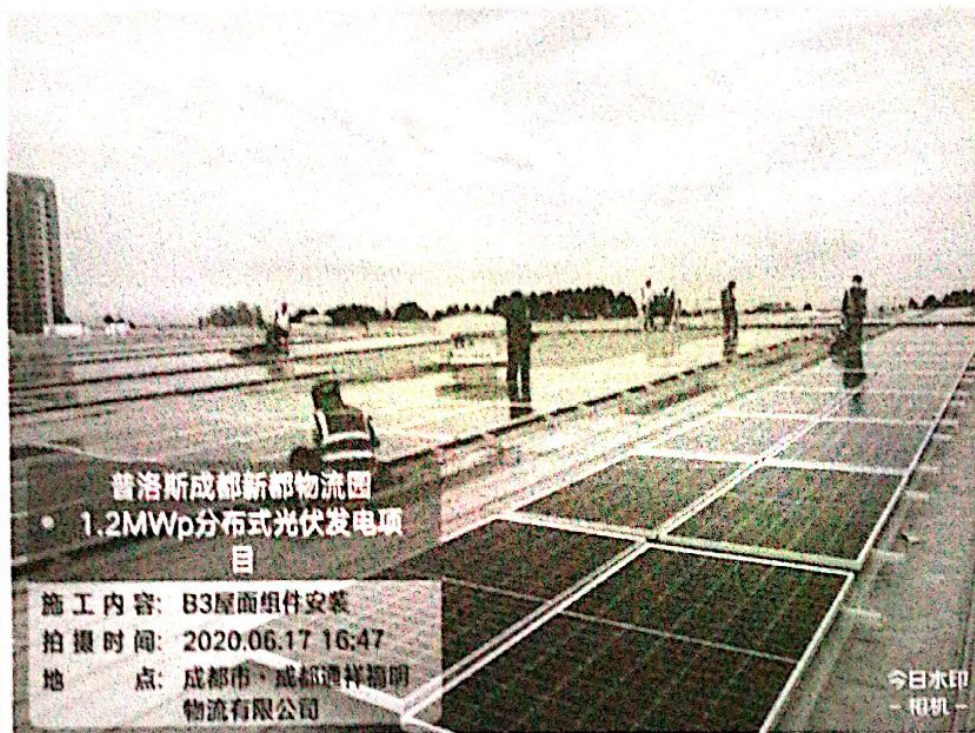



2. 本月监理工作情况

1) 本月下发 4 份关于施工进度监理联系单及质量: 1 份会议纪要(安全); 监理通知单 2 份(施工质量)。

2) 每天到项目现场巡视检查, 对施工的临时用电及工人是否按照安全文明施工要求进行操作。

3) 利用测量器具对现场安装质量进行检查。

4) 对主要工序进行旁站并记录。

5) 主持召开安全会议。

3. 工程存在问题及建议

材料(辅材)不能及时提供、施工人员不足导致施工进度缓慢。
人员安排不合理。

4. 下月监理工作重点

监理合同到期撤离项目地。
