



正衡监理

编号: JLYB-01

监 理 月 报

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 分布式光伏发电
项目

2020 年 03 月第 01 期

项目监理部 (章):



总监理工程师:

于彬

报告日期: 2020 年 03 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 江苏大丰德和绝热 MWp 分布式光伏发电项目

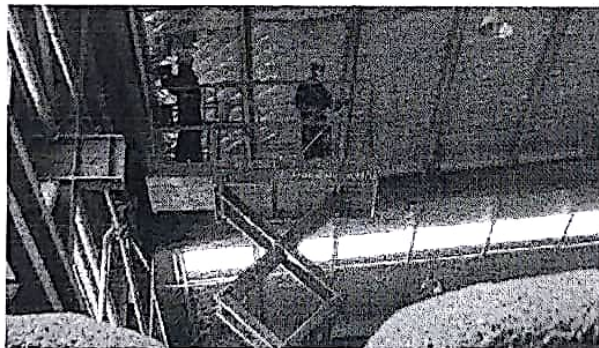
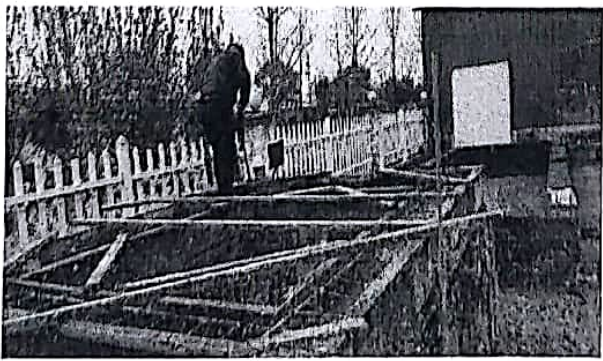
月次 第1次 月报开始

时间 2020 年 03 月 03 日 结束日期 2020 年 3 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 分布式光伏发电项目		影像	37 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	本项目目前已经完成 70% 加固工作, 基础完成 75%, 屋面防腐完成 80%。	下月重点工作有: 水泥墩浇筑、夹具支架及组件安装、箱变基础完成

			
	设备交付进度	汇流箱已全部到场，屋面支架、桥架已全部到场架	下月组件、箱逆变电缆全部到场、其余部分入场
	设计交付进度	先前业主给的是电子版图纸，蓝图刚刚到场，但与现场严重不符，目前等设计来现场后再修改。	3#车间在放线中。
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未审	

	设计交底	未交	
	方案审查	未交付，已向施工单位发通知单	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	施工单位落实未进行	监督施工单位认真做好安全措施工作
	安全文明施工情况	现场施工人员安全觉悟良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	基础结构及加固工作良好	检查符合要求
	主要原材料质量	导轨外观检查合格，结构加固材料合格，镀锌支架、桥架合格。	对主要材料进行检查测试。
	构（配）件质量	进场配件质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	汇流箱开箱检查符合要求	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合	加强过程检查

		要求	力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	按合同执行
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行 工作

二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		9人	/	/	/	/

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	因设计图纸原因，进度无法展开。	要求业主抓紧设计图纸的合理性，让施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力，完成好组件、桥架、检修通道安装
安全管理	督促施工单位专职安全员进场，并报审	审查施工项目部<<安全文明施工措施>>及施工项目部

	《安全文明施工管理制度》，做好班前安全交底，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格，严格实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查施工单位执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照规范要求，进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 03 月 31 日
