



正衡监理

编号: JLYB-03

监 理 月 报

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 分布式光伏发电
项目

2020 年 05 月第 03 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 于彬

报告日期: 2020 年 05 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 江苏大丰德和绝热 MWp 分布式光伏发电项目

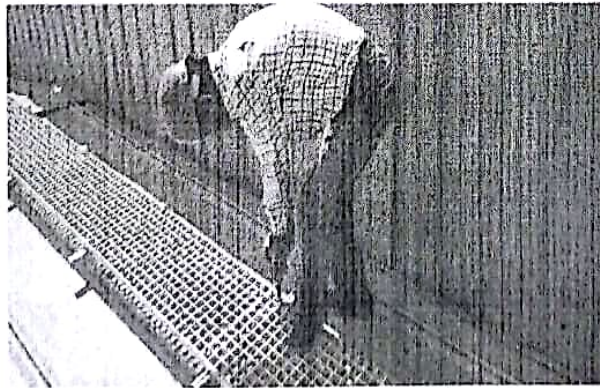
月次 第 3 次 月报开始

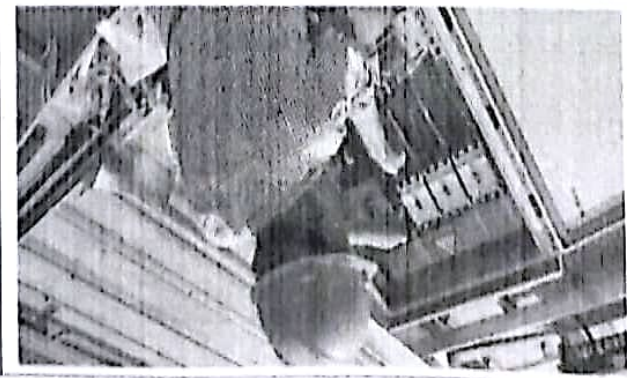
时间 2020 年 05 月 01 日 结束日期 2020 年 05 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 分布式光伏发电项目		影像	80 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	本项目组件安装已经完成 100%，桥架完成 70%，电缆敷设完成 80%，走道安装完成 70%，组件汇线完成 90%。	下月重点工作有：所有工作完成，中验完成，并网，竣工验收。

		
设备交付进度	汇流箱、逆变器、光伏接入箱、SVG已全部到场，组件全部到场，电缆全部到场。	下月桥架增补到场并安装结束。
设计交付进度	先期业主给的电子版图纸，是电子版图纸，蓝图到场后与实际严重不符，目前业主与设计边做边沟，图纸完善中。	
质量体系运作情况	施工单位整体素质比较好，现场经验丰富，目标质量管理体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
施工图会审	未审	
设计交底	已交	
	方案审查	已交付，非审查 后对不符合要求已向施工 求的已向施工 求的已向施工

		单位反馈	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育，警钟常鸣，有利于安全生产。
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	施工单位已落实进行	监督施工单位认真做好安全措施工作
	安全文明施工情况	现场施工人员安全觉悟良好，但也有个别人员因天热不戴安全帽	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装良好，对个别螺丝未拧及电缆敷设破皮现象已发通知单。	确保质量符合要求
	主要原材料质量	导轨外观检查合格，结构加固材料合格，镀锌支架、桥架合格。	对主要材料进行检查测试，部分构件配错后已及时调换。

	构(配)件质量	进场配件质量合格	把控好进场材料质量关，部分构件配错后已及时调换
	设备质量	所有进场设备开箱检查大部符合要求，对不符合要求的及时通知厂家进行调试。	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	按合同执行
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		13人	/	/	/	/

二、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----------	----------

进度管理	因设计图纸原因有所拖延，主支架檩条尺寸变化切割加接费工费时，切割后檩条及配件增加，桥架增加，目前增加桥架还没到位。	下月将全部完成
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，做好班前安全交底，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施，督促专职安全员现场管理。	审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格，严格实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查施工单位执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照规范要求，进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

江苏大丰德和绝热 2.72304MWp 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 05 月 31 日
