



编号: TWILIGHT -YB-008

## 监 理 月 报

工程名称: 通威公安县藕池镇 100MW 渔光一体光伏电站项目

2020年 08月第 08期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 刘坤

报告日期: 2020年 8月 31日

## 监 理 月 报

工程名称: 通威公安县藕池镇 100MW 渔光一体光伏电站项目 月次 第 8 次

月报开始时间 2019年12月30日 结束日期 2020年8月31日


监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	通威公安县藕池镇100MW渔光一体光伏电站项目	通威公安县藕池镇100MW渔光一体光伏电站项目	照片	18张	


## 一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	<p>外线：通过项目部初步验收；</p> <p>2、升压站：完成站内道路、地面硬化，南侧护坡浇筑完成，围栏刷漆等尾项施工完成，配合运维消缺，站内完善、优化完成，通过项目部初步验收。</p> <p>3、打桩单位：打桩累计 22850</p>	<p>光伏区打桩单轴区域并网送电；安装完成100MW。T12、T13、T14、T15、T16、T17、T18、T19、T20、T21、T22、T23、T24完成并网。</p>

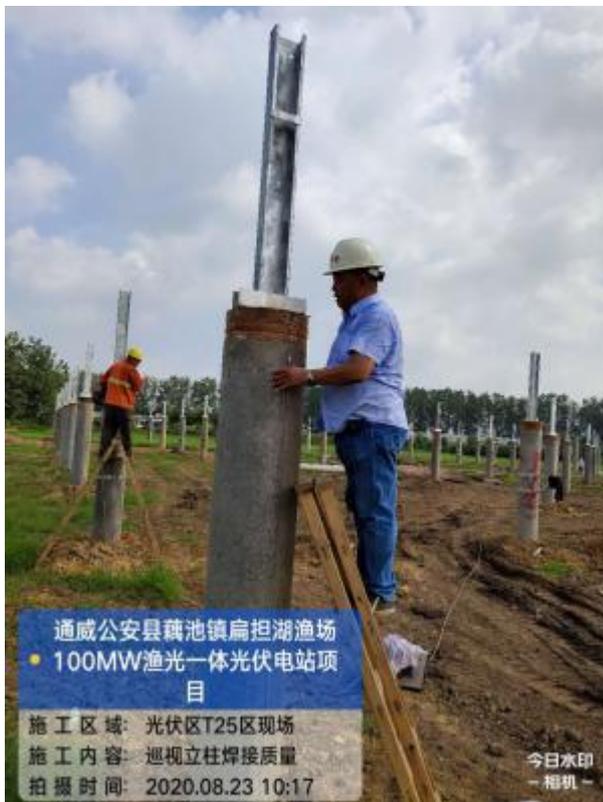


根，完成总量98.9%，箱变平台完成100%，平单轴支架进行试安装，立柱焊接700根，完成率27%；

4、光伏区安装：支架安装完成93.4MW、组件安装完成84.6MW，集电一、二线已带电运行，完成并网48MW。

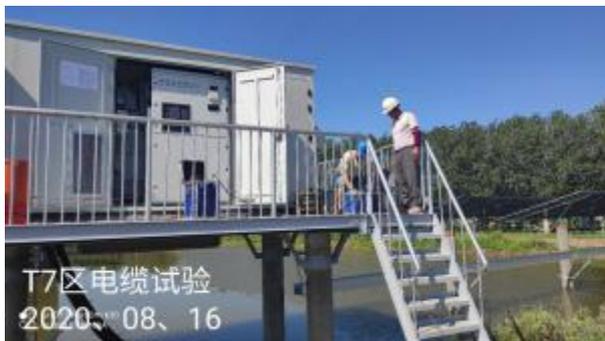



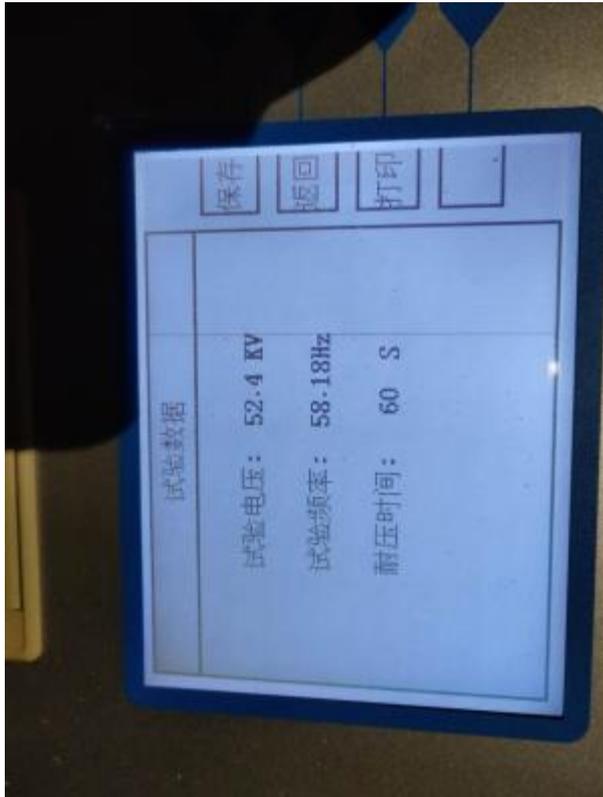



	<p>设备交付进度</p>	<p>1、送出线路： 设备全部到场；</p> <p>2、升压站：主变、GIS、SVG、3.5KV 设备制舱、二次设备制舱、站用变、接地变、电抗器设备到场就位，设备全部到场；</p> <p>3 光伏区：支架到货 100%、管桩累计到货 23101 根，410W 组件到货 0 块（共计容量 4.256MW），累计到货 10381 块（共计容量 4.256MW），双面双玻带边框</p>	<p>跟踪设备到场进度，满足并网计划落实。</p>

		440W 组件 70640 块（共计 容量，直流电缆 累计到货 809788 米，通讯 电缆累计到货 14899 米。	
	设计交付进度	升压站、外线、 光伏区蓝图已 出。	图纸交付已完 成
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好落实 质量保证体系， 并对运行情况 进行检查	质量保证体系 进行跟踪检查。
	施工图会审	升压站施工图 纸已会审	对施工图纸进 行会审。
	设计交底	完成	
	方案审查	部分已审查	督促施工单位 方案报审。
	技术交底	完成	做好技术交底
	设计变更	升压站 2 处、光 伏区桩基已变 更	监督、落实按流 程变更
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	对新员工进行 安全培训。
	安全交底情况	对吊装作业和 其他施工进行	督促施工单位 做好各项施工

		安全交底。	安全交底。
	安全措施落实情况	安全措施落实良好，现场指出问题能够尽快整改。	督促做好安全措施落实
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	符合要求	加大工序检查力度，规范施工。
	主要原材料质量	钢筋、混凝土外观检查合格。钢筋以及到场材料已送相关部门检测。	保证材料到场报审、送检，验收合格后才能使用，做好监理材料平行检验。
	构（配）件质量	已出具合格证和厂家资质	
	设备质量	合格	检查执行，保证设备质量合格
	质量验评情况		
投资	资金情况	能够按正常合同履行	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	升压站、光伏区都有相应签证	

合同	合同签订情况	业主和 EPC 合同、监理合同已签订	已签订
	合同执行情况	按合同执行良好	做好合同执行工作

## 二、 本月进度情况

- 1、 监理情况：本月发出 3 份监理工作联系单、6 份监理工程师通知单，进行 9 次安全旁站、11 次质量旁站，并形成文字性内容，组织 1 次质量安全大检查，主持 3 次工地例会。
- 2、 送出线路：完成预验收。
- 3、 升压站：完成预验收。
- 4、 光伏区打桩：道路铺设基本结束，打桩累计 22850 根，完成总量 98.9%。
- 5、 光伏区安装：支架安装完成 893.6MW、组件安装完成 84.6MW，集电一、二线带电运行。

## 三、 下月进度计划

光伏区桩基施工全部完成并对平单轴三个区域施工完成；安装完成 T14、T15、T16、T17、T18、T19、T20、T21、T22、T23、T24 并网，实现全容量并网。

## 四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		200 人	4	200	/	/

## 五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料、法、环等资源配置，充分调动施工人员的积极性，增加人力和设备资源，制定三级进度计划，跟踪计划落实，采取可行措施，保证计划完成。	督促施工单位，落实好三级进度计划安排，加强进度计划推进。

安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查；对新进场施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查；提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	督促施工单位材料到场进行送检；做好施工质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划，做好每道工序报验，验收合格后才能下道工序，并对到场材料和施工质量进行平行检验。	要求施工单位每道工序必须自检合格报审监理批准后才能下道工序，督促施工单位做好质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
造价管理	/	/
物资供应	督促施工单位做好物资到场准备工作，业主物资到场充足。	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资到场接应工作。

常州正衡电力工程监理有限公司

通威公安县藕池镇 100MW 渔光一体光伏电站项目

2020 年 8 月 31 日

4	并从中谋取利益的行为。	无	
5	是否接受施工单位现金、有价证券和贵重物品或在施工单位报销任何由个人支付的费用。	无	
6	是否有不及时签认资料或利用应履行的审核职权，来刁难施工单位，以谋取私利。	无	
7	是否对施工单位工作人员耍态度，在监理工作中出现有意刁难行为。	无	
 承包（施工）单位：（章） 负责人：[Signature] 日期：2020.8.30			
监理单位回复： <div style="text-align: right;">             监理单位：（章）            负责人：[Signature]            日期：2020.8.30         </div>			
填表说明： 1、建设单位调查部分由建设单位项目负责人填写，对应评价项目在满意度一栏“√”选，对不满意项目或本表未列举到的项目可在“意见和要求”一栏详加描述。 2、承包单位调查部分由承包单位项目负责人填写，调查结果栏内，有问题及事实填“是”并在备注栏写清事件大概情况和发生时间，没问题填“否”；如有本表未列举到的违规现象，承包单位可在签字盖章栏详加描述。 3、“正衡监理”将在收到意见的一周内进行回复。 4、本表由监理项目部每月 25 日前交建设单位、承包单位填写并盖章完成后提交公司管理部。			

感谢各参建单位对“正衡监理”服务&廉政建设工作的支持，您的支持是我们成长的最大动力，如您在与我们合作过程中发现我方监理人员有任何违规、违纪行为，可通过以下联系方式向我们反映。

电话：0519-81180829

邮箱：[yh.lin@skysolargroup.cn](mailto:yh.lin@skysolargroup.cn)

常州正衡电力工程监理有限公司

监理服务&廉政建设调查表

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目		建设单位：公安县通威渔光科技有限公司					
监理人员：张建忠、焦鹏飞、秦帮学、王孝金、史光辉、张海龙		承包（施工）单位：安徽元正新能源有限公司					
建设单位调查部分							
序号	评价项目	很满意	满意	一般	不满意	很不满意	备注
1	监理人员的廉洁守法	✓					
2	监理人员的服务态度	✓					
3	监理工作主动性		✓				
4	监理工作责任心	✓					
5	工作中的专业技术水平	✓					
6	出勤准时性		✓				
7	监理报告的质量和及时性		✓				
8	对监理服务质量综合评价	✓					
建设单位意见与要求							
承包单位调查部分							
序号	调查内容	调查结果	备注				
1	有无玩忽职守，对工作不负责任造成工程质量降低或损害行为。	无					
2	是否有参与工程分包、劳务分包、材料物资采购、利用工作方便为自己或亲朋好友谋取私利行为。	无					
3	是否有向施工单位“吃、拿、卡、要”的行为。	无					
	是否有向施工单位介绍材料、机械设备供应商	无					

## 监理项目客户满意度调查（反馈）表

通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目领导：

非常感谢贵方的支持和关爱，使之该项目能够顺利进行。但我们深深感觉到很多方面有待提高，更有许多使您感到不尽满意的地方。为了以后更好地做好我们的监理工作，请您协助填写《客户调查表》，以便及时发现并改进我们的不足，更好地为客户提供满意的服务。

感谢您对我们公司工作的支持！

### 《客户调查表》

我公司派驻贵公司，为您服务的监理人员是：

张建忠、焦鹏飞、秦帮学、王孝金、史光辉、张海龙

请在您认为合适的下面和旁边的“□”划“√”

序号	调查内容	A. 很满意	B. 比较满意	C. 一般	D. 不满意	E. 很不满意
1	人员行为规范	✓				
2	专业技能	✓				
3	工作态度	✓				
4	现场管理能力		✓			
5	沟通协调能力	✓				
6	勤勉廉洁	✓				
7. 是否经常使用我公司配置的测量工具、仪器？						
A. 经常用 <input type="checkbox"/> B. 偶尔用 <input type="checkbox"/> C. 不用 <input type="checkbox"/>						
委托方对该项目的综合评定：						
A. 满意 <input type="checkbox"/> B. 比较满意 <input type="checkbox"/> C. 一般 <input type="checkbox"/> D. 不满意 <input type="checkbox"/> E. 很不满意 <input type="checkbox"/>						
委托方综合意见：（不够另附纸）						
业主方代表签字（章）：				监理方代表签字：		
日期：2020年8月30日				日期：2020年8月30日		

如果您感觉不满意，我公司投诉联系方式：

常州正衡电力工程监理有限公司

分布式部：王志成 18752266068 邮箱：zc.wang@zhjl-power.com



国内最大的光伏电站监理单位  
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目监理部

廉政告知书

致：公安县通威渔光科技有限公司（业主单位）

安徽元正新能源有限公司（承包单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。

监理项目部：（章）  
负责人：张治德  
日期：2020.8.30

业主项目部：（章）  
负责人：张治德  
日期：2020.8.30

施工项目部：（章）  
负责人：张治德  
日期：2020年8.30
